

IICA  
E14  
238  
2002-2003

Banco Mundial



BID

DFID

Department for  
International  
Development



FIDA



IICA



PNUD



# Programas de Trabajo Regional y Nacionales 2002-2003



Julio, 2002

00004579


11CA  
E14  
238  
(2002-2003)





**RUTA**

Regional Unit of Technical Assistance - Unidad Regional de Asistencia Técnica



## Programa de Trabajo Anual

### Tabla de Contenido

<b>A.</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>1</b>
<b>B.</b>	<b>Marco Orientador de RUTA.....</b>	<b>2</b>
<b>C.</b>	<b>Programa de Trabajo 2001-2002 .....</b>	<b>2</b>
	<b>Cuadro 2. Programa de Trabajo 2001 – 2002 Actividades Programadas por País y por Area .....</b>	<b>2</b>
	<b>Cuadro 3. Programa de Trabajo 2001 – 2002 Actividades Ejecutadas por País y por Area .....</b>	<b>3</b>
<b>D.</b>	<b>Programa de Trabajo 2002-2003 .....</b>	<b>3</b>
	<b>Gráfico 1: Número de Actividades por Año.....</b>	<b>4</b>
	<b>Cuadro 4. Programa de Trabajo 2002 – 2003 Actividades del por País y por Area.....</b>	<b>4</b>
	<b>Gráfico 2: Distribución de actividades programadas por País y Regional .....</b>	<b>5</b>
	<b>Gráfico 3: Número de Actividades por País .....</b>	<b>5</b>
	<b>Gráfico 4: Número de Actividades por Area.....</b>	<b>6</b>
	<b>Gráfico 5: Actividades por Area, Belice .....</b>	<b>7</b>
	<b>Gráfico 6: Actividades por Area, El Salvador.....</b>	<b>7</b>
	<b>Gráfico 7: Actividades por Area, Costa Rica .....</b>	<b>7</b>
	<b>Gráfico 8: Actividades por Area, Guatemala .....</b>	<b>7</b>
	<b>Gráfico 9: Actividades por Area, Honduras.....</b>	<b>8</b>
	<b>Gráfico 10: Actividades por Area, Panamá.....</b>	<b>8</b>
	<b>Gráfico 11: Actividades por Area, Nicaragua .....</b>	<b>8</b>
	<b>Gráfico 12: Actividades por Area, Regional.....</b>	<b>8</b>
<b>E.</b>	<b>Programas de Trabajo: .....</b>	<b>9</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regional</b></li> <li>• <b>Belice</b></li> <li>• <b>Costa Rica</b></li> <li>• <b>El Salvador</b></li> <li>• <b>Guatemala</b></li> <li>• <b>Honduras</b></li> <li>• <b>Nicaragua</b></li> <li>• <b>Panamá</b></li> </ul>	



DFID



IFIDA

IICA







## RUTA PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2002 – 2003


### A. Introducción

RUTA comenzó en 1980, y ha existido con una interrupción, durante 18 años. Sus esfuerzos fueron concentrados en la primera fase (1980-1985) en la preparación de proyectos para las agencias financieras internacionales. Al volver a establecerse en su segunda fase (1989-1993), RUTA tuvo un mandato para asesorar a los Gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá en la definición y ajustes sectoriales, en políticas de estabilización y en la preparación de proyectos de inversión. En su tercera fase (1994-1997), RUTA focalizó sus acciones en cuatro grandes temas: desarrollo institucional, manejo de los recursos naturales, alivio de la pobreza rural y promoción del proceso de integración regional y comercio. En la extensión de esta fase (1997-2000), se incorporó Belice y las acciones se dirigieron a la integración regional y la liberación comercial, la descentralización de las acciones del Estado y la provisión de servicios. Se enfocó el alivio a la pobreza rural a través de acciones en políticas sectoriales incluyendo comercio, mercados financieros, administración de tierras, descentralización y provisión de servicios, grupos especiales (etnias y género); asistencia en la Implementación de Proyectos; y asistencia en la Preparación de Proyectos. En 2000, las agencias socias cooperantes y los miembros socios del CAC aprobaron una nueva etapa de RUTA, incorporando como agencia socia nueva al Gobierno del Reino Unido (DFID). La justificación para la nueva etapa fue basada en la necesidad de continuar las actividades de asistencia relativas al desarrollo rural de los países centroamericanos y sobre todo: (a) Reforzar su agenda de trabajo a nivel regional; (b) Ampliar su papel en la producción, sistematización y diseminación de información; y (c) Mejorar las capacidades locales (UTNs) e instituciones nacionales.

Entre los objetivos esperados al final de la nueva fase del proyecto, están:

- Capacidades nacionales y regionales ampliadas para analizar políticas, diseñar y ejecutar proyectos dentro de una estrategia para mejorar la competitividad de la agricultura y reducir la pobreza rural con una mayor participación local, el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de mercados de bienes y servicios.
- Que exista un diálogo, cooperación y coejecución más fluido entre Gobiernos, organizaciones de las sociedades civiles y agencias de cooperación internacional, alrededor de prioridades nacionales y regionales.
- Las agencias de cooperación armonizan sus políticas sobre temas específicos en la región y tienen incentivos para colaborar mutuamente, mediante programas prioritarios de alcance nacional, que eviten duplicidades.
- La Secretaría Técnica del CAC estará implementando una agenda de trabajo regional de mediano plazo, que estreche los vínculos de los sectores agropecuarios con el Sistema de Integración Económica Regional.





Los ejes principales de la estrategia de RUTA son: (i) mejorar las condiciones del entorno institucional; (ii) concentrar las acciones en los temas centrales de la agenda que son: pobreza rural y seguridad agropecuaria; comercio, mercadeo y agronegocios; producción agropecuaria sostenible y manejo de recursos naturales; e institucionalidad rural; y los temas especiales transversales de género, pueblos indígenas, inestabilidad climática y vulnerabilidad; y (iii) desarrollar agendas a nivel regional e interagenciales. Al momento, RUTA esta en medio termino de esta fase.

## B. Marco Orientador de RUTA

En la etapa RUTA 2000 - 2004 se han implementado mecanismos e instrumentos para mejorar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, contemplados en el Sistema de Información Gerencial. Un instrumento de reciente definición es el *Marco Orientador de RUTA (Anexo 1)*, que consiste en un ordenamiento de los objetivos propuestos en el documento de proyecto, basado en la reflexión sobre el trabajo realizado por RUTA y el contexto dinámico en que se desarrolla el proyecto. El Marco Orientador se ha preparado como referencia para que las actividades en los Programas Anuales de Trabajo (PAT), respondan a los resultados buscados, para facilitar la definición de indicadores de impacto para la evaluación y para orientar la planificación estratégica. Las actividades correspondientes a los objetivos cambian de acuerdo con las variaciones en el contexto, para una mejor respuesta a las demandas.

## C. Programa de Trabajo 2001-2002

El PAT 2001 - 2002 inició con un total de 108 actividades (Cuadro 2). El promedio de actividades por país fue de 12, a excepción de Belice donde se programaron 8 actividades. En total se programaron 22 actividades regionales, lo que equivale a un 18.5% del total de actividades. El restante 81.5% correspondió a actividades programadas en los países.

**Cuadro 2. Programa de Trabajo 2001 - 2002  
Actividades Programadas por País y por Area**

	Número de Actividades					
	Total	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5
Belice	8	2	2	1	2	1
Costa Rica	16	1	3	5	5	2
El Salvador	15	6	3	2	2	2
Guatemala	11	2	1	3	3	2
Honduras	13	5	1	4	1	2
Nicaragua	11	3	0	3	3	2
Panamá	12	3	0	4	3	2
Regional	22	7	1	4	3	7
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

Area 1: Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria Area 2: Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios  
 Area 3: Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales  
 Area 4: Institucionalidad Rural Area 5: Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género





**Cuadro 3. Programa de Trabajo 2001 – 2002  
Actividades Ejecutadas por País y por Area**

	Número de Actividades					
	Total	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5
Belice	5	1	0	2	2	0
Costa Rica	13	1	2	3	5	2
El Salvador	10	4	2	1	1	2
Guatemala	12	4	0	2	4	2
Honduras	10	5	0	2	1	2
Nicaragua	9	0	0	6	1	1
Panamá	9	2	0	3	2	2
Regional	22	7	1	4	3	7
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

Al finalizar el período 2001 – 2002, el balance en el PAT muestra un total de 90 actividades, lo que significa una disminución del 17% en relación con lo programado (Cuadro 3). Esta reducción obedeció principalmente, a cambios en las prioridades en los Ministerios y los procesos electorales llevados a cabo últimamente, en Nicaragua, Honduras y Costa Rica que afectaron el proceso de toma de decisiones.

**D. Programa de Trabajo 2002-2003**

El PAT 2002-2003 aparenta tener menos actividades que en años pasados. Esto es debido a dos factores: i) la promoción de un mayor impacto en las actividades en que RUTA se enfoca, que esta reflejada en el Marco Orientador de RUTA; y ii) la formulación del PAT como un instrumento técnico mas que administrativo. Dado lo anterior, el PAT no refleja actividades administrativas como en años anteriores. Estas actividades administrativas siempre se mantienen pero no son reflejadas en el PAT. (Ver gráfico n° 1).










### Gráfico 1: Número de Actividades por Año

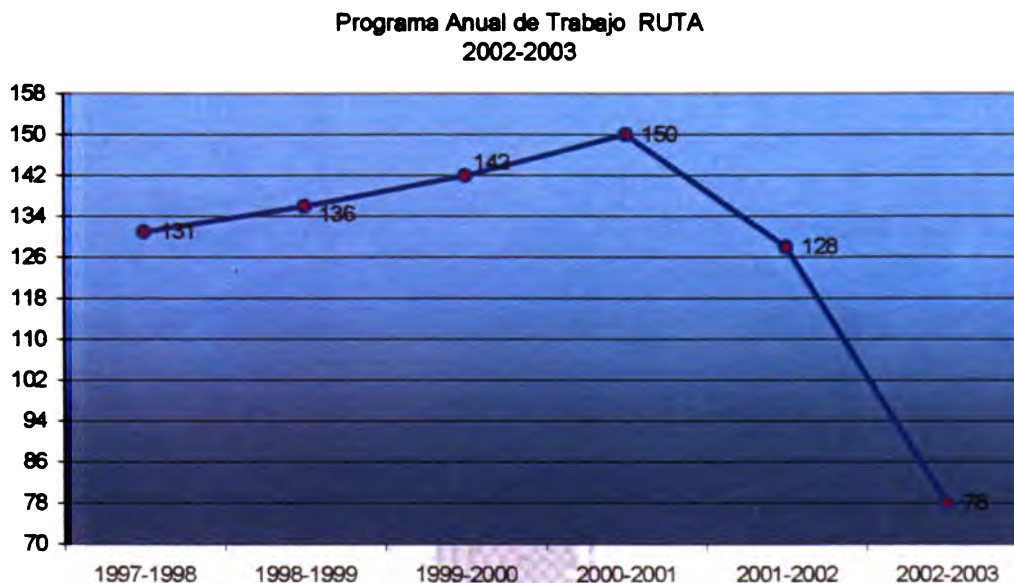

El Cuadro 4 muestra el número de actividades por país, y un desglose de estas actividades en las cinco áreas temáticas de RUTA. Como se puede observar aquí, las actividades programadas según área muestran una mayor concentración en las áreas de (a) pobreza rural y seguridad alimentaria (b) producción agropecuaria sostenible y manejo de recursos naturales y (c) temas transversales: asuntos indígenas y género (Gráfico 2).

**Cuadro 4. Programa de Trabajo 2002 – 2003  
Actividades del por País y por Area**

	Número de Actividades					
	Total	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5
Belice	7	2	0	3	1	1
Costa Rica	10	4	0	3	0	3
El Salvador	8	2	2	1	1	2
Guatemala	9	2	1	2	2	2
Honduras	8	3	1	1	1	2
Nicaragua	8	3	0	2	2	1
Panamá	8	3	0	2	2	1
Regional	20	6	3	4	2	5
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>17</b>

Área 1: Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria    Área 2: Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios  
 Área 3: Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales  
 Área 4: Institucionalidad Rural    Área 5: Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género









**Gráfico 2: Distribución de actividades programadas por País y Regional**

**Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002 - 2003**

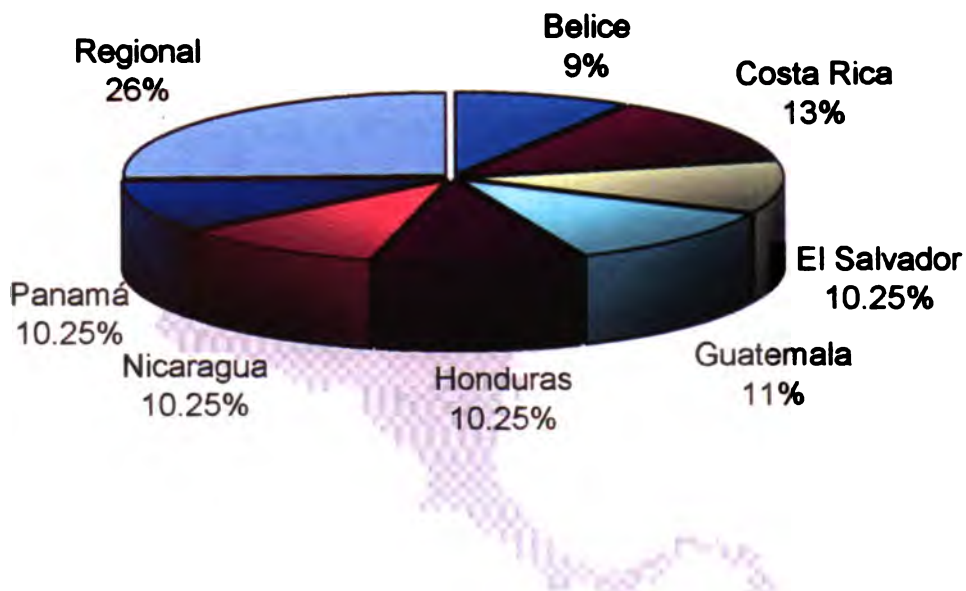

**Gráfico 3: Número de Actividades por País**

**Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003**








### Gráfico 4: Número de Actividades por Area

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

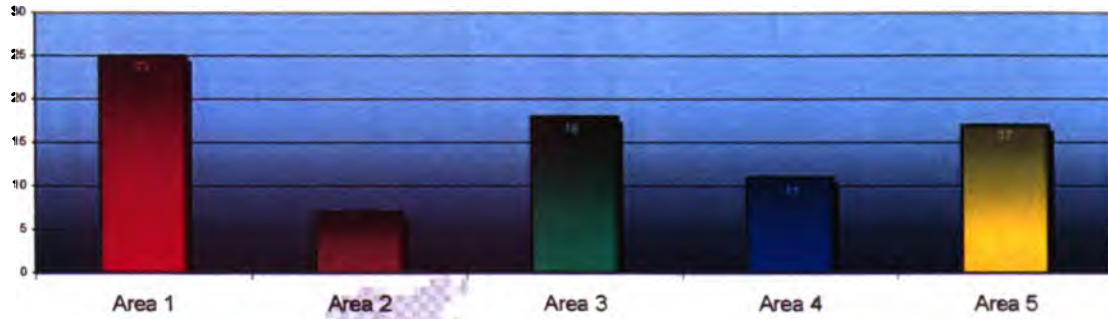


- Area 1: Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria
- Area 2: Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios
- Area 3: Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales
- Area 4: Institucionalidad Rural
- Area 5: Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género






**Gráfico 5: Actividades por Area, Belice**

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

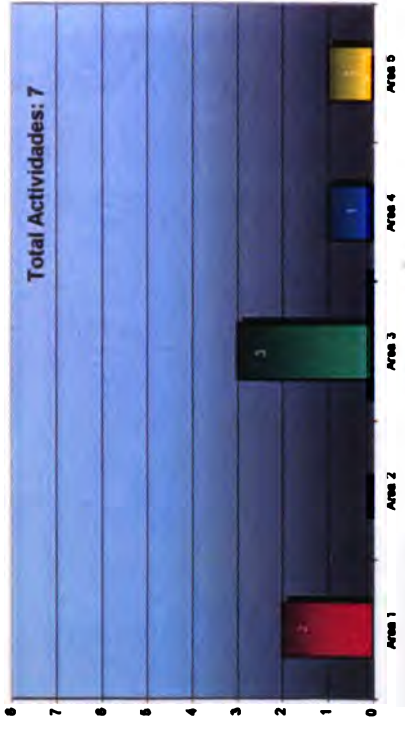


**Gráfico 7: Actividades por Area, Costa Rica**

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

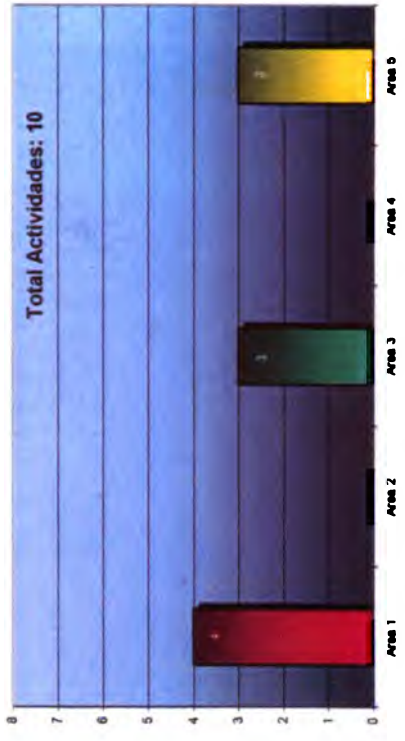


**Gráfico 6: Actividades por Area, El Salvador**

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

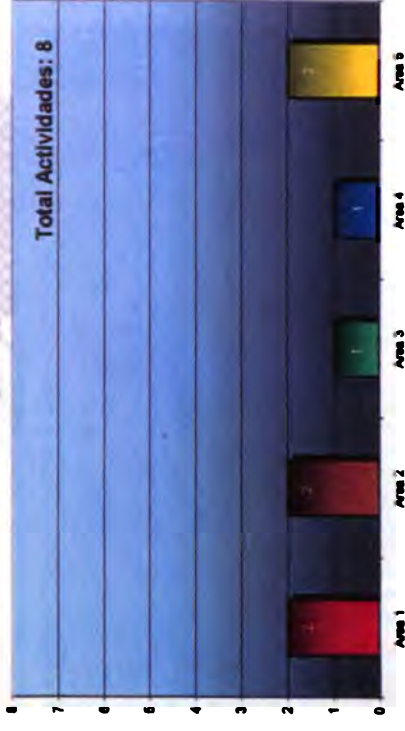

**Gráfico 8: Actividades por Area, Guatemala**

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

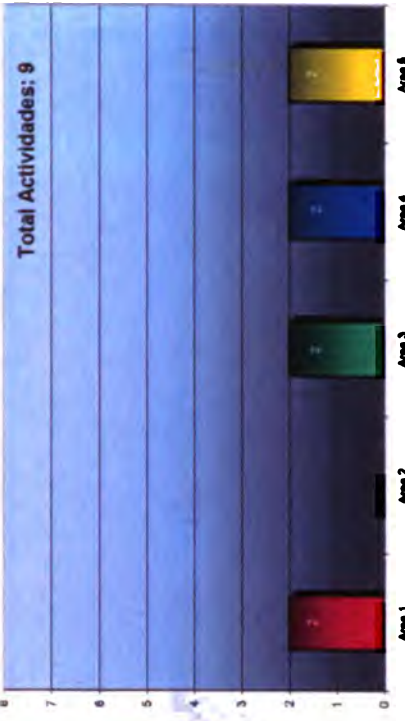







**RUATA**


FAO FIDA IICA FMUO



Regional Unit of Technical Assistance - Unidad Regional de Asistencia Técnica


### Gráfico 9: Actividades por Area, Honduras

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

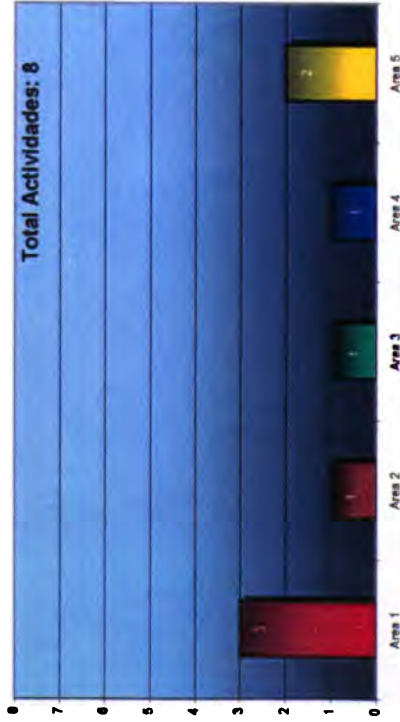


### Gráfico 11: Actividades por Area, Nicaragua

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

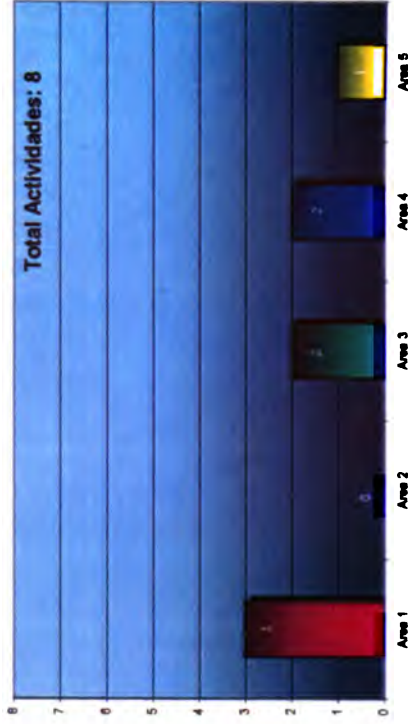


### Gráfico 10: Actividades por Area, Panamá

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003

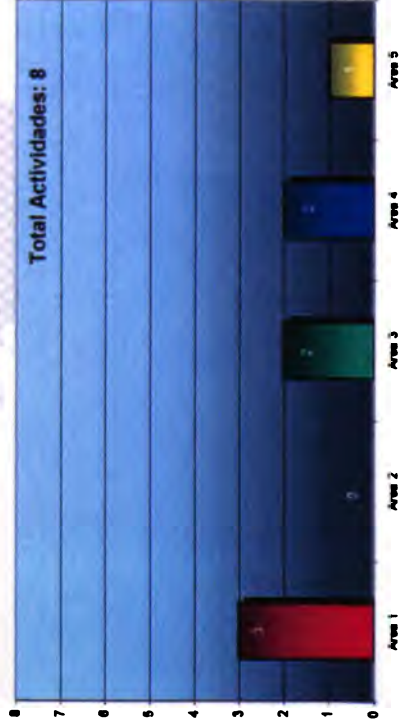

### Gráfico 12: Actividades por Area, Regional

Programa Anual de Trabajo RUTA  
2002-2003







**RUTA**

Regional Unit of Technical Assistance - Unidad Regional de Asistencia Técnica



## E. Programas de Trabajo:

- Regional
- Belize
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá



DFID Department for International Development



J.FIDA

IICA





**REGIONAL**





Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
	Con PROCASUR y FIDA.			Financiera. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<p>2. CA.TAS.69</p> <p><b>Inventario de Proyectos de Cooperación y Asist. Téc. en Centro América.</b></p> <p>Mantener actualizada la Cartera de Proyectos de Cooperación y Asistencia Técnica en Centroamérica.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	Documento de Inventario de proyectos de cooperación y asistencia técnica en Centroamérica, completado.	10/2002 - 02/2003	<p><b>Responsable directo</b></p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> L. Deras, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 0.50 <b>Total semanas: 2.5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Recopilación de información. <b>Peso relativo: 70%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Organización de la información e incorporación al documento. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. CA.TAS.80</p> <p><b>Apoyo a un Proceso de Diálogo Rural</b></p> <p>El estudio de pobreza rural (Diálogo Rural) llevado a cabo en Honduras y Nicaragua en el PAT 2001-2002 identificó la necesidad de abrir un espacio que permita un diálogo constante entre los varios grupos de interés involucrados en el desarrollo rural y reducción de la pobreza - que garantice la participación de los pobres de zonas rurales.</p>	<p>Formación de un grupo de trabajo multi-actor en Honduras y Nicaragua. Determinación de una estrategia de funcionamiento, orientación, influencia y comunicación.</p> <p>Publicación y divulgación de trabajos y estudios específicos sobre la pobreza rural y experiencias exitosas.</p> <p>Mejor acercamiento y comprensión entre gobiernos, ministerios, agencias, sociedad civil, ONGs y campesinos sobre las causas de la pobreza rural y acciones para</p>	07/2002 - 06/2003	<p><b>Responsable directo</b> Responsables PRSP Honduras y Nicaragua.</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Wadsworth, 10.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> F. Soto, 1.00 J. Balcet, 2.00 J. León, 1.00 J. Martínez, 1.00 L. Deras, 2.00 M. Castejón, 1.00 N. Espinoza, 1.00 <b>Total semanas: 19</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Grupo(s) de diálogo rural formados y planes de acción desarrollados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Estudios específicos realizados (por ser determinados). <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Encuentros rurales entre actores realizados. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Documentos y otros materiales publicados y divulgados. <b>Peso relativo: 20%</b></p>



Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>El objetivo es facilitar un proceso de diálogo entre actores para informar e influir los procesos de formulación e implementación de las políticas de reducción de pobreza rural existentes en los países centroamericanos (inicialmente Honduras y Nicaragua, con la posibilidad de ampliar a otros países según disponibilidad de recursos).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>reducirla.</p> <p>Mejoras en la formulación e implementación de las políticas y programas por parte de los gobiernos y agencias de cooperación.</p>		<p>ONGs, Consultores, Universidades, Institutos y otros Ministerios, Campesinos</p>	<p><b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>4. CA.TR.45</b></p> <p><b>Programa de Capacitación en RURALINVEST</b></p> <p>Capacitar y brindar asistencia técnica en identificación, formulación y evaluación de pequeñas inversiones rurales con participación comunitaria a técnicos y otros profesionales de la región centroamericana.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Cursos nacionales sobre módulos 1 y 2 impartidos.</p> <p>Asistencia técnica a proyectos/organizaciones que reciben capacitación realizada.</p> <p>Diseño y puesta en marcha del módulo 3 de sistema de información de cartera proyectos</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Instituciones del SPA, ONGs</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> C. Morales, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> L. Deras, 18.00</p> <p><b>Total semanas: 22</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Organización, desarrollo y evaluación de cursos. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Diseño del módulo 3. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Promoción de RURALINVEST a nivel de países y agencias. <b>Peso relativo: 5%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Asistencia técnica realizada. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>5. CA.TR.46</p> <p><b>Programa Regional de capacitación en apoyo a la implementación de proyectos FIDA. II Etapa</b></p> <p>Capacitar a funcionarios de proyectos en cargos de dirección y mandos medios, de la región centroamericana, en temas de gestión de proyectos.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Cursos regionales en temas de gerencia, administración financiera, seguimiento y evaluación.</p> <p>Sistematización de materiales de capacitación (fascículos)</p> <p>Organización para la Ejecución de Proyectos, Guía de Administración Financiera y otros).</p> <p>Base de datos sobre oferentes de capacitación en la región.</p> <p>Identificar oferentes de capacitación que complementen actividades de capacitación de RUTA.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> FIDA. Ladislao Rubio</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> C. Morales, 19.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 3.00 L. Deras, 1.00 R. Meza, 4.00 R. Ríos, 1.00 <b>Total semanas:</b> 28</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Directores de Proyectos L. Baéz, Consultora RUTA</p>	<p>Organización, implementación y evaluación de cursos regionales. <b>Peso relativo: 45%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Discusión y validación de materiales. <b>Peso relativo: 35%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Diseño y mantenimiento de la base de datos. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Oferentes de capacitación. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>6. CA.TR.47</p> <p><b>Internalización y Desarrollo del Enfoque de Medios de Vida Sostenible (MVS) en RUTA</b></p> <p>Actividades realizadas en el PAT 2001-2002 indicaron interés y potencial en la región para la incorporación del enfoque MVS en el trabajo de RUTA y sus socios en la Región. El objetivo es crear una capacidad de capacitación y consultoría en los principios y</p>	<p>Un grupo de consultores y personal de RUTA capacitados en facilitación de cursos de inducción en MVS.</p> <p>Materiales de capacitación en MVS.</p> <p>7 cursos de capacitación de personal de proyectos y programas en los principios de MVS (1 en cada país).</p> <p>Formación y seguimiento de una red de experiencias en la aplicación de MVS y recopilación de</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> UTN de cada país (ver PAT nacionales).</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Wadsworth, 6.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 4.00 L. Deras, 6.00 <b>Total semanas:</b> 16</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Personal de proyectos y programas, y consultores</p>	<p>Curso para facilitadores realizado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Materiales (guías y manuales) de instructores y participantes preparadas y aprobadas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Cursos realizados en cada país (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice). <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>conceptos de MVS dentro de RUTA y las UTNs por medio de la orientación y capacitación de facilitadores, consultores y personal de proyectos y establecimiento de una red de proyectos en la región (una en cada país) que experimentan en la utilización de elementos apropiados el enfoque MVS con el propósito de “aprender haciendo” y adaptar el enfoque al contexto centroamericano (el programa continuará hasta el 2004).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>lecciones aprendidas.</p>			<p>Proyectos pilotos identificados y planes de trabajo con MVS desarrollados y apoyados. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Lecciones aprendidas recopiladas y borrador escrito. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>AREA: b. Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios</b></p>				
<p><b>1. CA.TAS.73</b></p> <p><b>Publicación sobre etiquetado y certificación social como estrategias de mercadeo en CA</b></p> <p>Elaboración de publicación sobre el fomento de la Agricultura orgánica, el etiquetado y las certificaciones sociales como estrategias de mercadeo para productos agropecuarios en</p>	<p>Publicación preparada, editada, impresa y diseminada.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> FAO/RUTA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Castejón, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 8</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Primer borrador para comentarios y sugerencias por grupo de revisión externo. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Segundo borrador para revisión interna en RUTA y FAO. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Texto final editado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Publicación impresa y diseminada.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Centroamérica.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>				<p><b>Peso relativo:</b> 30%</p> <p><b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<p>2. CA.TAS.74</p> <p><b>Apoyo a la Agenda del CAC en Fortalecimiento de la Gestión Empresarial de Agronegocios</b></p> <p>Objetivo: Fortalecer la institucionalidad pública y privada para lograr un mejor desempeño en la gestión empresarial de los agronegocios.</p> <p>Rol de RUTA: Preparar un proyecto de cooperación técnica para presentarlo al Foro de Donantes de apoyo a la Agenda Agrícola Regional de los Ministros del CAC para obtener recursos financieros para la ejecución del proyecto.</p>	<p>Documento de proyecto de cooperación técnica consensuado y finalizado para ser sometido al Foro de Donantes de la Agenda Agrícola del CAC.</p>	<p>06/2002</p> <p>-</p> <p>12/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Gregorio Contreras, IICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> N. Espinoza, 6.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas:</b> 6</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Miguel García del IICA Javier Flores del BCIE Roger Guillén, Secretario Ejecutivo del CAC Juntas Directivas, Directores Ejecutivos o Presidentes de organizaciones de productores agropecuarios/agroindustriales.</p>	<p>Primer borrador para observaciones. <b>Peso relativo:</b> 40% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Segundo borrador para observaciones. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Versión final del documento de proyecto de cooperación técnica. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p> <p>3. CA.TAS.75</p> <p><b>Apoyo a la Agenda del CAC en Comercio Agrícola en Políticas, Negociaciones</b></p>	<p>Documento de proyecto de cooperación técnica consensuado y finalizado para ser sometido al Foro de Donantes de la Agenda Agrícola del CAC.</p>	<p>06/2002</p> <p>-</p> <p>12/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Gregorio Contreras, IICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b></p>	<p>Primer y segundo borrador para observaciones. <b>Peso relativo:</b> 70% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>


Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Internacionales</b></p> <p>Objetivo: Fortalecer la capacidad de los países de CA para participar con efectividad en los procesos de negociación y aplicación de los mismos, de manera que puedan beneficiarse de la expansión del comercio de forma equitativa.</p> <p>Rol de RUTA: Apoyar la preparación de un proyecto de cooperación técnica para presentarlo al Foro de Donantes de apoyo a la Agenda Agrícola Regional de los Ministros de Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), con el propósito de obtener recursos financieros para la ejecución del proyecto.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p>N. Espinoza, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> Total semanas: 2</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Funcionarios del IICA: Juanita Galván, Tania López, Ramón Montoya, Erick Bolaños, Gloria Abraham</p> <p>Secretario Ejecutivo del CAC: Roger Guillén</p>	<p>Versión final del documento de proyecto de cooperación técnica. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b>				
<p>1. CA.TAS.65</p> <p><b>Proyecto Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).</b></p> <p>El proyecto regional -- México, Belice, Guatemala, y</p>	<p>Dos misiones anuales de supervisión.</p> <p>Seguimiento mensual.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Noel Jacobs</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Kellenberg, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b></p>	<p>Misiones de supervisión cumplidas.</p> <p><b>Peso relativo: 66%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Asistencia técnica al Director y la UEP.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Honduras tiene los objetivos de fortalecer las áreas protegidas marinas, establecer un sistema estandarizado de monitoreo de ecosistemas, promover el uso sostenible del SAM, y fortalecer la capacidad local, nacional y regional para el manejo ambiental. RUTA proveerá asistencia técnica al CCAD y el Banco Mundial en la implementación del proyecto (BM/GEF).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p>Total semanas: 4</p> <p>Otros Responsables:</p>	<p>Peso relativo: 34% Porc. realizado: 0</p>
<p>2. C.A.TAS.72</p> <p><b>Facilitar Mejoramiento y Transferencia en Certificación Ambiental y Social</b></p> <p>El objetivo será identificar los actores y facilitar la colaboración regional e internacional, para mejorar la calidad y eficiencia de la certificación ambiental y social (producción orgánica, producción integral, comercio justo, etc.) y mejorar la transparencia en este</p>	<p>Identificar los actores y estabilizar una red regional entre los sistemas de certificación ambiental y social.</p> <p>Hacer estudios incluyendo análisis de costos-ventajas de certificación a nivel de productores. Planificar e informar al III Encuentro Internacional del Grupo de Expertos en Producción Responsable.</p> <p>Asistencia técnica y coordinación del Proyecto SASA, para armonizar los protocolos y las normas aplicadas en certificación social.</p> <p>Establecer y mantener una página</p>	<p>06/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Mikkel Andersen</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Andersen, 39.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Wadsworth, 1.00 M. Castejón, 2.00 <b>Total semanas: 42</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Pascal Liu, ESCR-FAO Cora Dankers, ESCR-FAO</p>	<p>Identificación y mapeo de los actores al nivel regional realizados. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Publicación internacional sobre certificación para mejorar la transparencia en el mercado realizada. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Colaboración entre los varios sistemas de certificación iniciado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Página de Internet realizada. <b>Peso relativo: 10%</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>mercado.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>de Internet sobre certificación.</p>			<p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Conferencia y documentación final del III Encuentro Internacional realizados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>3. CA.TAS.77</b></p> <p><b>Apoyo a la Agenda del CAC para la Conservación de Recursos Fitogenéticos</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Promover la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos silvestres y domesticados, nativos de la región, de interés agrícola y forestal, en el ámbito del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).</p> <p><b>Rol de RUTA:</b> Preparar un proyecto para presentarlo al Foro de Donantes de apoyo a la Agenda Agrícola Regional de los Ministros del CAC. Se pretende conseguir recursos para preinversión y comprometer recursos para la eventual ejecución</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Documento de proyecto consensuado y finalizado para ser sometido al Foro de Donantes de la Agenda Agrícola del CAC.</p>	<p>06/2002 - 12/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Gregorio Contreras, IICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> N. Espinoza, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Toal semanas: 0</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Eduardo Vides, Secretario Técnico de la Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos (REMERTF); Nestor Deras de (REMERTF); Representantes del IICA, CATIE, IPGRI y GTZ. Roger Guillén, Secretario Ejecutivo del CAC</p>	<p><b>Primer borrador para observaciones.</b> <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Segundo borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Versión final del documento de proyecto de cooperación técnica. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Objetivo Específico	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Elaboración de un programa de apoyo a los servicios financieros rurales (COPAFINRURA)</p> <p>El objetivo general del Programa es el de contribuir a un mayor acceso de los pobres rurales a los servicios financieros en Centro América y México.</p>	<p>Fortalecimiento de los proyectos FIDA y/o otros participantes en el subsector agrícola informados sobre las oportunidades y desafíos sobre la integración de la agricultura orgánica por pequeños productores.</p> <p>Iniciativa e instituciones participantes informados sobre la oportunidad y los requisitos que definen los proyectos y los pequeños productores de la región para adoptar la agricultura orgánica.</p> <p>Presentación de sesiones técnicas sobre los discusiones y resultados del Taller.</p>	<p>07/2002 08/2003</p>	<p>Responsable directo Manuel Mascher-Centeno Agencia Agrícola (FIDA) Investigación y Eschianza (IATIE)</p> <p>Coordinador de RUTA J. León, 0.50</p> <p>Staff RUTA: M. Anderson, 4.00 M. Cantón, 4.00 Total semanas: 8.5</p> <p>Otros Responsables:</p>	<p>Boletín de nota conceptual. Peso relativo: 5% Porc. realizado: 0</p> <p>Coordinador de actividad contratado y plan de trabajo formulado. Peso relativo: 10% Porc. realizado: 0</p> <p>Programa y lista de participantes elaborados Peso relativo: 15% Porc. realizado: 0</p> <p>Taller realizado Peso relativo: 40% Porc. realizado: 0</p> <p>Documento finalizado y publicado Peso relativo: 40% Porc. realizado: 0</p>
<p>APP-A: Institucionalidad Rural</p> <p>Programa de Apoyo a los Servicios Financieros Rurales (COPAFINRURA)</p> <p>El objetivo general del Programa es el de contribuir a un mayor acceso de los pobres rurales a los servicios financieros en Centro América y México.</p>	<p>Apoyo a la organización del taller de arranque del Programa.</p> <p>Asesoría y seguimiento al Coordinador del Programa en la implementación.</p>	<p>07/2002 06/2003</p>	<p>Responsable directo Raquel Peña Montenegro - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)</p> <p>Coordinador de RUTA M. Camagni, 10.00</p> <p>Staff RUTA: F. Soto, 4.00 Total semanas: 14</p>	<p>Taller de arranque enpanizado y llevado a cabo Peso relativo: 33% Porc. realizado: 0</p> <p>PCA preparado y presentado al FIDA. Peso relativo: 33% Porc. realizado: 0</p> <p>Periódicas reuniones de coordinación con el Coordinador.</p>



Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Seguimiento y apoyo a la ejecución del Programa de donación del FIDA SERFIRURAL.</p> 			<p>Otros Responsables:</p>	<p>Peso relativo: 33% Porc. realizado: 0</p>
<p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT] 2. CA.TAS.76</p> <p><b>Apoyo a la Agenda del CAC para Fortalecer la Institucionalidad del Desarrollo Rural</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo rural para mejorar la efectividad en las acciones de alivio a la pobreza rural.</p> <p><b>Rol de RUTA:</b> Preparar un proyecto de cooperación técnica para presentarlo al Foro de Donantes de apoyo a la Agenda Agrícola de Ministros del CAC, para obtener recursos financieros para la ejecución. Se pretende que este proyecto sea objeto de una acción interagencial en que participen activamente</p>	<p>Documento de proyecto de cooperación técnica consensuado y finalizado para ser sometido al Foro de Donantes de la Agenda Agrícola del CAC.</p>	<p>06/2002 - 12/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Gregorio Contreras, IICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> N. Espinoza, 6.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00 J. Wadsworth, 1.00 <b>Total semanas: 8</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Sergio Sepúlveda, Director de Desarrollo Rural del IICA; Byron Miranda, especialista en desarrollo rural del IICA. Roger Guillén, Secretario Ejecutivo del CAC.</p>	<p>Primer borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Segundo borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Tercer borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>el IICA, FIDA y DFID.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>				
<b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b>				
<p>1. CA.FI.08</p> <p><b>Consolidación de las Estrategias de Género en Proyectos FIDA</b></p> <p>Apoyar proyectos cofinanciados por FIDA en la incorporación de género, según demandas.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>PRODERNOR. El Salvador. Género aplicado en la ejecución del POA 2002 y en el diseño del POA 2003.</p> <p>FAT. Nicaragua. Género aplicado en el plan de implementación del proyecto.</p> <p>PRODAPEN. Costa Rica. Estrategia e instrumentos del proyecto incorporan género y oferentes de servicios capacitados.</p>	<p>07/2002 - 09/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ana Lucia Moreno, Consultora</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Meza, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00 <b>Total semanas: 5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Directores de proyectos involucrados. ONGs y oferentes de servicios involucrados.</p>	<p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe final de apoyo a los proyectos. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>2. CA.TAS.57</p> <p><b>Diseño del Proyecto Regional de Manejo Integrado de Ecosistemas por Pueblos y Comunidades</b></p> <p>Diseñar una propuesta de Proyecto cuyo objetivo es el fortalecimiento de</p>	<p>Acuerdo legal formalizado y desembolso realizado.</p> <p>Comunidades indígenas fortalecidas.</p> <p>Documento de evaluación del proyecto (PAD) de MIE por Pueblos y Comunidades Indígenas elaborado.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> M. Castro, CCAD</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Martínez, 12.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Kellenberg, 4.00 <b>Total semanas: 16</b></p>	<p>Formalización de los acuerdos legales y desembolso. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ejecución del Plan de Implementación para el diseño del Proyecto. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>comunidades indígenas, la creación de áreas de conservación intracomunitarias y el desarrollo de experiencias piloto en el uso sostenible de la biodiversidad y desarrollo de planes de manejo.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p><b>Otros Responsables:</b>  <b>BID; FONDO INDIGENA;</b>  <b>CICA; CICAFOC</b></p>	<p>Informes de las consultorias.  <b>Peso relativo: 50%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Formulación del PAD.  <b>Peso relativo: 10%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Presentación y revisión del PAD por Banco Mundial, BID y GEF.  <b>Peso relativo: 10%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>3. C.A.TAS.78</b></p> <p><b>Programa de Intercambio de Experiencias</b></p> <p>Organizar y llevar a cabo intercambios 'comunidad - comunidad' entre redes de comunidades indígenas forestales cuyo objetivo es agilizar el proceso de aprendizaje en comunidades indígenas.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Retroalimentar proyectos actuales financiados por el Banco Mundial con los resultados de los Talleres.</p> <p>Retroalimentar el diálogo en materia forestal a nivel de comunidad a comunidad y mundial.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b>  <b>RUTA / Forest Trends</b></p> <p><b>Coordinador de RUTA</b>  <b>J. Martínez, 3.00</b></p> <p><b>Staff RUTA:</b>  <b>Total semanas: 3</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b>  <b>Organizaciones Indígenas,</b>  <b>CICAFOC</b></p>	<p>Programa de trabajo.  <b>Peso relativo: 20%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Planificación y realización de 2 talleres.  <b>Peso relativo: 40%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Diseminación de los resultados.  <b>Peso relativo: 40%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>4. C.A.TAS.79</b></p> <p><b>Focalizar Iniciativas de Proyectos de Desarrollo Rural con Relación al Tema</b></p>	<p>Involucrar a los Proyectos y las Agencias en un Taller para analizar las iniciativas de proyectos con relación al tema indígena.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b>  <b>R.Haudry, FIDA</b></p> <p><b>Coordinador de RUTA</b></p>	<p>Propuesta del Taller.  <b>Peso relativo: 20%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Gestión de recursos.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>Indígena</b> Realización de un taller “Papel de la Población Indígena en proyectos de desarrollo rural”.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Proponer iniciativas concretas a través de recomendaciones.		J. Martínez, 1.00  <b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00 <b>Total semanas: 2</b>  <b>Otros Responsables:</b>	<b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Realización del Taller. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Informe de recomendaciones. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>

**BELIZE**





**RUTA**  
**Annual Work Program**  
**Belize**  
**2002-2003**

Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
<b>AREA: a. Rural Poverty and Food Security</b> <b>1. BE.TAS.10</b> <b>Supervision and Support to CARD Project</b> Community Initiated Agriculture and Resource Management/Rural Development(CARD). CARD Objective: to develop the productive potential of balanced sustainable land use systems and ensure accessible support services to poor smallholder families in Southern Belize.	Periodic supervision visits to the country/project. Terms of reference (ToRs) for specific consultancies. Follow up on implementation and report on major constraints.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsible directo</b> Raquel Peña Montenegro - IFAD  <b>Coordinador de RUTA</b> M. Camagni, 10.00  <b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 10</b>  <b>Otros Responsables:</b> Daniel Silva - MAFC Sergio Garcia - MAFC CARD Director	Mission reports prepared. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  ToRs prepared. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Periodical reports on CARD implementation. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>Supervision and Support to CARD Project.</b>				
<b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]				

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>4. CA.TR.48</p> <p><b>Taller sobre Agricultura Orgánica</b></p> <p>Apoyo técnico para la realización de un taller sobre la adopción de la agricultura orgánica por pequeños productores como instrumento para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Personal de los proyectos FIDA y/u otros participantes en Centroamérica informados sobre oportunidades y desafíos sobre la adopción de la agricultura orgánica por pequeños productores.</p> <p>Iniciativas e instituciones patrocinadoras informadas sobre la perspectiva y las restricciones que enfrentan los proyectos y los pequeños productores de la región para adoptar la agricultura orgánica.</p> <p>Documento de análisis técnico sobre las discusiones y resultados del Taller.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>04/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Reinhold Muschler. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. León, 0.50</p> <p><b>Staff RUTA:</b> M. Andersen, 4.00 M. Castejón, 4.00 <b>Total semanas:</b> 8.5</p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Borrador de nota conceptual. <b>Peso relativo:</b> 5% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Coordinador de actividad contratado y plan de trabajo formulado. <b>Peso relativo:</b> 10% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Programa y lista de participantes elaborados. <b>Peso relativo:</b> 15% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Taller realizado. <b>Peso relativo:</b> 40% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Documento finalizado y publicado. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<p>1. CA.TAS.67</p> <p><b>Programa de Apoyo a los Servicios Financieros Rurales (SERFIRURAL)</b></p> <p>El objetivo general del Programa es el de contribuir a un mayor acceso de los pobres rurales a los servicios financieros en Centro América y México.</p>	<p>Apoyo a la organización del taller de arranque del Programa.</p> <p>Asesoría y seguimiento al Coordinador del Programa en la implementación.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Raquel Peña Montenegro - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Camagni, 10.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> F. Soto, 4.00 <b>Total semanas:</b> 14</p>	<p>Taller de arranque organizado y llevado a cabo. <b>Peso relativo:</b> 33% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>POA preparado y presentado al FIDA. <b>Peso relativo:</b> 33% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Periódicas reuniones de coordinación con el Coordinador.</p>



Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Seguimiento y apoyo a la implementación del Programa de donación del FIDA SERFIRURAL.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p> <p>2. CA.TAS.76</p> <p><b>Apoyo a la Agenda del CAC para Fortalecer la Institucionalidad del Desarrollo Rural</b></p> <p>Objetivo: Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo rural para mejorar la efectividad en las acciones de alivio a la pobreza rural.</p> <p>Rol de RUTA: Preparar un proyecto de cooperación técnica para presentarlo al Foro de Donantes de apoyo a la Agenda Agrícola de Ministros del CAC, para obtener recursos financieros para la ejecución. Se pretende que este proyecto sea objeto de una acción interagencial en que participen activamente</p>	<p>Documento de proyecto de cooperación técnica consensuado y finalizado para ser sometido al Foro de Donantes de la Agenda Agrícola del CAC.</p>	<p>06/2002 - 12/2002</p>	<p><b>Otros Responsables:</b></p> <p><b>Responsable directo</b> Gregorio Contreras, IICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> N. Espinoza, 6.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00 J. Wadsworth, 1.00 <b>Total semanas: 8</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Sergio Sepúlveda, Director de Desarrollo Rural del IICA; Byron Miranda, especialista en desarrollo rural del IICA. Roger Guillén, Secretario Ejecutivo del CAC.</p>	<p><b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Primer borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Segundo borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Tercer borrador para observaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>el IICA, FIDA y DFID.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>				
<p><b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b></p>				
<p><b>1. CA.FI.08</b></p> <p><b>Consolidación de las Estrategias de Género en Proyectos FIDA</b></p> <p>Apoyar proyectos cofinanciados por FIDA en la incorporación de género, según demandas.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>PRODERNOR. El Salvador. Género aplicado en la ejecución del POA 2002 y en el diseño del POA 2003.</p> <p>FAT. Nicaragua. Género aplicado en el plan de implementación del proyecto.</p> <p>PRODAPEN. Costa Rica. Estrategia e instrumentos del proyecto incorporan género y oferentes de servicios capacitados.</p>	<p>07/2002 - 09/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ana Lucia Moreno, Consultora</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Meza, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00 <b>Total semanas: 5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Directores de proyectos involucrados. ONGs y oferentes de servicios involucrados.</p>	<p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe de resultados de consultores aprobado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe final de apoyo a los proyectos. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>2. CA.TAS.57</b></p> <p><b>Diseño del Proyecto Regional de Manejo Integrado de Ecosistemas por Pueblos y Comunidades</b></p> <p>Diseñar una propuesta de Proyecto cuyo objetivo es el fortalecimiento de</p>	<p>Acuerdo legal formalizado y desembolso realizado.</p> <p>Comunidades indígenas fortalecidas.</p> <p>Documento de evaluación del proyecto (PAD) de MIE por Pueblos y Comunidades Indígenas elaborado.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> M. Castro, CCAD</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Martínez, 12.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Kellenberg, 4.00 <b>Total semanas: 16</b></p>	<p>Formalización de los acuerdos legales y desembolso. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ejecución del Plan de Implementación para el diseño del Proyecto. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>comunidades indígenas, la creación de áreas de conservación intracomunitarias y el desarrollo de experiencias piloto en el uso sostenible de la biodiversidad y desarrollo de planes de manejo.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p><b>Otros Responsables:</b> BID; FONDO INDIGENA; CICA; CICAFOC</p>	<p>Informes de las consultorías. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Formulación del PAD. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Presentación y revisión del PAD por Banco Mundial, BID y GEF. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. CA.TAS.78</p> <p><b>Programa de Intercambio de Experiencias</b></p> <p>Organizar y llevar a cabo intercambios 'comunidad - comunidad' entre redes de comunidades indígenas forestales cuyo objetivo es agilizar el proceso de aprendizaje en comunidades indígenas.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Retroalimentar proyectos actuales financiados por el Banco Mundial con los resultados de los Talleres.</p> <p>Retroalimentar el diálogo en materia forestal a nivel de comunidad a comunidad y mundial.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> RUTA / Forest Trends</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Martínez, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 3</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Organizaciones Indígenas, CICAFOC</p>	<p>Programa de trabajo. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Planificación y realización de 2 talleres. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Diseminación de los resultados. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>4. CA.TAS.79</p> <p><b>Focalizar Iniciativas de Proyectos de Desarrollo Rural con Relación al Tema</b></p>	<p>Involucrar a los Proyectos y las Agencias en un Taller para analizar las iniciativas de proyectos con relación al tema indígena.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> R.Haudry, FIDA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b></p>	<p>Propuesta del Taller. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Gestión de recursos.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Indígena</b></p> <p>Realización de un taller "Papel de la Población Indígena en proyectos de desarrollo rural".</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Proponer iniciativas concretas a través de recomendaciones.</p>		<p>J. Martínez, 1.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 1.00</p> <p><b>Total semanas:</b> 2</p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p><b>Peso relativo:</b> 30%</p> <p><b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Realización del Taller.</p> <p><b>Peso relativo:</b> 30%</p> <p><b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Informe de recomendaciones.</p> <p><b>Peso relativo:</b> 20%</p> <p><b>Porc. realizado:</b> 0</p>

**BELIZE**





**RUTA**  
**Annual Work Program**  
**Belize**  
**2002-2003**

Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
<b>AREA: a. Rural Poverty and Food Security</b>  <b>1. BE.TAS.10</b>  <b>Supervision and Support to CARD Project</b>  Community Initiated Agriculture and Resource Management/Rural Development(CARD). CARD Objective: to develop the productive potential of balanced sustainable land use systems and ensure accessible support services to poor smallholder families in Southern Belize.	Periodic supervision visits to the country/project.  Terms of reference (ToRs) for specific consultancies.  Follow up on implementation and report on major constraints.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsible directo</b> Raquel Peña Montenegro - IFAD  <b>Coordinador de RUTA</b> M. Camagni, 10.00  <b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 10</b>  <b>Otros Responsables:</b> Daniel Silva - MAFC Sergio Garcia - MAFC CARD Director	Mission reports prepared. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  ToRs prepared. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Periodical reports on CARD implementation. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>Supervision and Support to CARD Project.</b>  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]				

Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
<p>2. BE.TR.01</p> <p><b>Training and Application of Sustainable Livelihoods Approaches in Poverty Reduction</b></p> <p>Organization and running a training workshop on SL approaches in poverty reduction programs, and support to practical application through a pilot experience.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Orientation workshop for public and private sector staff, project personnel and NGOs to initiate a process of organizational learning.</p> <p>At least one pilot experience will be developed with an appropriate organization or program where elements of SLAs will be tried out.</p> <p>Experiences using SLAs will be reviewed and adjustments made to methodology if necessary.</p> <p>Lessons learned will be systematized, documented and fed back to RUTA partners.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b>  <b>Coordinador de RUTA</b>  J. Wadsworth, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b>  C. Morales, 2.00  L. Deras, 2.00  R. Harrison, 4.00</p> <p><b>Total semanas: 10</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Training workshop conducted.  <b>Peso relativo: 40%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Plan for orientation and follow-up of pilot developed.  <b>Peso relativo: 20%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Methods and approach reviewed and adjusted.  <b>Peso relativo: 20%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Lessons learned systematized.  <b>Peso relativo: 20%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: c. Sustainable Agricultural Production and Natural Resource Management</b>				
<p>1. BE.P.10</p> <p><b>Pilot Project for Small-Scale Aquaculture Production</b></p> <p>Facilitate links between CARD Project and existing successful, small-scale aquaculture technologies.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>CARD approves this proposal in its workplan.</p> <p>TOR for consultancy to provide appropriate technology.</p> <p>Follow up on consultancy delivery.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b>  Director of CARD</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b>  R. Harrison, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b>  <b>Total semanas: 4</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b>  Director of Cooperatives  Fisheries Administrator</p>	<p>Pilot project officially included in CARD workplan.  <b>Peso relativo: 0%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>TOR approved by CARD.  <b>Peso relativo: 0%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Consultancy progress report delivered.  <b>Peso relativo: 0%</b>  <b>Porc. realizado: 0</b></p>



Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
<p>2. BE.P.11</p> <p><b>Pilot Project for Propagation of Selected Fruit Trees</b></p> <p>Prepare proposal for pilot project and identify potential funders.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Define the scope of the project.</p> <p>Prepare concept paper.</p> <p>Circulate concept paper.</p> <p>Facilitate negotiation of concept paper with potential funders.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b> Hugh OBrien, Ministry of Agriculture, Fisheries &amp; Cooperatives</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Harrison, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> N. Espinoza, 0.50 <b>Total semanas:</b> 4.5</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Francine Magloire, Director of Crops</p>	<p>Market research executed and demand estimated. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Concept paper prepared. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Concept paper sent to all relevant persons and agencies. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Memoires of meetings held with potential funders. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. BE.TAS.11</p> <p><b>Foment Ties between MAFC with FAO</b></p> <p>Assistance in identification of technical cooperation opportunities within the FAO framework.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Inventory of project ideas at the MAFC.</p> <p>Short list of viable ideas matched with appropriate FAO assistance mechanisms.</p> <p>Priority activity identified and co-developed with the appropriate technical unit in the MAFC.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b> Mr. Sergio Garcia, CEO; MAFC</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Harrison, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> M. Castejón, 2.00 <b>Total semanas:</b> 6</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Eugene Waight, Belize FAO Correspondent</p>	<p>Project ideas inventory documented and approved by the CEO MAFC. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Short list of viable ideas published. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Project proposal submitted to FAO by MAFC. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
<b>AREA: d. Rural Institutionalality</b>				
<p>1. BE.TAS.12</p> <p><b>Foment Credit Union links to the Productive Sector</b></p> <p>Foment Credit Union links to the rural entrepreneurial sector through institutional strengthening and expansion of its service portfolio.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Credit unions convinced to participate in the project.</p> <p>TOR for consultants prepared, for provision of micro-finance technology training.</p> <p>TOR for consultant to analyze and make recommendations on improving yields.</p> <p>Support organization of training program.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b> Zenaida Moya, Department of Cooperatives</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Harrison, 6.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas:</b> 6</p> <p><b>Otros Responsables:</b> CARD Project Director</p>	<p>Facilitate meeting with Credit Unions, Department of Cooperatives and CARD Project. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>TOR approved for micro-finance technology training. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>TOR approved for yield improvement consultancy. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Training program implemented. <b>Peso relativo: 0%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: e. Cross-Cutting Topics: Indigenous Peoples and Gender</b>				
<p>1. BE-P.09</p> <p><b>Conservation Project in the Sarstoon Temash Reserve</b></p> <p>The project's objective is the reduction of soil degradation and biodiversity conservation.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Legal agreement signed and first disbursement issued.</p> <p>Two project supervision reports.</p> <p>Organization strengthening and improvement of soils and biodiversity conservation.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsible directo</b> Gregorio Ch'oc, Sarstoon Temash Institute of Indigenous Management</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Martinez , 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> R. Harrison, 2.00</p>	<p>Organization for execution and updating of annual operational plan. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Project launch. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Two supervision visits. <b>Peso relativo: 50%</b></p>

Activity	Expected Output	Period	Responsible Team	Progress and Next Steps
			<b>Total semanas: 6</b>  <b>Otros Responsables:</b> Representation of participating communities.	<b>Porc. realizado: 0</b>



**COSTA RICA**





**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**Costa Rica**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b>  1. CR.FI.02  <b>Asistencia Técnica y Seguimiento al PRODAPEN</b>  Asistencia en la implementación del proyecto en planificación, seguimiento e incorporación de género.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Asistencia en Términos de Referencia y seguimiento de revisión de subproyectos.  Asistencia técnica para sistematizar experiencias para socializar resultados y aumentar apoyo de participantes.  Asistencia técnica para definir mecanismos de sostenibilidad post préstamo.  Estrategia de aplicación de género diseñada y con instrumentos para su aplicación en el proyecto. Organizaciones de base capacitadas para brindar servicios al proyecto.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Director, PRODAPEN  <b>Coordinador de RUTA</b> C. Morales, 2.00  <b>Staff RUTA:</b> J. León, 2.00 R. Meza, 4.00 <b>Total semanas: 8</b>  <b>Otros Responsables:</b> A.L. Moreno, Consultora RUTA L. Pérez, consultora	Términos de Referencia aprobados y documentos revisados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Documentos de sistematización publicados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Mecanismos de sostenibilidad formulados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Estrategia diseñada. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Capacitación en género a

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>2. CR.TAS.42</p> <p><b>Apoyo para el Desarrollo de Alternativas de Producción en el Golfo de Nicoya</b></p> <p>El propósito de esta actividad es brindar apoyo técnico y de gestión financiera para realizar un estudio de factibilidad para el desarrollo de alternativas de producción, por parte de los habitantes dependientes de la pesca en el Golfo de Nicoya.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Términos de Referencia elaborados.</p> <p>Apoyo técnico y de gestión para identificación, selección y seguimiento a la consultoría brindados.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ing. Walter Ruiz, MAG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> G. González, 7.00 N. Espinoza, 1.00 <b>Total semanas:</b> 13</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Biólogo Alvaro Otárola, INCOPECA, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura Sr. Juan Carlos Romero, PRODAPEN</p>	<p>organizaciones prestadoras de servicios. <b>Peso relativo:</b> 20% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Brindar apoyo técnico en la elaboración de los Términos de Referencia. <b>Peso relativo:</b> 50% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Brindar apoyo técnico y de gestión para la identificación, contratación y seguimiento de los consultores (indicador condicionado a la obtención de los recursos correspondientes). <b>Peso relativo:</b> 40% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Apoyo técnico y de gestión para la realización de talleres (en caso de que corresponda). <b>Peso relativo:</b> 10% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<p>3. CR.TAS.44</p> <p><b>Apoyo al Programa de Turismo Rural-Agroturismo (MNC)</b></p> <p>Apoyo técnico y de gestión de recursos para la formulación de un estudio de pre-factibilidad con miras a la ejecución de un proyecto</p>	<p>Términos de Referencia elaborados.</p> <p>Apoyo técnico y de gestión para la obtención de recursos financieros en apoyo al Proyecto.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Pedro Pablo Aguirre Alemán, Mesa Nacional Campesina (MNC)</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b></p>	<p>Brindar apoyo técnico en la elaboración de Términos de Referencia. <b>Peso relativo:</b> 70% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Brindar apoyo técnico y de gestión en la búsqueda de financiamiento de recursos internacionales.</p>



Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>de agroturismo cultural campesino en la Región Huetar Norte, como alternativa de empleo y generación de ingresos complementarios por parte de familias campesinas interesadas en el "hospedaje familiar".</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p>G. González, 5.00 N. Espinoza, 1.00 <b>Total semanas: 11</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Yeudi Herrera E., JASON, Jóvenes Agricultores de la Zona Norte María Eugenia Poveda, Instituto Costarricense de Turismo (ICT)</p>	<p><b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>4. CR. TR.22</p> <p><b>Capacitación y Aplicación de Enfoque de MVS en Zona de Pobreza</b></p> <p>Organización y desarrollo de taller de capacitación sobre Metodología MVS, y aplicación de enfoque a una zona de extrema pobreza del país, ubicada en área de confluencia de nuevos proyectos FIDA y Banco Mundial.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Taller con organizaciones del Sector Rural realizado.</p> <p>Plan de orientación y seguimiento para aplicación de enfoque a una zona de pobreza realizado.</p> <p>Ajustes a metodología MVS realizados.</p> <p>Lecciones aprendidas sistematizadas.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Lic. Rodolfo Coto</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Wadsworth, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 1.00 G. González, 8.00 G. Molina, 2.00 L. Deras, 2.00 <b>Total semanas: 15</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> German Molina, RUTA/UTN-Costa Rica Guillermo González, RUTA/UTN-Costa Rica</p>	<p>Realizar taller. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Elaborar plan de orientación y seguimiento. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ajustar metodología. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Sistematizar lecciones aprendidas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b>				
<p>1. CR.TAS.43</p> <p><b>Apoyo a la Producción en Ambiente Controlado</b></p> <p>El propósito de esta actividad es brindar apoyo técnico y de gestión para formular un estudio sobre producción agrícola de pequeños y medianos productores en invernaderos con ambiente controlado, como una alternativa de diversificación.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Términos de Referencia elaborados.</p> <p>Apoyo técnico y de gestión para identificación, selección y seguimiento a la consultoría, brindados.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ing. Walter Ruiz, MAG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> G. González, 7.00 N. Espinoza, 1.00 <b>Total semanas:</b> 13</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Sr. Juan Carlos Romero, PRODAPEN</p>	<p>Brindar apoyo técnico en la elaboración de los Términos de Referencia. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Brindar apoyo técnico y de gestión para la identificación, contratación y seguimiento de los consultores (indicador condicionado a la obtención de los recursos correspondientes). <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Brindar apoyo técnico y de gestión para la realización de talleres (en caso de que corresponda). <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>2. CR.TAS.45</p> <p><b>Apoyo al Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible</b></p> <p>Apoyar en el diseño del componente del fondo de crédito del programa y apoyo en la gestión de recursos financieros ante el BID.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Componente de Fondos Competitivos del Programa, diseñado.</p> <p>Gestión de recursos BID para ejecución del Programa completada.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Lic. Rodolfo Coto, Sector MAG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> G. González, 5.00 <b>Total semanas:</b> 10</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Ing. Ana Zita Bermúdez,</p>	<p>Brindar apoyo técnico y de gestión conducente a la formulación del componente de fondos competitivos del Programa. <b>Peso relativo: 95%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Brindar apoyo técnico y de gestión en el proceso de la formalización de la obtención de los fondos del Programa. <b>Peso relativo: 5%</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>3. CR.TAS.46</p> <p><b>Asistencia Técnica para Programa de Pagos de Servicios Ambientales</b></p> <p>El objetivo del programa es promover la conservación y manejo sostenible de bosques primarios y secundarios a través del desarrollo de mercados para servicios ambientales de ecosistemas forestales.</p> <p>El rol de RUTA es proporcionar asistencia técnica al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en la implementación del Proyecto Ecomercados (BM/GEF). También, RUTA esta apoyando una investigación sobre los impactos sociales del programa de Pagos de Servicios Ambientales sobre los pobres en el sector rural (DFID).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Tres misiones anuales de supervisión.</p> <p>Seguimiento mensual.</p> <p>Reporte sobre en impacto social del programa forestal costarricense.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p>SEPSA Ing. Alexis Calderón, Director de Extensión, MAG</p> <p><b>Responsable directo</b> Jorge Mario Rodríguez, FONAFIFO</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Kellenberg, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> N. Espinoza, 2.00 <b>Total semanas: 10</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Oscar Sánchez, FONAFIFO</p>	<p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Misiones cumplidas. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Reuniones regulares con equipo de FONAFIFO. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Estudio social cumplido, consensuado, y diseminado. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>1. CR.P.10</b> <b>Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica</b> Edición y publicación del perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Documento - Perfil de los pueblos indígenas de Costa Rica, editado, publicado y distribuido.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Lic. Jorge Polmaris, MIDEPLAN <b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina , 2.00 <b>Staff RUTA:</b> G. González, 2.00 J. Martínez, 1.00 <b>Total semanas: 5</b> <b>Otros Responsables:</b>	Editar, publicar y distribuir el documento Perfil. <b>Peso relativo: 100%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>2. CR.TAS.37</b> <b>Proyecto de Conservación de la Biodiversidad y Producción Sostenible de Cacao Orgánico</b> Supervisión y seguimiento técnico y financiero del Proyecto durante su ejecución. Este proyecto tiene como objetivo promocionar y mantener la biodiversidad en finca mejorando el nivel de vida de los productores de cacao orgánico. <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Ejecución efectiva técnica y financiera del proyecto. Comunidades indígenas fortalecidas técnica, empresarial y organizativamente.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Eduardo Somarrivas, Encargado Principal, CATIE <b>Coordinador de RUTA</b> J. Martínez, 4.00 <b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 4</b> <b>Otros Responsables:</b> Organizaciones de la región (APPTA)	Dos misiones de supervisión. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Dos informes de las Misiones. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Un reporte de la UCP. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Dos reportes técnicos de consultores. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>3. CR. TAS.47</b> <b>Apoyo para Desarrollo de Parque</b>	Apoyo en la elaboración de los términos de referencia brindado.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Rosa Rojas, Asociación Desarrollo Integral	Elaborar de Términos de Referencia. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Agroecoturístico de las Etnias Indígenas de Costa Rica</b></p> <p>Apoyo en proceso de desarrollo de un Parque Agroecoturístico Indígena (Quitirrisí, Mora) en beneficio directo de 1800 pobladores indígenas de Quitirrisí e indirectamente de todas las reservas indígenas del país.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Apoyo técnico y de gestión de recursos para la formulación del estudio de prefactibilidad del proyecto brindados.</p>		<p>(ADI)-Quitirrisí</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> G. Molina, 10.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> G. González, 7.00</p> <p><b>Total semanas:</b> 17</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Ing. Orlando Cubillo, Director Regional, Región Pacifico Central, (MAG)</p> <p>Lic. María Eugenia Poveda, Directora, Dirección de Micro y Pequeña Empresa Turística, ICT</p>	<p>Brindar apoyo técnico en la formulación del estudio de prefactibilidad y de gestión en el proceso de articulación interinstitucional conducente a la formulación y ejecución del proyecto.</p> <p><b>Peso relativo:</b> 40% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Apoyo en la gestión de recursos financieros nacionales e internacionales para la ejecución del proyecto (en caso de que se requieran).</p> <p><b>Peso relativo:</b> 20% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>



# **EL SALVADOR**







**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**El Salvador**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b>  <b>1. ES.P.04</b>  <b>Programa de Inversión Productiva Rural</b>  El objetivo del Programa es contribuir a una efectiva reducción de la pobreza rural a través de un aumento en la inversión en actividades económicas rentables y competitivas. El apoyo de RUTA incluye: i) Asistencia técnica para completar el diseño del Proyecto de Promoción de Inversiones Rurales (BM). ii) Asistencia técnica para la puesta en marcha del Proyecto de Reconstrucción y Modernización Rural (FIDA) y iii) Asistencia técnica en la fase de arranque de IPRODAP II (FIDA).	Estudio financiero rural asistido en su elaboración, como contribución a la preparación del Project Appraisal Document (BM).  Insumos técnicos para la fase de organización de la ejecución de proyecto FIDA elaborados.  Mecanismos de coordinación y articulación operativa entre Fondo de Modernización (FIDA) y Proyecto de promoción de inversiones rurales (BM) propuestos.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> M. Jovel, OCP, Oficina Coordinadora de Proyectos  <b>Coordinador de RUTA</b> M. Hirezi, 8.00  <b>Staff RUTA:</b> F. Soto, 3.00 J. León, 3.00 N. Espinoza, 1.00 R. Martínez, 1.00 R. Meza, 1.00 <b>Total semanas: 17</b>  <b>Otros Responsables:</b> Verónica Medina, coordinadora proyecto BM/ MINEC Manuel Ponce, coordinador proyecto FIDA/ MAG Frank Escobar, Director	Informes técnicos proyectos BM y FIDA elaborados. <b>Peso relativo: 70%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Mecanismos de coordinación entre proyectos propuestos. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p> <p><b>2. ES.TAS.46</b></p> <p><b>Capacitación y Aplicación de Enfoque MVS a Zona de Alta Incidencia de Pobreza</b></p> <p>Organización y desarrollo de Taller de Capacitación sobre Metodología MVS, y aplicación del enfoque a una zona en extrema pobreza del país, ubicada en área de intervención de proyecto de desarrollo rural.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Taller con organizaciones del Sector Agropecuario realizado.</p> <p>Plan de orientación y seguimiento para aplicación de enfoque a una zona en extrema pobreza elaborado.</p> <p>Ajustes de metodología MVS realizados.</p> <p>Lecciones aprendidas sistematizadas.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>PRODAP II FIDA/MAG</b></p> <p><b>Responsable directo</b> Manuel Batres, Jefe División de Seguimiento y Evaluación del MAG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Hirezi, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 1.00 J. Wadsworth, 2.00 L. Deras, 3.00 R. Martínez, 8.00 <b>Total semanas: 22</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Guillermo Rivas Merino Coordinador del Proyecto PRODER</p>	<p>Taller realizado. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Plan de orientación y seguimiento elaborado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ajustes de metodología. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Lecciones aprendidas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: b. Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios</b>				
<p><b>1. ES.P.03</b></p> <p><b>Apoyo en la Implementación del Proyecto de Reconversión Agroempresarial</b></p> <p>El objetivo del proyecto es promover el aumento en los ingresos de las actividades agropecuarias y forestales mediante el desarrollo de una mayor eficiencia y creciente valor</p>	<p>Propuesta operativa del Fondo Competitivo asistida en su elaboración.</p> <p>Estrategia operativa del proyecto facilitada en su elaboración y taller de revisión de marco logico organizado y facilitado.</p> <p>Gira de intercambio de experiencias a Nicaragua organizada y facilitada.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Antonio Milán, Coordinador del Proyecto PRA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M.Hirezi, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 3.00 M. Andersen, 1.00 N. Espinoza, 2.00</p>	<p>Propuesta operativa de fondo competitivo facilitada en su elaboración. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Documento de estrategia operativa revisado y ajustado y taller de revisión de marco logico organizado y facilitado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>agregado. El apoyo de RUTA incluye: Asistencia técnica y/o asesoría para la elaboración de estrategia operativa, diseño del fondo competitivo, y apoyo al montaje del sistema de S&amp;E.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Sistema de P, S &amp; E del Proyecto asistido técnicamente.</p>		<p>R. Martínez, 1.00 <b>Total semanas: 15</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Manuel Batres, DISE, División de Seguimiento y Evaluación y Maximiliano Jovel, Oficina Coordinadora de Proyectos.</p>	<p>Gira de intercambio de experiencias a Nicaragua realizada. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Sistema de P, S&amp;E asistido en su organización. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. Realizado: 0</b></p>
<p>2. ES.TAS.48</p> <p><b>Implementación Proyecto Establecimiento Red de Servicios de Apoyo al Des. Agroempresarial</b></p> <p>Asistencia técnica a la implementación del Proyecto "Diseño de Políticas para el Establecimiento de una Red de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroempresarial".</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Proyecto de asistencia técnica en operación con plan de trabajo detallado, y arreglos institucionales realizados.</p> <p>Proyecto supervisado y ajustado periódicamente conforme a las prioridades del MAG.</p> <p>Mecanismos de articulación con otras iniciativas afines del país establecidos.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Eduardo Huidobro, AGRONEGOCIOS, División de Agronegocios</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Hirezi, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> F. Soto, 5.00 M. Castejón, 1.00 R. Martínez, 1.00 <b>Total semanas: 12</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Delmy Linares, FAO Beatriz Alegría, Agronegocios</p>	<p>Plan de trabajo y arreglos institucionales realizados. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Tres misiones de seguimiento y asistencia al proyecto realizadas. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Mecanismos de articulación con otras iniciativas afines del país establecidos. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b>				
<p>1. ES.P.05</p> <p><b>Apoyo al Proyecto PROAMBIENTE</b></p>	<p>Documento del Proyecto finalizado y negociado.</p> <p>Propuestas técnicas revisadas.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ernesto Arce, Director Planificación, MARN</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b></p>	<p>Documento Proyecto finalizado y negociado. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>El objetivo superior del proyecto PROAMBIENTE es ayudar a contrarrestar la degradación ambiental en El Salvador. Como estrategia se propone desarrollar y consolidar un Sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) generados por usos de la tierra y sistemas de cultivo amigables con el ambiente. RUTA proporcionará apoyo técnico al MAG, MARN, Banco Mundial y FAO para la preparación del Proyecto PROAMBIENTE.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Coordinación MAG/MARN realizada.</p>		<p>M. Hirezi, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Kellenberg, 8.00 <b>Total semanas:</b> 11</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Rafael Góchez, Coordinador preparación del Proyecto/MARN Felipe Rivas, ODE/MAG, Oficina de Dirección Estratégica.</p>	<p>Propuestas técnicas revisadas. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Coordinación MAG/MARN realizada. <b>Peso relativo:</b> 10% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<p>1. ES.TAS.49</p> <p><b>Fortalecimiento del Sistema de P, S &amp; E Sectorial Agropecuario</b></p> <p>Fortalecimiento de capacidades del MAG para mejorar el sistema de P,S&amp;E Sectorial Agropecuario.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Documento de soporte técnico para seguimiento sectorial asistido en su elaboración.</p> <p>Sistema de P, S&amp;E apoyado en institucionalización.</p> <p>Taller de capacitación P, S&amp;E para enlaces de proyectos, personal técnico de la Oficina de Desarrollo Estratégico y demás enlaces de instancias del MAG realizado.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Manuel Batres, Director DySE</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M. Hirezi, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. León, 2.00 J. Wadsworth, 2.00 R. Martínez, 2.00 <b>Total semanas:</b> 9</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Max Jovel, Oficina Coordinadora de Proyectos, A. Ocampo, PREVAL.</p>	<p>Documento de soporte técnico para seguimiento sectorial asesorado en su elaboración. <b>Peso relativo:</b> 45% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Asistencia técnica para la institucionalización del sistema de P, S&amp;E. <b>Peso relativo:</b> 20% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Taller de capacitación P, S&amp;E realizado. <b>Peso relativo:</b> 35% <b>Porc. realizado:</b> 0 <b>Peso relativo:</b> 0%</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b>				
<p>. ES.TAS.47</p> <p><b>Apoyo a Pueblos Indígenas de El Salvador</b></p> <p>-Taller de Validación final y diseminación del Perfil Indígena</p> <p>-Propuesta de programa de fortalecimiento institucional indígena y gubernamental (IDF/BM).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Taller de validación final realizado y Perfil Indígena diseminado.</p> <p>Programa de Fortalecimiento elaborado y aprobado.</p> <p>Vinculación con otras iniciativas establecida (Proyectos FIDA).</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Gloria Mejía de Gutiérrez, CONCULTURA, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M.. Hirezi, 1.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Martínez, 2.00 R. Martínez, 8.00 <b>Total semanas: 11</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Rita Araujo, CONCULTURA, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte</p>	<p>Apróbación del acuerdo legal y primer desembolso realizado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Organización para la ejecución. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informes de 2 visitas de supervisión. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Validación nacional del Perfil y publicación. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>2. ES.WID.05</p> <p><b>Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Género en El Salvador</b></p> <p>Apoyar a cinco proyectos financiados por Banco Mundial en la incorporación de género en sus actividades.</p> <p><b>Estado:</b></p>	<p>Proyecto de Promoción de Inversiones Rurales incorpora género en el Marco Lógico, en el PAD y en el PIP.</p> <p>Proyecto de Administración de Tierras incluye género en la nueva encuesta de clientes y en la Campaña de Divulgación.</p> <p>Los proyectos de Educación, Reforma Judicial y Reforma del</p>	<p>07/2002 - 05/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Roberto Aguilar, PROGENIAL</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Meza, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> M. Hirezi, 1.00 <b>Total semanas: 4</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Informes sobre la incorporación de género en PAD, Marco Lógico y PIP incluyen género. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Encuesta y campaña de divulgación contienen género, según los TORs establecidos. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
[Vb Director, PAT]	Servicio Civil incorporan género con base en sus demandas.		Contrapartes de PROGENIAL en los proyectos.	<p>Informes de seguimiento demuestran que se incorpora género en los proyectos.</p> <p><b>Peso relativo: 20%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p>

**GUATEMALA**







**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**Guatemala**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b>  <b>1. GUA.TAS.01</b>  <b>Capacitación y Aplicación de Enfoque en MVS</b>  Organización y desarrollo de taller de capacitación metodológica en MVS y aplicación de enfoque a una zona de extrema pobreza del país.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Taller con organizaciones del sector agropecuario realizado.  Plan de orientación y seguimiento para aplicación de enfoque en una zona realizado.  Ajustes de metodología en MVS realizados.  Lecciones aprendidas sistematizadas.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Beatriz Villeda  <b>Coordinador de RUTA</b> B.Villeda, 8.00  <b>Staff RUTA:</b> C.Morales, 1.00 I.Ramirez, 3.00 J.Wadsworth, 2.00 L.Deras, 1.00 <b>Total semanas: 15</b>  <b>Otros Responsables:</b>	Taller realizado. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Plan de orientación y seguimiento elaborado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Ajustes de metodología. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Lecciones aprendidas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>2. GUA.TAS.41</b>  <b>Fortalecimiento de las Capacidades Locales en Desarrollo Rural</b>	Foros a nivel central y regional con panelistas con experiencia en distintos enfoques.  Programa de capacitación con contenidos para cursos de postgrado o	08/2002 - 03/2003	<b>Responsable directo</b> Carlos Camacho, MINUGUA  <b>Coordinador de RUTA</b>	Organizar y realizar foros. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Diseño de programa de capacitación. <b>Peso relativo: 30%</b>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>Programa de fortalecimiento de las capacidades locales en la aplicación de enfoques de reducción de la pobreza y desarrollo rural.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>maestría a ser negociados con el sector académico para su implementación.</p>		<p>B. Villeda, 5.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas:</b> 5</p> <p><b>Otros Responsables:</b> J.P. Corlazolli, PNUD</p>	<p><b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Establecimiento de alianzas con academia para ejecución de programa. <b>Peso relativo:</b> 20% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>
<p><b>AREA: b. Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios</b></p>				
<p>1. GUA.TAS.44</p> <p><b>Programa de reconversión y diversificación de la producción de café de baja altura</b></p> <p>Asistencia técnica al MAGA en los procesos de ajuste, validación y búsqueda de financiamiento para la ejecución del "Programa de reconversión y diversificación de la producción de café con reducidas perspectivas de mercado", que fue preparado a través de un proyecto TCP de la FAO.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Informe final del proyecto presentado al MAGA.</p> <p>Búsqueda de financiamiento y/u otros requerimientos para la ejecución en gestión.</p>	<p>07/2002 - 12/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ing. Silvia Dávila, Viceministra de Agricultura, MAGA- GUATEMALA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> M.Castejón, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas:</b> 4</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Ing. Maynor Estrada, ONP FAO-Guatemala.</p>	<p>Informe preliminar para discusión presentado al MAGA. <b>Peso relativo:</b> 15% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Consultas realizadas con el MAGA sobre informe preliminar y ajustes convenidos incorporados a la propuesta. <b>Peso relativo:</b> 15% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Propuesta ajustada discutida con otros actores relevantes. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Informe final del TCP transmitido al MAGA. <b>Peso relativo:</b> 25% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Asistencia en búsqueda de financiamiento brindada. <b>Peso relativo:</b> 15% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b>  <b>1. GUA.P.04</b> <b>Asistencia Técnica al Proyecto MIRNA</b>  Asistencia técnica al Proyecto Manejo Integrado de los Recursos Naturales (MIRNA).  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Ajustes institucionales al proyecto incorporados en conjunto con la Misión de Evaluación Técnica, IPP, Instituciones involucradas.  Manual Operativo del proyecto elaborado.  Insumos y aclaraciones en el proceso de negociación y aprobación del proyecto contribuyen a la aprobación del proyecto.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Carmen María López, Proyecto MIRNA <b>Coordinador de RUTA</b> B.Villeda, 20.00  <b>Staff RUTA:</b> J.Martínez, 2.00 <b>Total semanas: 22</b>  <b>Otros Responsables:</b> Rony Abiú, Coordinador Unidad de Proyectos y Cooperación Externa, MAGA	Ayuda Memoria de Misión de Evaluación Técnica. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Documento de Manual Operativo elaborado. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Proyecto negociado. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>2. GUA.TAS.42</b>  <b>Intercambio de Experiencias sobre Innovaciones en Proyectos</b>  Facilitar el intercambio de experiencias sobre innovaciones entre proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, diversificación y manejo sostenible de recursos naturales.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Los proyectos aprovechan experiencias innovativas para mejorar su impacto en las poblaciones rurales.  Cuatro talleres de intercambio entre personal técnico y clientela de los proyectos que trabajan con el MAGA.  Un documento que integre el material sobre las innovaciones de mayor interés para los proyectos.	10/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Rony Abiú, Ministerio de Agricultura  <b>Coordinador de RUTA</b> B.Villeda, 8.00  <b>Staff RUTA:</b> I.Ramírez, 3.00 L.Martínez, 2.00 <b>Total semanas: 13</b>  <b>Otros Responsables:</b> Danilo González, UPCEF- MAGA Unidad de Asistencia Técnica, MAGA	Con los coordinadores de proyectos y la UPCEF elaborar plan de trabajo. <b>Peso relativo: 15%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Organización y realización de talleres. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Documento publicado. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<p>1. GUA.TAS.37</p> <p><b>Sistematización de Experiencias y Lecciones Aprendidas</b></p> <p>Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas sobre fortalecimiento de la participación del tejido social y del poder local.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Cuatro experiencias sistematizadas publicadas y difundidas: i) Coordinadora de Asociaciones de Desarrollo Integral; ii) Grupo de Mujeres de Santa Eulalia; iii) Asociación de Graneros de Oriente; y (iv) ASOCUCH.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>09/2002</p>	<p><b>Responsable directo</b> Rony Abiú, Coordinador Cooperación Externa, MAGA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> B.Villeda, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> I.Ramírez, 3.00 J.León, 1.00 J.Wadsworth, 4.00 A. Herranz, 1.00 <b>Total semanas:</b> 17</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Danilo González, Coop. Externa, MAGA GSD, Consultores Linda Báez, Consultora, RUTA/FIDA</p>	<p>Elaborar Términos de Referencia para contratación de consultorías. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Contratación y realización de los estudios de caso. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Publicación de documentos. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Divulgación de resultados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>2. GUA.TAS.43</p> <p><b>Fortalecimiento para Identificación de Proyectos en MAGA</b></p> <p>Fortalecimiento de las capacidades del MAGA para identificar y negociar proyectos con el apoyo de la cooperación financiera a través de un acompañamiento de las agencias.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Tres perfiles de proyectos identificados y formulados. Personal del MAGA vinculado a proyectos, con conocimiento del proceso de identificación, formulación y aprobación de proyectos de las diferentes agencias financieras.</p>	<p>09/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Rony Abiú, Coordinador Cooperación Externa, MAGA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> B.Villeda, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C.Morales, 1.00 I.Ramírez, 2.00 J.León, 1.00 J.Martínez, 1.00</p>	<p>Acuerdo con Agencias para realizar el proceso. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Diseño de plan de trabajo. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ejecución de plan de trabajo. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b>				
<b>1. GUA.P.05</b> <b>Proyecto BIO-ITZA</b> Proyecto de conservación y manejo de biodiversidad para comunidades indígenas en El Petén. <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Acuerdo Legal firmado y primer desembolso realizado. 2 informes de supervisión y seguimiento.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Carlos Soza, Conservación Internacional, PROPETEN <b>Coordinador de RUTA</b> J.Martínez, 4.00 <b>Staff RUTA:</b> B.Villeda, 2.00 <b>Total semanas: 6</b> <b>Otros Responsables:</b> Asociación BIO ITZA	Organización para la ejecución, actualización del PAO. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Lanzamiento del proyecto. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> 2 visitas de supervisión en la implementación. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>2. GUA. WID.04</b> <b>Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Género en Guatemala</b> Apoyar a 9 proyectos financiados por el Banco Mundial en la incorporación de género en sus actividades. <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Perspectiva de género y etnias incluida en los instrumentos del MIRNA. Personal del Proyecto Fondos de Tierras capacitados y con instrumentos para incorporar género. Proyecto de Administración de Tierras ajusta la campaña de promoción de servicios para incluir género. Proyectos PDL-FONAPAZ, FIS, Caminos Rurales, Educación y Reforma Judicial, han recibido asistencia en género.	07/2002 - 05/2003	<b>Responsable directo</b> Irma Yolanda Avila, Enlace de PROGENIAL <b>Coordinador de RUTA</b> R.Meza, 3.00 <b>Staff RUTA:</b> B.Villeda, 1.00 <b>Total semanas: 4</b> <b>Otros Responsables:</b> Contrapartes de PROGENIAL en los proyectos	Elaboración del Plan de trabajo para apoyar en el tema. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Ejecución de los compromisos del Plan. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b> Presentación de reportes de seguimiento y resultados por proyecto. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>



# HONDURAS







**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**Honduras**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b></p> <p><b>1. HO.TAS.06</b> <b>Estrategia de Desarrollo Rural e Inversiones</b></p> <p>Objetivo: Contribuir a la planificación rural y agrícola. Apoyo al diseño de estrategias, políticas, actividades, identificación de metas otras acciones encaminadas a la formulación, seguimiento y evaluación de estrategias de desarrollo agropecuario, incluyendo, Plan Regional Agrícola, CAC y Ejecución Programa de Gobierno 2002-2006 en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Replanteamiento proyectos FIDA.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Estrategias formuladas. Documentos insumos para formulación de planes. Documentos insumos para seguimiento de planes. Documentos insumos para evaluación de planes.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Laura Suazo de Gallardo, Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG) <b>Coordinador de RUTA</b> D.Meza, 3.00 <b>Staff RUTA:</b> F.Soto, 2.00 J. León, 4.00 J. Wadsworth, 2.00 <b>Total Semanas: 18</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Efraín Corea, UNAT</p>	<p>Insumos técnicos a los documentos de estrategia. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Acciones de seguimiento. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Evaluación de objetivos, políticas, metas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Insumos para evaluaciones operativas. <b>Peso relativo: 15%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Seguimiento estrategia de reducción de la pobreza. <b>Peso relativo: 20%</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>2. HO.TAS.23</p> <p><b>Programa de Adquisición o de Acceso a Tierras (PACTA)</b></p> <p>Objetivo: Facilitar el acceso a la tierra a pequeños productores con o sin tierra por medio de mecanismos de mercado.</p> <p>Apoyo a la expansión del proyecto PACTA a fin de que pueda alcanzar su cobertura más rápidamente.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Apoyo técnico a la OCP para que cumpla su cometido.</p> <p>Apoyo técnico a los intermediarios financieros.</p> <p>Apoyo técnico a las UTLs.</p> <p>Lograr mayor cantidad de beneficiarios.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Hector Tablas, Director OCP/PACTA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> F.Soto, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> D. Meza, 3.00</p> <p><b>Total semanas: 6</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Porc. realizado: 0</p> <p>Esquemas de administración que faciliten la acción de la OCP. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Facilitar a los intermediarios financieros, esquemas de bajo costo. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Hacer más eficiente el apoyo de las UTLs. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. HO.TAS.24</p> <p><b>Nuevas Formas de Salir de la Pobreza</b></p> <p>Objetivo: Contribuir a la reducción de la pobreza.</p> <p>Fortalecimiento de las capacidades públicas y privadas a nivel nacional y local para el diseño de nuevas formas de salir de la pobreza.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Personal del sector público y privado capacitados en formas de salir de la pobreza.</p> <p>Replantear los esquemas de combate a la pobreza en apoyo a la ENRP.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Jonathan Wadsworth, RUTA/DFID</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Wadsworth, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> D. Meza, 2.00 L. Deras, 1.00</p> <p><b>Total semanas: 5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Efraín Corea, UNAT</p>	<p>Porc. realizado: 0</p> <p>Cursos de capacitación. <b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Documentos pertinentes. <b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Insumos técnicos. <b>Peso relativo: 34%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>AREA: b. Comercio Internacional, Mercadeo y Agronegocios</b></p> <p>1. HO.TAS.25</p> <p><b>Negociaciones Comerciales Bilaterales y Multilaterales</b></p> <p>Objetivo: Contribuir a que el sector agrícola logre una posición apropiada en la negociaciones comerciales y su implementación.</p> <p>Proveer criterios para negociación de las propuestas y productos de Honduras ante la OMC y otros socios multilaterales y bilaterales.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Apoyar la formulación posición país ante la OMC.</p> <p>Insumos técnicos para la negociación a nivel de rubro.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Roberto Villeda Toledo, Director UPEG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> D. Meza, 15.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas:</b> 15</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Pablo Ulises Gómez, UPEG</p>	<p>Asistencia a reuniones con productores nacionales y gobierno. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Elaboración documentos de apoyo a las negociaciones. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Participar en las negociaciones. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Contribuir a definir la oferta exportable. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Recopilar y suministrar información estadística y normativa relativa al comercio. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b></p> <p>1. HO.TAS.16</p> <p><b>Proyecto Administración de Áreas Rurales (PAAR)</b></p> <p>Objetivo: Modernizar el registro y tenencia de los predios rurales y asistencia técnica para la producción</p>	<p>Apoyar la evaluación de PAAR I.</p> <p>Apoyar formulación PAAR II.</p> <p>Gestión de recursos.</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Henry Merrian, Director PAAR</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> D. Meza, 7.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b></p>	<p>Insumos técnicos documento de evaluación. <b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Insumos técnicos documento formulación. <b>Peso relativo: 33%</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>compatible con el manejo de recursos naturales.</p> <p>Proyecto de administración de tierras y manejo de recursos naturales.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>			<p>J. Martínez, 2.00</p> <p><b>Total semanas: 9</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Luis Valle, UPEG</p>	<p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Gestión de recursos.</p> <p><b>Peso relativo: 33%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<p>1. HO.TAS.18</p> <p><b>Fortalecimiento del Sector Público y Privado Organizado</b></p> <p>Objetivo: Planificación rural y agrícola concertada con los sectores público y privado.</p> <p>Se trata de mejorar la institucionalidad pública y privada particularmente en la concertación de políticas incluyendo el desarrollo de mecanismos para la articulación del sector público y privado agrícola del país a través de Mesas Agrícolas y Mesas por rubro. Abarca además el fortalecimiento de UPEG en el Programa de Modernización del Estado.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Estrategias concertadas sector público-sector privado.</p> <p>Estrategias concertadas formuladas.</p> <p>Apoyo a la creación de mesas y funcionamiento de mesas por rubro.</p> <p>Apoyo a la creación y funcionamiento de las mesas por rubro.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Roberto Villeda Toledo, Director UPEG</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> D. Meza, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> <b>Total semanas: 3</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Danilo Alvarado, UPEG Mario Nufio, COAGROH</p>	<p>Asistencia reuniones de trabajo.</p> <p><b>Peso relativo: 15%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Formulación términos de referencia.</p> <p><b>Peso relativo: 15%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Documentos técnicos propuesta estrategias.</p> <p><b>Peso relativo: 35%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Insumos técnicos análisis por rubro, sectoriales y globales.</p> <p><b>Peso relativo: 35%</b></p> <p><b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b></p> <p><b>1. HO.TAS.26</b></p> <p><b>Proyecto Fortalecimiento Institucional Pueblos Indígenas</b></p> <p>Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas.</p> <p>IDF para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Gobernación y Justicia y las Federaciones Indígenas y Negras.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Documento IDF aprobado por el BM.</p> <p>Mejoramiento institucional de los principales actores.</p> <p>Mejoramiento del diálogo gobierno-federaciones.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>07/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ricardo Cardona, Director Ministerio Gobernación</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> D. Meza, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Martínez, 3.00 <b>Total semanas:</b> 7</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Miriam Valverde, RUTA Efraín Corea, UNAT</p>	<p>Firma Acuerdo Legal y primer desembolso realizado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Organización para la ejecución. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informes visitas de supervisión y seguimiento. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p><b>2. HO.WID.05</b></p> <p><b>Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en Género en Honduras</b></p> <p>Apoyar a 10 proyectos financiados por B.M. en la incorporación de género en sus actividades.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Proyecto PAAR ha sistematizado y divulgado experiencias en género y nueva operación del Banco incluye género.</p> <p>Proyectos de Educación, Fondo Vial, Mitigación Profuturo, Turismo Costero, FIDAS y Nuestras Raíces, incorporan género basado en las demandas planteadas.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>05/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Adela Medina, Enlace de PROGENIAL <b>Coordinador de RUTA</b> R. Meza, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> D. Meza, 1.00 <b>Total semanas:</b> 4</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Contrapartes de PROGENIAL en los proyectos Efraín Corea, UNAT. Ministerio de la Presidencia</p>	<p>Elaboración del Plan de Trabajo para cada proyecto. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ejecución del Plan de trabajo. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Realización de misiones de supervisión. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Evaluación de los servicios suministrados a los proyectos. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>



**NICARAGUA**







**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**Nicaragua**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b>				
<b>I. NIF105</b>		07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Ladislao Rubio, FIDA  <b>Coordinador de RUTA</b> J. León, 3.00  <b>Staff RUTA:</b> M. Camagni, 6.00 <b>Total semanas: 9</b>  <b>Otros Responsables:</b>	Sistematizar tecnologías para zonas secas. <b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Diseño. <b>Peso relativo: 33%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Diseño de otros componentes. <b>Peso relativo: 34%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>Asistencia Técnica al FIDA</b>  Asistencia técnica al FIDA para elaborar COSOP y para la formulación de un nuevo programa de inversión.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Sistematizar experiencias de tecnología para zonas secas, para transferirlas a productores.  Diseño de componente técnico para los servicios financieros rurales de manera sostenible.  Coordinar acciones del PNIFTA/FAT.			
<b>2. NI.TAS.30</b>  <b>Medios de Vida Sostenible</b>	Taller con organizaciones del sector agropecuario realizado.  Plan de orientación y seguimiento para aplicación de enfoque a una zona.  Ajuste de metodología MVS realizado.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Georgia Taylor- DFID  <b>Coordinador de RUTA</b> L.Miranda. 4.00  <b>Staff RUTA:</b> C.Morales, 0.50	Taller realizado <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Plan elaborado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
Organización y desarrollo de taller de capacitación, metodología MVS y aplicación de enfoque en una zona en extrema pobreza del país ubicada en				

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>área de confluencia de varios proyectos.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Lecciones aprendidas sistematizadas.</p>		<p>J.Wadsworth, 0.50 L.Deras, 1.00 L.Olivas, 0.50 <b>Total semanas: 6.5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b></p>	<p>Ajuste de metodología. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Lecciones aprendidas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. NI.TAS.31</p> <p><b>Asistencia Técnica a la Formulación de un Plan de Acción de Zonas Secas</b></p> <p>Asistencia técnica de manera conjunta con el MAGFOR, y las agencias socias de RUTA, FAO y el FIDA a la Formulación de un Plan estratégico para la Zona Seca, que permita reconvertir los sistemas productivos y mitigar la pobreza de las comunidades rurales localizadas en estas zona.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Propuesta de potenciales acciones conjunta entre FAO y FIDA para las zonas secas de Nicaragua.</p> <p>Propuesta de expansión de Programa de Seguridad Alimentaria (PESA).</p>	<p>07/2002 - 07/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> L. Van Crowder FAO, Luis Osorio, MAGFOR</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> L.Olivas, 1.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> F.Soto, 3.00 L.Miranda, 1.00 <b>Total semanas: 5</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Luis Miranda, Seguridad Alimentaria MAGFOR</p>	<p>Propuesta potenciales. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Propuesta de Expansión. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b>				
<p>1. N.I.P.07</p> <p><b>Programa Nacional de Tecnología y Formación Técnica Agrícola (FAT/FIDA)</b></p> <p>Asistencia técnica a la implementación de las actividades FAT y en el desarrollo estratégico del FIDA.</p>	<p>Asistencia Técnica al FAT en:</p> <p>a) El diseño y montaje del sistema de planificación, seguimiento y evaluación (P, S &amp; E) del componente FAT, financiado por el FIDA, de manera conjunta PREVAL.</p> <p>b) Apoyo a Misiones de Supervisión BM/FIDA en el seguimiento a las</p>	<p>07/2002 - 06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> M. Florez FAT/FIDA y A. Briones FUNICA</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> L.Olivas, 1.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J.León, 4.00</p>	<p>Diseño y montaje P, S &amp; E del FAT. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe de apoyo a misiones BM/FIDA. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Acciones estratégicas vinculadas a</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	actividades programadas al componente FAT.  c) Asistencia Técnica a la planificación de las acciones estratégicas a ser desarrolladas por la fundación privada para el desarrollo (FUNICA).		<b>Total semanas:</b> 5  <b>Otros Responsables:</b> Linda Báez, Consultora RUTA	FUNICA. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0
<b>2. N.I.P.09</b>  <b>Programa Nacional de Ganadería</b> Asistencia técnica a la formulación de un proyecto bancable para la reconversión de la Ganadería Vacuna en Nicaragua.  <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Documento de proyecto bancable formulado para que el Gobierno de Nicaragua, respalde una solicitud de financiamiento ante el BCIE para la ejecución del programa.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Gerardo Escudero, IICA  <b>Coordinador de RUTA</b> L.Olivas, 2.00  <b>Staff RUTA:</b> J.Wadsworth, 2.00 N.Espinoza, 8.00 <b>Total semanas:</b> 12  <b>Otros Responsables:</b> Julio Mayorga, IDR	Preparación programa de trabajo. <b>Peso relativo:</b> 10% <b>Porc. realizado:</b> 0  Primer informe borrador. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0  Segundo informe borrador. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b> 0  Informe Final. <b>Peso relativo:</b> 30% <b>Porc. realizado:</b>
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<b>1. N.I.TAS.28</b>  <b>Asistencia Técnica a la Dirección General de Políticas del MAGFOR</b> Elaborar agenda y el seguimiento de los talleres para validar la políticas del MAGFOR, y generar insumos técnicos que contribuyan a su implementación.	Talleres técnicos desarrollados por el MAGFOR.  Insumos técnicos para la formulación de las políticas tecnológicas, Forestal y cadenas productivas priorizadas por el MAGFOR.  Apoyo técnico a la formulación del programa forestal.	07/2002 - 06/2003	<b>Responsable directo</b> Oscar Neira, MAGFOR Luis Osorio, MAGFOR  <b>Coordinador de RUTA</b> L.Olivas, 20.00  <b>Staff RUTA:</b> L.Miranda, 20.00 <b>Total semanas:</b> 40	Talleres realizados. <b>Peso relativo:</b> 25% <b>Porc. realizado:</b> 0  Insumos técnicos sobre las políticas y cadenas productivas. <b>Peso relativo:</b> 65% <b>Porc. realizado:</b> 0  Insumos a la formulación del Programa Forestal.
<b>Estado:</b>				

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
[Vb Director, PAT]			Otros Responsables: Consultores del MAGFOR y equipo técnico de la institución	Peso relativo: 10% Porc. realizado: 0
<p><b>2. N.I.TAS.29</b></p> <p><b>Sistemas Financieros Rurales</b></p> <p>Asistir técnicamente el desarrollo de los servicios financieros rurales.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Informe de recomendaciones con relación al sistema de financiamiento.</p> <p>Un taller de trabajo sobre las conclusiones y recomendaciones del informe.</p> <p>Haber contribuido al diseño del componente de finanzas rurales de una nueva operación del FIDA en Nicaragua.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>06/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> L. Van Crouder FAO, Oscar Neira, MAGFOR</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> L.Olivas, 1.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> F.Soto, 4.00 M.Camagni, 4.00 <b>Total semanas: 9</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Consultor, FIDA</p>	<p>Preparación de programa de trabajo.</p> <p><b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informe técnico. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Realización de taller. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. Realizado: 0</b></p>
<b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b>				
<p><b>1. N.I. WID.03</b></p> <p><b>Fortalecimiento de la Capacidad Operativa en Género en Nicaragua</b></p> <p>Apoyar a proyectos financiados por Banco Mundial en la incorporación de género en sus actividades.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>INIFOM ha sistematizado la experiencia de género en Nueva Guinea y dispone de instrumentos para incluir género en el ciclo de los subproyectos.</p> <p>Los proyectos de Mitigación, Salud, Educación, Red Vial, FISE, MECOVI, reciben asistencia en género según las demandas.</p>	<p>07/2002</p> <p>-</p> <p>05/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Milagros Leytón, Enlace de PROGENIAL</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> R.Meza, 3.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> L.Olivas, 3.00 <b>Total semanas: 6</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Contrapartes de PROGENIAL en los</p>	<p>Diseño del Plan de Trabajo. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ejecución del Plan de Trabajo. <b>Peso relativo: 60%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Informes de seguimiento al Plan. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Evaluación de los servicios brindados.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
			proyectos	Peso relativo: 20% Porc. realizado: 0



# PANAMA







**RUTA**  
**Programa Anual de Trabajo**  
**Panamá**  
**2002-2003**

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<b>AREA: a. Pobreza Rural y Seguridad Alimentaria</b>				
1. PA.FI.05		7/2002	<b>Responsable directo</b> K. Whyles, Hermel López/ Lizka Binns/Armando Silvestre	Reuniones de coordinación, giras, identificación de documentación y preparación de documentos. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>Asistencia en la Implementación de Proyectos FIDA</b>	Asistencia a los talleres realizados (género, comercialización entre otros), facilitada.	- 6/2003	<b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 2.00	Elaboración del alcance de la asistencia y términos de referencia/misión. <b>Peso relativo: 35%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
Los (3) proyectos del FIDA en el país actuales y previstos suman una cartera superior a los US\$50.0 millones, y es prioridad del Gobierno de Panamá una ejecución eficiente y eficaz que permita el cumplimiento de los objetivos sociales planteados.	Recomendaciones y lecciones aprendidas e implementadas en los proyectos.  Insumos técnicos y logísticos en las misiones y/o reuniones realizadas a los proyectos.		<b>Staff RUTA:</b> J. Balcet, 0.50 J. Kellenberg, 0.50 J. León, 2.00 <b>Total semanas: 5</b>	Asistencia técnica y logística, brindada. <b>Peso relativo: 35%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]			<b>Otros Responsables:</b> Roberto Haudry, FIDA Armando Silvestre, Coordinador Macroyectos. Aracelly Méndez, MEF	


Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>2. P.A.P.06</p> <p><b>Asistencia al Proyecto Pobreza Rural y Recursos Naturales y en la Preparación de Fase II.</b></p> <p>Asistir a la implementación del Proyecto y en la Preparación de la Fase II, con los siguientes subcomponentes:</p> <p>Agroproductivo (MIDA), Ambiente (ANAM), y Municipalidades Rurales (MEF).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Asistencia al Documento Nacional del Proyecto Fase II PPRRN, brindada.</p> <p>Insumos Técnicos para la elaboración del Marco Conceptual del Proyecto consensuado con las instituciones, brindados.</p> <p>Asistencia al Documento Conceptual del Proyecto (DCP) para el Banco Mundial.</p> <p>Insumos técnicos a la fase actual de implementación.</p>	<p>7/2002 - 6/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Agustín Moscoso, Director Proyecto PPRRN</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 10.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Balcet, 1.00 J. Kellenberg, 8.00 R. Ríos, 2.00 <b>Total semanas: 21</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Armando Silvestre, Asesor Macroproyectos Augusto Herrera, Director de Planificación, a.i.</p>	<p>Marco Lógico elaborado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Apoyo logístico a las diferentes misiones/reuniones/foros realizados <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Documento Conceptual del Proyecto elaborado. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Misiones, giras, reuniones, talleres realizados. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<p>3. P.A. TR. 09</p> <p><b>Capacitación y Aplicación del Enfoque de MVS a Zona de Alta Incidencia de Pobreza</b></p> <p>Organización y desarrollo de Taller de Capacitación y Metodología MVS y aplicación del enfoque a una zona de extrema pobreza del país, ubicada en área de confluencia de nuevos proyectos.</p>	<p>Taller con organizaciones del Sector Agropecuario, realizado.</p> <p>Plan de orientación y seguimiento para aplicación de enfoque a una zona en extrema pobreza elaborado.</p> <p>Ajustes de metodología MVS realizados.</p> <p>Lecciones aprendidas sistematizadas.</p>	<p>7/2002 - 6/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Bruno Mojica, Director de Desarrollo Rural</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 1.00 J. Wadsworth, 2.00 L. Deras, 3.00 <b>Total semanas: 10</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Agustín Moscoso,</p>	<p>Taller realizado. <b>Peso relativo: 40%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Plan de orientación y seguimiento elaborado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Ajustes de metodología. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Lecciones Aprendidas.</p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p> <p><b>AREA: c. Producción Agropecuaria Sostenible y Manejo de Recursos Naturales</b></p> <p>1. PA.P.07</p> <p>Asistencia en la Preparación del MASAR-CHCP e Implementación del Programa de Manejo Sostenible de las Áreas Rurales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.</p> <p>El documento de estrategia y concepto ha sido consensuado y con la prioridad que otorgó el país al proyecto, se inicia la organización para la preparación del MASAR y la ejecución del Programa de Manejo Sostenible de las Áreas Rurales de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá como TCP/FAO a nivel piloto de campo, como fase preparatoria al futuro programa de inversiones del Banco Mundial.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Facilitar la formalización del Acuerdo Legal MEF / Banco Mundial (PHRD Sup.), firmado. Insumos Técnicos al Acuerdo de asistencia preparatoria elaborado y firmado PNUD / MIDA / Banco Mundial.</p> <p>Insumos Técnicos para la preparación del Documento Conceptual de Proyecto (PCD).</p> <p>Insumos Técnicos al Documento de Información del Proyecto (PID).</p>	<p>7/2002 - 6/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Oscar A. Monteza, Coordinador del Proyecto <b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 10.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Kellenberg, 4.00 M. Castejón, 1.00 R. Meza, 1.00 <b>Total semanas: 16</b></p> <p><b>Otros Responsables:</b> Gonzalo González, Secretario Técnico Darío Tovar, Jefe de la Unidad Ambiental Augusto Herrera, Director de Planificación, a.i.</p>	<p>Términos de Referencia de consultorías elaborados. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Consultores identificados. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Misiones, giras y reuniones realizadas. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Asistencia en la planificación y organización de tareas y elaboración de informes. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Apoyo logístico. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p>2. PA.TAS.20</p> <p><b>Asistencia al Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño</b></p> <p>Supervisión y apoyo mediante insumos técnicos para promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la vertiente atlántica de Panamá (GEF/BM).</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Tres Misiones de Supervisión.</p> <p>Asistencia Técnica realizada.</p>	<p>7/2002 - 6/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Ivan Valdespino, ANAM</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> J. Kellenberg, 8.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> J. Martinez, 1.00 Z. Cajiga, 0.50 <b>Total semanas:</b> 9.5</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Ricardo Anguizola, Carmen Guevara</p>	<p>Giras, Reuniones y Coordinaciones. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Reportes de Avance. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Insumos técnicos. <b>Peso relativo: 50%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>
<b>AREA: d. Institucionalidad Rural</b>				
<p>1. PA.P.03</p> <p><b>Asistencia al PRONAT/BM</b></p> <p>El PRONAT está finalizando la etapa de diseño de su sistema de S&amp;E. Es preciso iniciar la asistencia por etapas fortaleciendo la capacidad institucional a través de metodologías para fortalecer este sistema.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>Asistencia a las Misiones realizadas.</p> <p>Asistencia a los Talleres realizados en la metodología Puesta en Marcha (PeM).</p> <p>Asistencia a la Puesta en Marcha de la metodología.</p>	<p>7/2002 - 6/2003</p>	<p><b>Responsable directo</b> Félix Adames</p> <p><b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 2.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> C. Morales, 0.50 J. Balcet, 0.25 J. León, 1.00 <b>Total semanas:</b> 3.75</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Linda Báez 2.0 semanas Eric Jiménez, Director de Reforma Agraria Gonzalo González, Secretario Técnico</p>	<p>Definición del alcance de la asistencia-misión. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Términos de Referencia elaborados. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Identificación del consultor. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p> <p>Planificación y organización del Taller. <b>Peso relativo: 30%</b> <b>Porc. realizado: 0</b></p>

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
2. P.A. TAS.34 <b>Asistencia al Plan Panamá Rural</b> La estrategia planteada para el Sector Agropecuario 2001-2004, es la guía para conducir el resto de las actividades a desarrollar en el sector, específicamente en sus programas PROALIANZA Y PROGENTE. <b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]	Pasantía realizada a El Salvador en S&E. Facilitación de las Mesas de Trabajo de Género, brindada Facilitación de las Mesas de Trabajo de Asuntos Indígenas, brindada.	7/2002 - 6/2003	<b>Armando Silvestre,</b> Coordinador de Macroproyectos  <b>Responsable directo</b> Rigoberto González I, Coordinador del PPR  <b>Coordinador de RUTA</b> Z. Cajiga, 6.00  <b>Staff RUTA:</b> J. León, 2.00 J. Martínez, 1.00 R. Meza, 1.00 <b>Total semanas: 10</b>  <b>Otros Responsables:</b> Bruno Mojica, Director de Desarrollo Rural Augusto Herrera, Director de Planificación, a.i. Gonzalo González, Secretario Técnico	Taller realizado. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. Realizado: 0</b>  Términos de Referencia elaborados en S&E y Asuntos Indígenas <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Identificación de consultores. <b>Peso relativo: 15%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Planificación y organización de reuniones de coordinación en género, Asuntos Indígenas y S&E. <b>Peso relativo: 25%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Organización y desarrollo del encuentro género. <b>Peso relativo: 20%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Mesas de Trabajo conformadas de género y asuntos indígenas. <b>Peso relativo: 15%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>
<b>AREA: e. Temas Transversales: Pueblos Indígenas y Género</b>				
1. P.A. WID.08 <b>Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de</b>	Aspectos de género unificados en organizaciones y personal del Proyecto de Pobreza Rural y Recursos Naturales, y; la Fase II del proyecto incorpora género en	07/2002 - 05/2003	<b>Responsable directo</b> Ricardo Mejía, Enlace de PROGENIAL	Diseño del Plan de trabajo. <b>Peso relativo: 10%</b> <b>Porc. realizado: 0</b>  Ejecución de los Planes de Trabajo.

Actividad	Producto Esperado	Duración	Equipo Responsable	Progreso y Próximos Pasos
<p><b>Género en Panamá</b></p> <p>Apoyar a seis proyectos financiados por el Banco Mundial en la incorporación de género en sus actividades.</p> <p><b>Estado:</b> [Vb Director, PAT]</p>	<p>PAD, Marco Lógico y PIP.</p> <p>Género incorporado en estrategia e instrumentos del PRONAT y en el diseño del proyecto de la Cuenca del Canal (PAD, Marco Lógico, PIP).</p> <p>Los proyectos de Salud, Educación y FIS, reciben asistencia en el tema, según las demandas.</p>		<p><b>Coordinador de RUTA</b> R. Meza, 4.00</p> <p><b>Staff RUTA:</b> Z. Cajiga, 0.50 <b>Total semanas:</b> 4.5</p> <p><b>Otros Responsables:</b> Contrapartes de PROGENIAL para proyectos financiados por el banco Mundial.</p>	<p><b>Peso relativo:</b> 45% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Informes de resultados. <b>Peso relativo:</b> 15% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Realizar misiones de supervisión. <b>Peso relativo:</b> 10% <b>Porc. realizado:</b> 0</p> <p>Evaluación de los servicios brindados. <b>Peso relativo:</b> 20% <b>Porc. realizado:</b> 0</p>



of 100

100  
100  
100

100
