


**La Metodología EDO del CENTA:
Caso Agencia de Extensión Opico,
Departamento de La Libertad,
El Salvador, 1995**

Por: Hugo Mata¹



¹ Presentado en Taller: Metodología de Extensión Dirigida a Objetivos, organizado por FIDER-INTA y Proyecto IICA-Holanda/LADERAS C.A. Managua, Nicaragua, 2-4 de octubre de 1995

1107
C20
13

BV 10264

00000440

CONTENIDO

Página

I. Introducción y Descripción de la zona

1.	Introducción.....	1
2.	Descripción de la zona.....	2

II. Diagnóstico

3.	Diagnóstico de una comunidad.....	19
4.	Inventario de productores.....	32
5.	Sectorización y prueba de rutas.....	40
6.	Organización de círculos vecinales de productores (CVP).....	46
7.	Cuadro de cubrimiento geográfico.....	55
8.	Tecnología actual del productor (TAP).....	56
9.	Ficha de productor enlace (FPE01).....	58

III. Planificación

10.	Descripción de la tecnología disponible (TD).....	61
11.	Descripción de la tecnología recomendable (TR).....	63
12.	Registro de objetivos.....	65
	12.1. Memoria de planteamiento de objetivos.....	69
13.	Cronograma anual de actividades.....	71
14.	Plan anual de mensajes prioritarios.....	86
15.	Planificación de ensayos y parcelas.....	88

IV. Trabajo y seguimiento

16.	Plan bisemanal de actividades e informe.....	93
17.	Informe de cumplimiento de metas.....	95
18.	Situación actual componente extensión.....	116
19.	Alcance de meta física.....	119
20.	Informe parcelas.....	122
21.	Manejo parcelas.....	128
22.	Gira de campo.....	129
23.	Día de campo.....	134
24.	Concurso de frijol.....	142

V. Evaluación

25.	Cuadro comparativo de situación actual, objetivos y resultados.....	147
-----	---	-----



I. INTRODUCCION Y DESCRIPCION DE LA ZONA

1. INTRODUCCION:

Con el propósito de brindar un mejor servicio en la Asistencia Técnica Agropecuaria a los pequeños y medianos productores Salvadoreños, El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), ha complementado la Metodología de Extensión Agropecuaria llamada: Extensión Dirigida a Objetivos (E.D.O). El propósito principal buscado, es elevar el nivel de vida de los pequeños productores con miras a que se vuelvan productores más eficientes.

Los principales fundamentos que componen esta metodología son:

- Definición de Objetivos precisos.
- Visitas periódicas del Extensionista a las Fincas de los Productores.
- Capacitación permanente del Extensionista.
- Aplicación de un Programa de Trabajo claramente definido.

En esta oportunidad se presenta las experiencias del trabajo desarrollado por la Agencia de Extensión Agropecuaria del CENTA en el municipio de San Juan Opico en el Departamento de La Libertad, El Salvador, ejecutando la Metodología de Extensión Dirigida a Objetivos E.D.O.

Dicha experiencia será comparada con los técnicos extensionistas del INTA-NICARAGUA, mediante una exposición del contenido de la Metodología.

dmaa.

27/09/95.-

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

El municipio de San Juan Opico, cuenta con 28 cantones, con una población rural de 47,724 y urbana de 5,469 la Agencia se encuentra ubicada en el Centro de la ciudad, se están atendiendo 12 cantones, el área agrícola incluye los rubros principales: Maíz, frijol, maicillo.

El área pecuaria: (Planes profilácticos) y en el área forestal se están estableciendo parcelas agroforestales.

La Agencia cuenta con una infraestructura propia y está equipada con las necesidades básicas.


Entre el equipo de trabajo se cuenta con 5 motos y un vehículo de cuatro ruedas, doble tracción.

El personal está conformado por 5 extensionistas, 1 Coordinador de Agencia, 1 Secretaria, 1 Ordenanza y 1 Vigilante.

Esta agencia se encuentra a 18 Kms., del CDT San Andrés.

TECNICO	CANTON	Nº DE CVP	Nº DE PRODUCTORES POR CANTON.
1. Ronald Orozco.	San Pedro Mártir. Chantusnene.	11 13	90 110
2. Roxana Sandoval.	S. Nicolás Los Encuen- tros. Los Amates. Tehuicho.	8 6 3	68 70 34
3. Mario César Ventura.	San Felipe. Agua Escondida. San Pedro Oriente.	9 11 4	90 110 40
4. Juan Ramón Parada.	Barranca Honda. Minas de Plomo. Lomas de Santiago.	14 4 6	126 36 42
5. Hugo Mata Portillo.	San Antonio.	24	200
TOTAL	12	113	1,016

EL SALVADOR

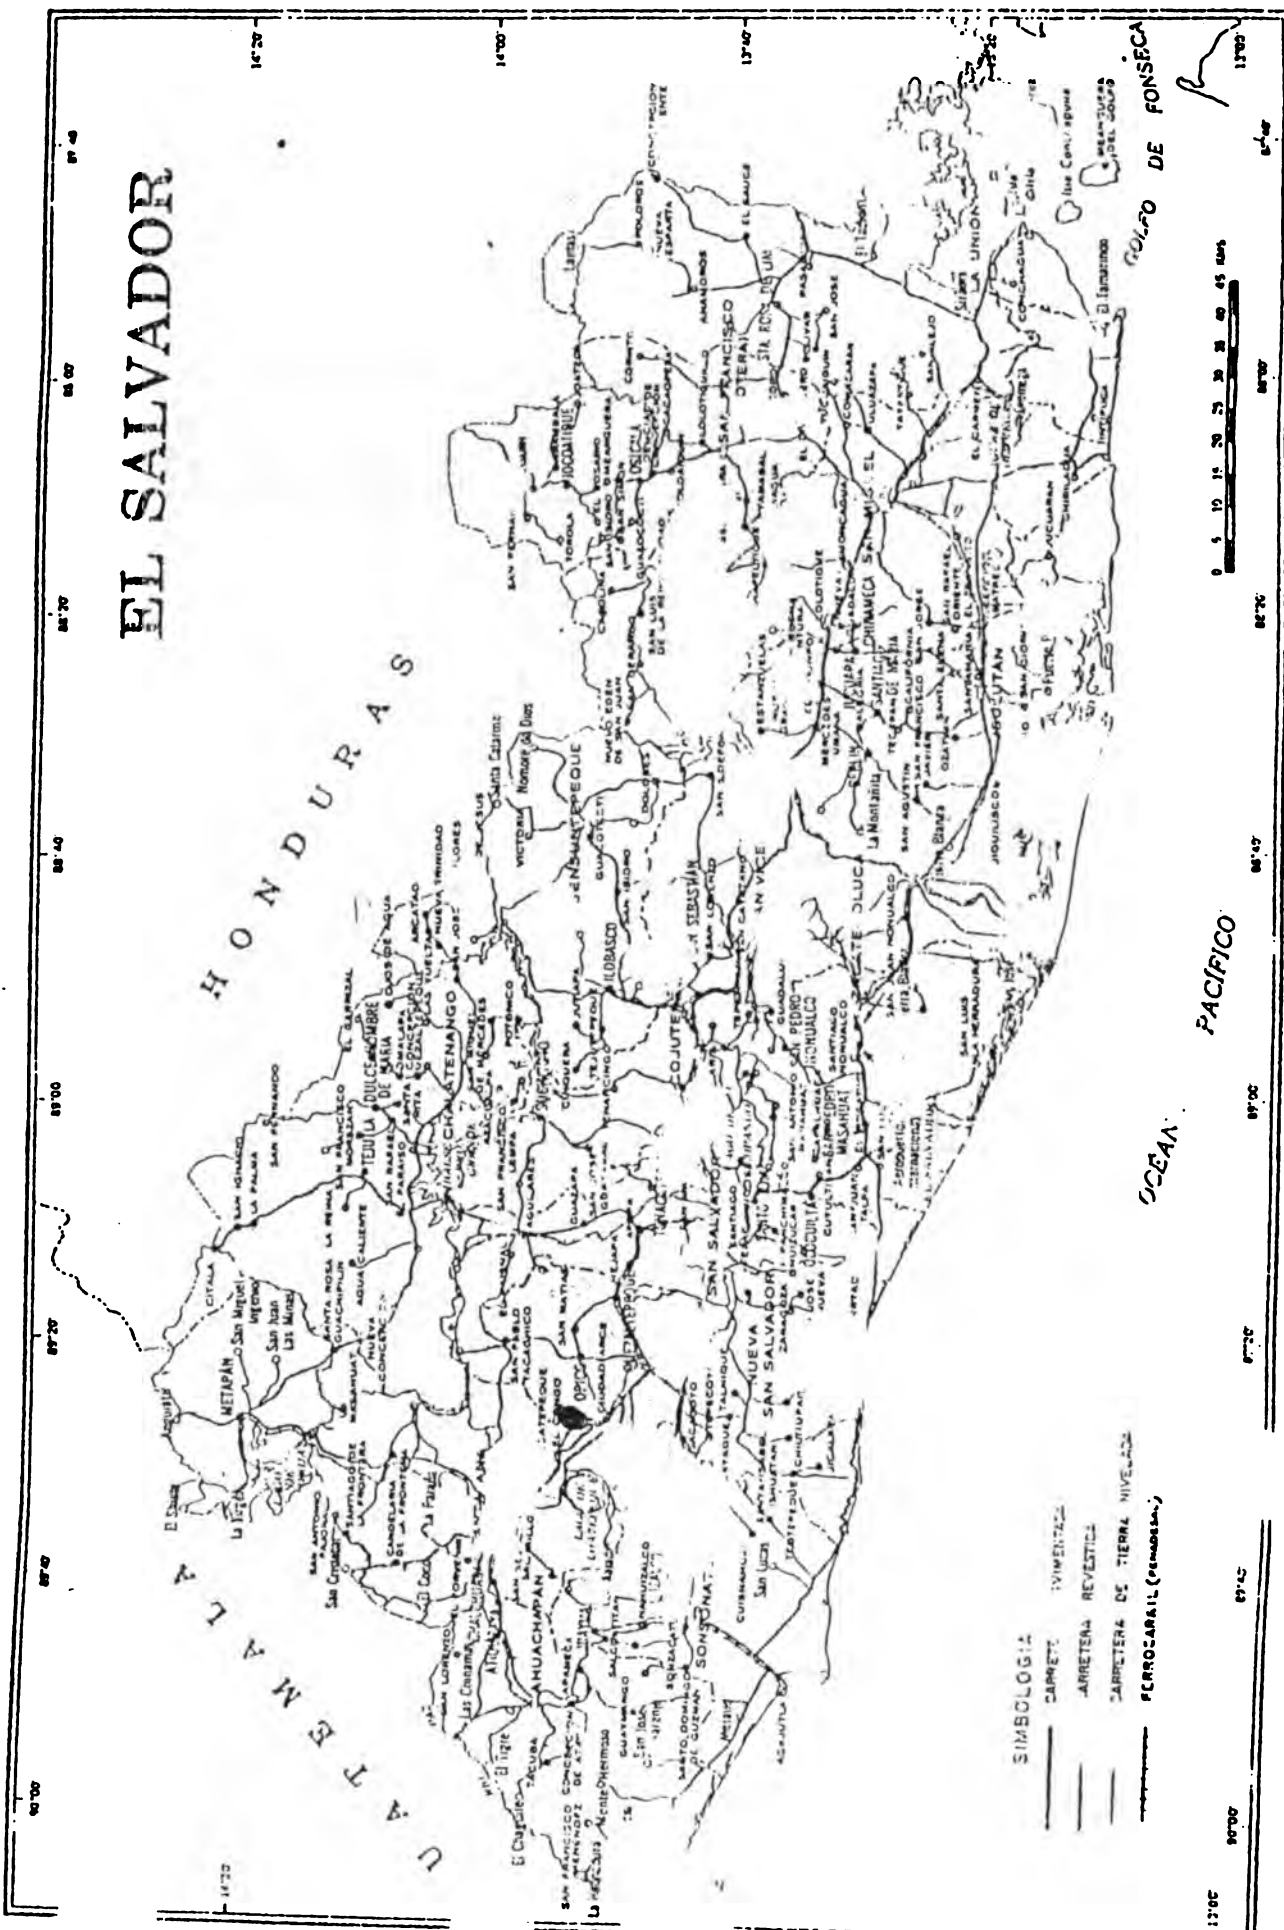

- SIMBOLOGIA**
- CAMIÑETTES
 - ARRETERA REVESTIDA
 - CAMIÑETTES DE TIERRA NIVELADA
 - FERROARRIAL (pendiente)

PACIFICO

OCEAN

GOLFO DE FONSECA



13°00'

87°00'

87°30'

88°00'

88°30'

89°00'


89°30'

90°00'

13°30'

MUNICIPIO SAN JUAN OPICO

MUNICIPIO SAN PABLO TACACHICO

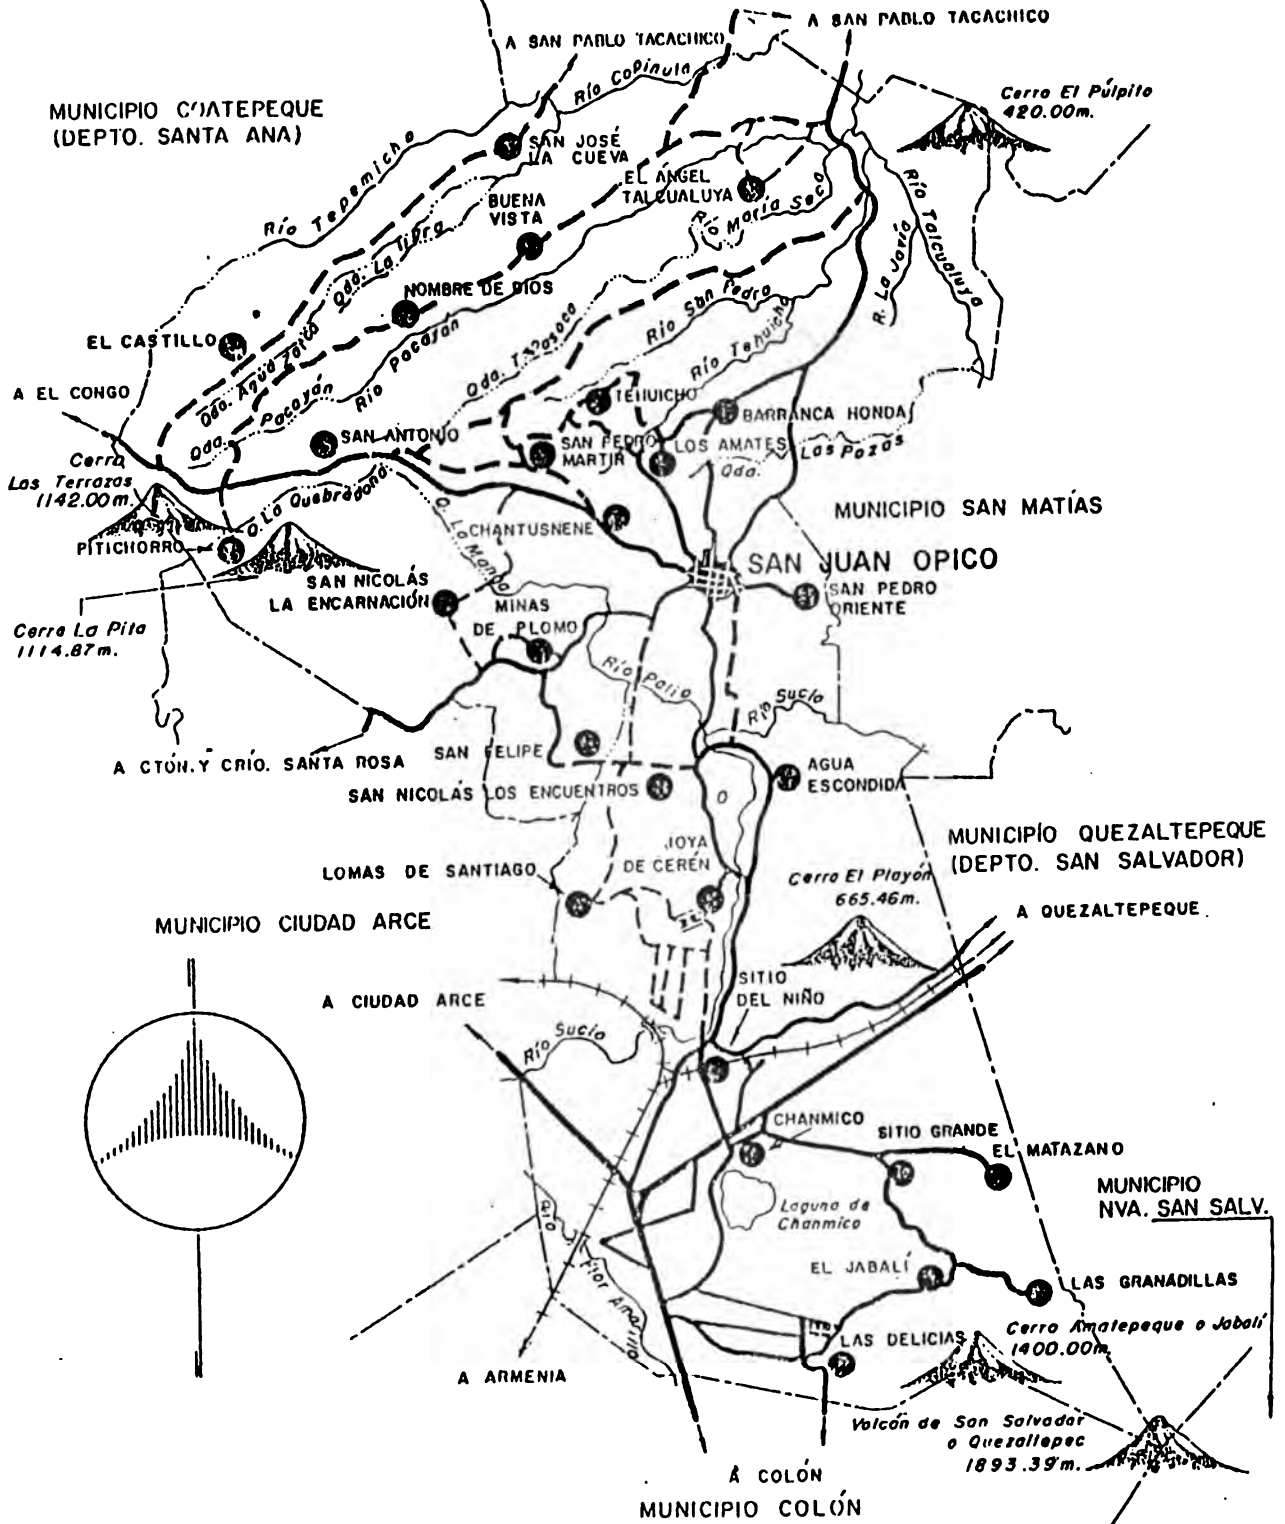

SAN JUAN OPICO

UBICACION GEOGRAFICA

Municipio del distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Está limitado - por los siguientes municipios: Al N, por San Pablo Tacachico; al E, por San Matías y - Quezaltepeque; Al S, por Ciudad Arce y Colón y al W, por Coatepeque, departamento - de Santa Ana. Se encuentra ubicado entre las coördenadas geográficas siguientes: 13°58'03" LN. (extremo septentrional) y 13°44'13" LN. (extremo meridional); 89°17'10" LWG. (extremo Oriental) y 89°27'34" LWG. (extremo occidental).

DAI. CLIMATICOS.

Precipitación	: 1600 a 2000 mm al año.
Intensidad	: 1.88 mm/minuto durante 1/2 h. 1.47 mm/minuto durante 47 minutos.
Distribución	: Mayo - Octubre.
Tº	: Zona baja 27º Zona alta 21º X 24º
Altitud	: Varía de 460 a 1000 m.s.n.m.
Canícula	: Junio del 21 al 30 (9 días) Julio del 7 al 10 (3 días) Julio del 14 al 19 (5 días) Julio del 23 al 30 <u>(7 días)</u> <u>(24 días)</u>

Se considera canícula de 7 días en adelante.

CLASE DE SUELO.

II E	3.65%
III A.....	13.53%
III AS	1.02%
III E.....	5.51%
III ES	0.98%
IV ES	6.29%
V A	0.67%
V S	1.02%
VI E	2.84%
VII ES	64.21%
VIII S	0.28
TOTAL.....	100%

Topografía : Plano : 15%
Semiplano : 45%
Quebrado : 40%

SUELOS.

Grupos : Regomiles : 20%
Grumosoles : 60%
Latosol arcillo
rojizo. : 20%

Color : Café pálido.
Gris oscuro.
Arcilla acromática negra.
Café oscuro.

Drenaje Interno : Rápido : 15%
Regular : 70%
Mediano : 10%
Lento : 5%

Drenaje Externo : Rápido : 70%
Mediano : 20%
Lento : 10%

Rendimiento : Altos y moderados.

Uso Actual : Se encuentra cultivos de : Maíz, frijol, maicillo, caña, hortaliza,
cítricos, café, pastos y armaz.

% de erosión : 30%
Severa : 30%
Fuerte : 50%
Moderada : 20%
Nula : 0

USO DE LA TIERRA.

<u>TOPOGRAFIA</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>AREA (M2)</u>	<u>USO</u>
- Ladera	Relevo	3,638.48 mz.	Maíz-Frijol.
	Asocio	646.25 mz.	Maíz-sorgo.
	Monocultivo	1,500 mz.	Café.
		9,000 mz.	Bosques y montañas.
- Plana		236 mz.	Bosques, montañas y otros.
	Relevo	3,183.67 mz.	Maíz-frijol
	Asocio	129.25 mz.	Maíz-sorgo
	Monocultivo	1,000 mz.	Cítricos.
	Monocultivo	10 mz.	Hortalizas
	Monocultivo.	5	pepino, tomate
		1,001 mz.	Caña
		500 mz.	Café.
- Semiplana.	Relevo.	2,274.05 mz.	Maíz-frijol
	Asocio.	517 mz.	maíz-sorgo.
	Monocultivo.	7,424 mz.	Bosques, montañas, matorral
		3,958.64 mz.	Pasto.
		500 mz.	Café.
	Relevo	9,096.2 mz.	Maíz-frijol.
	Asocio.	1,292.5 mz.	Maíz-sorgo.
	Monocultivo.	4,501 mz.	Cítricos, caña.
		Monocultivo.	15 mz.
		5 mz.	tomate.
	10 mz.	pepino.	
Bosques y montañas.	16,660.08 mz.		
Pastos.	3,958.64 mz.		
	<u>GRAN TOTAL.</u>	<u>35,523.42</u>	

PATRONES DE CULTIVO.

o (Maíz-frijol)

- : Se siembra a partir del 15 de Mayo ó cuando se establece la lluvia para el maíz, a un distanciamiento de 90-110 cms entre surco y entre postura dependiendo el tipo y postura 40-50 cms con 2-3 granos. Para el frijol se siembra después de la dobla, a partir del 15 de agosto a un distanciamiento entre surco es de 40 cms ó 2 surcos por calle del surco de maíz. 3-5 granos por postura y su distanciamiento entre postura 20-35 cms.

o Maíz-Sorgo

- ; Se siembra a partir del 15 de Mayo ó cuando se establece el invierno (maíz). El sorgo se siembra a partir del 15 de Agosto poniendo 2 surcos en la calle del maíz a un distanciamiento entre 25-35 cms entre postura con 10-12 granos por postura. Cuando es Criollo se siembra al centro de la calle de maíz al mismo distanciamiento del maíz entre postura y se siembra el 15 de Junio entre postura y postura 40-50 cms y se le pone 10-12 granos entre postura.

ultivo (Café)

- : Se siembra al cuadro de 2 a 3 varas, predominan las variedades Paca y Bourbon. Se siembra 1 plántula por postura, predomina la sombra de Peto, transplante Mayo-Junio.
- : Epoca de siembra Mayo-Junio. Distanciamiento 6-8 mts al cuadro. Se siembra 1 plántula por postura.
- : Se siembra de Noviembre-Diciembre, en cadena doble, sencilla a un distanciamiento entre surco 140-150 mts, se necesita entre 10 a 12 toneladas/mz.

Liza: tomate

- : Se realiza el semillero en Abril. El transplante se hace en Mayo y Agosto. Noviembre (Riego) Mayo (Invierno) Octubre (Invierno) Agosto (Invierno)

En época de invierno se siembra el 15 de agosto de 90 a 120 cms entre surco y entre postura de 20 a 40 cms, el transplante se hace 1 planta por postura. el transplante se hace 20-22 días al lugar definitivo.

- Pepino:

En época de invierno se realiza en Mayo y Agosto. A un distanciamiento entre 110-150 cms entre surco, entre postura 30-50 cms, poniendo 3-4 semillas por postura.

INFORME DE POBLACION.

SAN JUAN OPICO.

	<u>TOTAL</u>	<u>HOMBRES</u>	<u>MUJERES</u>
	53,193	26,212	26,981
Cabecera	5,469	2,614	2,855
Resto	47,724	23,598	24,126

TAMAÑO DE LA FINCA.

HASTA 1 HA.	1-2 HAS.	2-5 HAS.	5-10 HAS.	10 HAS.
40	25	18	12	5

USO DEL CAPITAL.

CAPITAL	%	BFA	BANCO	CAJA DE CREDITO	COOPERATIVA	ONG	COYOTE
Propio	20						
Crédito formal.	20	8	7	5	-	-	-
Crédito Informal.	60				10	1	49
	<u>100</u>						

CAPITAL	%	FUENTES
Propio.	20	- Venta de animales. - Venta de cosecha anterior. - Dinero que ahorran por trabajos que realizan en corta de café, caña, etc.
Crédito formal.	20	- B.F.A., Banca, Cajas de crédito.
Crédito informal.	60	- Cooperativas, ONG's, Coyotes ó prestamistas.

AGRICULTORES ATENDIDOS Y POTENCIAL

<u>AGR. ATENDIDOS</u>	<u>RUBRO</u>	<u>%</u>	<u>AGRICOLA</u> Maíz, frijol sorgo.	<u>P O T E N C I A L</u>				
				<u>CAFE</u>	<u>CAÑA</u>	<u>RUBROS</u>		
						<u>CITRICOS</u>	<u>GANADO</u>	<u>OTROS</u>
1500	Maíz, frijol	12.66%	7,240 (70%)	620 (6%)	517 (5%)	517 (5%)	1,034 (10%)	413 (4%)
PORCENTAJE ATENDIDO: 12.66%				PORCENTAJE NO ATENDIDO : 87.34%				

AREA POTENCIAL Y REAL DE LA TIERRA.

<u>AREA POTENCIAL</u>	<u>AGRICOLA</u>	<u>PECUARIA</u>	<u>AREA REAL DE LA TIERRA.</u> <u>Bosques, Montañas y Otros</u>
18,863.34 (53%)	14,904.7	3,958.64	16,660.08 mz. (47%)

AREA PECUARIA.

<u>RUBRO PECUARIO</u>	<u>Nº</u>	<u>ACTIVIDAD</u>
- Bovino.	3,905	- Implementación de planes profilácticos.
- Aves.	32,720	- Implementación de planes profilácticos.
- Cerdos.	4,090	- Implementación de planes profilácticos.
- Equinos.	2,048	- Implementación de planes profilácticos.

PRODUCCION.


<u>AREA (M2)</u>	<u>RENDIMIENTO \bar{x}</u>	<u>PRODUCCION TOTAL</u>	<u>PRODUCCION NACIONAL</u>	<u>% PRODUC. NACI</u>
(Frijol) 7276	14	101,864	1,346,700 qq	
(Sorgo) 1292	15	19,380	4,655,500 qq	
(Café) 2500	12	30,000	3,502,700 qq	
(Maíz) 9096	40	363,840	15,338,800 qq	
(Tomate) 5	135	675	387,000 qq	
(Pepino) 10	130	1,300		
(Naranja) 1000	250 Unid./árbol			

RESULTADOS 94.M A I Z.

<u>RANGO (qq)</u>	<u>% AGRICULTORES</u>	<u>Nº AGRICULTORES</u>	<u>PROMEDIO BENEFICIO COSIO.</u>
30-40	8.1	9	1.35
40.1-50	9.9	11	1.09
50.1-60	38.7	43	1.24
60.1-70	43.2	48	1.34
TOTAL	100	111	
			PRODUCCION PROMEDIO \bar{x} 57.5

F R I J O L.

5-10	7.20	8	0.37
11.1-15	15.31	17	0.63
15.1-20	51.35	57	0.5
20.1-25	18.9	21	0.86
25.1-30	3.6	4	1.10
30.1-35	2.7	3	1.57
35.1-40	0.9	1	2.02
TOTAL	100	111	
			PRODUCCION PROMEDIO \bar{x} 18.18



II. DIAGNOSTICO

...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...


...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

 **DIAGNOSTICO**
SAN PEDRO M.



4- Reunión grupal

Se logró convocar a una reunión en la comunidad, donde se plantearon los problemas según prioridad, desde el punto de vista de hombres, mujeres, niños y dirigentes comunales.

Se logró la participación activa de personeros de la alcaldía de San Juan Opico, representantes de la Policía Nacional Civil, la promotora de salud y los directivos de la asociación comunal.

V. RESULTADOS

1. Descripción física ✓

1.1. Suelos: Están comprendidos entre los grandes grupos, regosol, regosol aluvial, latosol arcillo rojizo y litosales, que según la clasificación de uso de suelo se presentan en las clases: I, III y IV.

La configuración de la superficie de los suelos es variada, encontrándose terrenos fuertemente diseccionados de cerros y montañas. Las pendientes oscilan entre 30 y 80% y en las planicies; menores al 10%, los suelos presentan una alta degradación, debido principalmente al mal manejo y falta de obras físicas de conservación lo que limita su producción y productividad.

1.2. Hidrografía ✓

Los más importantes del área son el río Sucio y el río Palio, que forman el sistema pluvial, Palio junto a pequeños manantiales y quebradas que tienden a secarse en época de estiaje. La mayoría de las quebradas se originan en la parte más elevada que se localiza al este de la cuenca. Se cuenta con dos pozos artesanales.

1.3. Clima

El régimen de lluvias es de tipo monzónico (6 meses de lluvia y 6 meses de período seco), el promedio de precipitación es de aproximadamente 800 a 1200 mm. La temperatura oscila de 21 a 27°C y un promedio anual de 23,8°C, la humedad relativa es de 68-85% y la radiación solar promedio anual es de ocho horas por día, aumentando a 9 en los meses de diciembre, enero y febrero. La zona de vida es de bosques húmedos subtropicales y la altitud oscila entre 300 y 1000 metros sobre el nivel del mar, con un promedio de 600 msnm.

Se presentan canículas que afectan grandemente la producción de granos básicos.

1.4. Topografía

Es bastante accidentada, con irregularidades. Los cultivos se establecen en las laderas de las colinas predominantes. No existen sistemas de montañas, únicamente colinas cubiertas con gramales.

2. Descripción social y económica

Las vías de acceso son caminos empedrados (terracería) y de tierra, algunos han sido recientemente establecidos para evitar las dificultades de transporte durante el invierno, presentan mal estado.

Las viviendas presentan un buen aspecto, algunas han sido abandonadas y otras están en construcción. Según información proporcionada por el Centro de Salud, existen 81 viviendas; de las cuales 64 (79%) tienen piso de tierra, 20 (26%) no disponen de letrina y 32 (40%) tienen la fuente de agua a más de 300 metros. Además, el 30 (36%) disponen de fuente de agua no potable (río manantial); y un 64% no aplica tratamiento a la basura. Los principales tratamientos a la basura son la quema en época seca y enterrarlas en la época lluviosa. Se han construido estufas "loreña", a través del FIS. Son viviendas con tejas y con paredes de ladrillos, adobe y bahareque. Tienen la cocina normalmente separada del resto de la vivienda. En algunos casos disponen de granero o silos de almacenamiento contiguo a la vivienda.

2.2. Crédito

Es disponible para los sistemas de producción tradicionales, a través del Banco de Fomento Agropecuario. Expresaron que los montos asignados son insuficientes para solventar los gastos involucrados con esas actividades.

2.3. Salud

Tienen una promotora de salud dentro de la comunidad; mediante la coordinación con los residentes, realizan campañas de vacunación y educación en aspectos nutricionales. Muchos de los servicios se ofrecen a través de un Comité de Salud.

Los principales problemas de salud son:

1. Infecciones respiratorias agudas
2. Infecciones gastrointestinales
3. Tricomoniasis urogenital
4. Desnutrición
5. Candidiasis de bulba y vagina

Según información de la promotora de salud, se elaboró un mapa de la comunidad en las que se colorea las viviendas según factores de riesgo presentes, estos factores son:

- Mujeres en edad fértil
- Presencia de niños
- Agua (calidad y accesibilidad)
- Ausencia de letrinas

Para la categorización de las viviendas según factores de riesgos presentes, se definieron colores (similares al semáforo) rojo, indica la presencia de tres de los cuatro factores (alto riesgo); amarillo, presencia de dos factores (riesgo moderado); verde, presencia de un factor (poco riesgo), y las que no tienen color indica la ausencia de los factores de riesgo.

2.4. Demografía ✓

Según datos proporcionados por la Unidad de Salud de Opico, la distribución de la población según las edades es:

Distribución de edades según censo del Centro de Salud

Edad (años)	1	1-4	5-14	15
Población	21	58	119	339

2.5. Entorno familiar ✓

En lo que se refiere un poco a análisis de género; se observó y constató que en el núcleo familiar aproximadamente constan de un promedio de 6 a 7 miembros. Tradicionalmente las mujeres y los niños, recogen leña, acarrean agua, y para lavar, tienen que caminar hasta el río Palío a una distancia de 8 km. Aquí podemos notar que las mujeres y los niños(as) sufren a diario por los efectos del deterioro del medio ambiente.

2.6. Educación

Se dispone de una escuela que ofrece desde el primero hasta el sexto grado. Su población actual es de 129 alumnos y cuatro profesores.

2.7. Asistencia técnica

Es principalmente ofrecida por la oficina del MAG/CENTA en Opico, está dirigido básicamente a la producción de granos básicos (maíz, sorgo, frijol), y últimamente en aspectos forestales. Los técnicos visitan la comunidad mediante la organización de círculos vecinales (unión de 8 a 10 agricultores) agrupados según proximidad de sus parcelas).

Han tenido asistencia puntual de la Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASAI), el Fondo de Inversión Social (FIS), e lo que respecta a construcción de estufas "lorena"; Plan Sabar para el proyecto de agua, la Alcaldía para el empedrado de las calles, el Ministerio de Educación en la construcción de la escuela. Tienen una promotora de salud a nivel local, apoyada directamente por el Ministerio.

2.8. Comercialización

Generalmente los excedentes se venden tanto en la comunidad como en Opico. La mayoría de la producción es para autoconsumo cuando existen ventas locales la realizan al "coyote" intermediarios, últimamente por el mal estado de los caminos solo aceptan productos puestos en Opico.

Actualmente la producción de sorgo es dedicada para la satisfacción de alimentación de sus animales domésticos (aves y cerdos, principalmente). El poco excedente lo venden en la comunidad o en San Juan Opico.

Requerimientos mínimos de producción ✓

Tomando en consideración que la mayoría de la producción es para autoconsumo y que el tamaño promedio de la familia es de 7 miembros, la cantidad mínima de frijol necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas anuales es de 30 qq, en el caso de maíz, 20 qq; respecto a maicillo (sorgo), la cantidad es de 22 qq; en arroz representa unos 3,0 qq por familia.

Para satisfacer los requerimientos de producto se necesita una parcela de 1,0 a 1,5 manzanas, tomando en consideración los rendimientos de la zona.

3. Sistemas de producción

3.1. Area agrícola

a- Sistema maíz-sorgo en relevo

Manejo del Sistema

El maíz se siembra en los primeros quince días del mes de mayo y el sorgo se siembra en tres modalidades, la primera es que el sorgo criollo lo siembran a 25-35 días después del maíz; la segunda modalidad es sembrar el sorgo criollo inmediatamente después que el maíz ha completado la polinización y ya no tira polen; la tercera modalidad es que los sorgos introducidos (mejorados), son sembrados inmediatamente después de la dobla del maíz (agosto).

- La siembra es con uso del chuco o espeque, ningún caso con bueyes. Control de malezas para siembra es manual con uso del machete y aplicación de herbicidas químicos (Gramoxone/Gesaprim).

- Distanciamiento de siembra: maíz y sorgo (1 metro entre surcos y 0.40 m entre posturas)

- Densidad de siembra: 2 plantas/postura, de maíz (50,000 pl/ha).

4 plantas/postura de sorgo (100,000 pl/ha)

- Existe ataque de plagas del suelo que reducen la población final de plantas en un 10 a 15%

- Plagas: Se presentan plagas del follaje, que son controladas con productos químicos y están iniciando a probar productos botánicos (malezas de cebollas, tabaco, chile, ajo) en mezcla con Tamarón.

- La fertilización es inadecuada en épocas de aplicación: la primera aplicación al maíz es de 15 a 18 días d.d.s., la segunda es a los 35 días y una 3a a los 45 d.d.s., mezclando sulfato de amonio con fórmula 16-20-0.

- La cosecha de maíz, se colecta en noviembre, utilizando máquina para destuce y desgrane (costo \$6.00 saco de 220 libras en grano), el sorgo se colecta en enero y se aporrea manualmente o pagan máquina (\$6.00/saco de 220 libras).

- El grano de maíz y sorgo para consumo, se almacena en pequeños graneros, pero la mayoría lo almacena en sacos.

- El grano obtenido mayormente es para consumo, y comercialización pocos excedentes. El rendimiento de maíz criollo es de 25 qq/mz, y para el híbrido H-5 ó mejorado, es de 40-45 qq/mz y con el sorgo se obtienen 20 a 30 qq/mz.

b) Sistema maíz-frijol en relevo

-El maíz se maneja como se explicó en el sistema maíz-sorgo.

-El frijol es sembrado después de la dobla del maíz (agosto)

-No se pudo observar a nivel de campo, ya se había cosechado,

pero los agricultores manifestaron que tienen fuertes

problemas de plagas y enfermedades, con la variedad criolla

(rojo de seda), en la actualidad se ha difundido la variedad CENTA-CUZCATLECO, la cual ha representado una excelente alternativa de producción de frijol, resultando tolerante a enfermedades y a sequía, además lo aceptan muy bien para su consumo.

El rendimiento del CENTA-CUZCATLECO es de 14 a 18 qq por manzana. Si presenta problemas para comercialización, los intermediarios quieren pagarlo a bajo precio, actualmente el precio de frijol en la zona es de ¢ 180.00 a ¢ 200.00 qq.

Arroz

- Se observaron pequeñas parcelas de arroz sembrado en sistemas agroforestales y con hortalizas (tomate y jícama)

- La siembra es con espeque, utilizan variedades locales de bajo rendimiento (2.5 sacos/tarea; 40 qq/mz en granza) manifiestan problemas de manejo, pero existe interés por cultivar arroz y obtener mejores rendimientos en pequeñas parcelas, especialmente para producir para autoconsumo del año.

Frutales

- Se observa un potencial muy bueno por la adaptación de diferentes frutales: naranjo, musáceas, papayas, mango y coque principalmente, los cuales están sembrados en pequeñas áreas en las parcelas o alrededores del hogar. Estos cultivos necesitan asistencia técnica y aprovechan el potencial observado, actualmente no se les aplica ningún manejo y requieren prácticas de conservación de suelos y humedad. Se puede visualizar que estos cultivos pueden ser parte importante de la dieta alimenticia y para generar ingresos por la venta de diversos frutos.

Componente café

- El cultivo del café no está incorporado en la mayoría de las fincas de la comunidad. No obstante, se encontraron pequeñas áreas, las cuales están sometidas al sistema de manejo tradicional, es decir sin la aplicación de un paquete tecnológico actual.

Las parcelas fueron establecidas en bosque natural, donde se eliminaron los estratos inferiores y solo se dejaron remanentes los árboles mayores para que sirvieran de sombra al café. Debido a eso la sombra es excesiva y no se le da manejo o regulación. La fertilización del café es mínima y en algunos casos no se practica por lo que el rendimiento en producción es muy bajo.

En cuanto a las variedades, los cafetales viejos son de híbridos (bourbon) plantados en otras épocas y las áreas de siembra más recientes son de variedades nuevas como: catua.

En general aunque el cultivo del café genera en las comunidades fuente de mano de obra e ingresos, familias en este caso el aporte económico que representa no es muy significativo debido principalmente a la poca cantidad de área cultivada y a la baja productividad.

DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO
 COMUNIDAD SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO SAN JUAN OPICO
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR

PROBLEMA 2

PROBLEMA	CAUSA	ALTERNATIVAS DE SOLUCION	RECURSOS LOCALES DISPONIBLES	INSTITUCIONES RESPONSABLES
Deseempleo	<ul style="list-style-type: none"> -Trabajo estacional -Falta de recursos económicos -Vagancia -Falta preparación -Desintegración familiar -Vicios: bebidas alcohólicas 	<ul style="list-style-type: none"> -Abrir fuentes de ingresos -Obtención de créditos preferenciales -Capacitación vocacional 	<ul style="list-style-type: none"> - Organización comunal - Casas para poder iniciar proyecto vocacional 	FEPADE, DFA, ASAI FIS Alcaldía Casa de la Cultura PNC
Deforestación	<ul style="list-style-type: none"> - Tala de árboles - Falta de siembra - Cuido de árboles - Superpoblación - Urbanización - Falta de madera p/construcción - Mal aprovechamiento de la tierra - Incendios - Falta de leña - Pobreza (venta de leña) 	<ul style="list-style-type: none"> -Educación forestal -Siembra de árboles -Protección de árboles -Aplicar ley forestal -Sistemas de protección forestal -Establecer viveros forestales y frutales -Cuidar árboles -Concientización forestal -Prácticas de injertos 	<ul style="list-style-type: none"> - Existen parcelas demostrativas - Organización Comunitaria - Especies locales - Tierra disponible - Asistencia técnica 	CENTA MADELEGA Alcaldía PNC Comunidad

DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO
 COMUNIDAD SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO SAN JUAN OPICO
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR

PROBLEMA 1

PROBLEMA	CAUSA	ALTERNATIVAS DE SOLUCION	RECURSOS LOCALES DISPONIBLES	INSTITUCIONES RESPONSABLES
Educación	<ul style="list-style-type: none"> - No existen programas de alfabetización de adultos - Falta de maestro - Falta de conciencia de la comunidad - Disponibilidad económica - Falta de responsabilidad del padre de familia 	<ul style="list-style-type: none"> -Solicitud de maestros -Responsabilidad mutua maestro y comunidad -Conciencia de los profesores -Organización comunidad y maestro -Permanencia del maestro en la comunidad -Ampliación de aulas 	<ul style="list-style-type: none"> -Edificio escolar -Instalación eléctrica -Apoyo de la comunidad -Presencia de maestro a nivel infantil -Mobiliario existente 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Educación - FIS - EBUCO - Municipalidad - ASAI - PNC

DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO
COMUNIDAD SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO SAN JUAN OPICO
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR

PROBLEMA 1

PROBLEMA	CAUSA	ALTERNATIVAS DE SOLUCION	RECURSOS LOCALES DISPONIBLES	INSTITUCIONES RESPONSABLES
El agua	<ul style="list-style-type: none"> -Deforestación -Aumento poblacional -Fallas en equipo de bombeo y cañería -Escasez natural 	<ul style="list-style-type: none"> - Reforestación de cuencas donde están ubicados los nacientes -Revisión de cañerías fuente -Pozos profundos 	<ul style="list-style-type: none"> - Extensión Forestal - Mano de obra - Apoyo económico Municipalidad - Apoyo PNC - Proy.Múltiple S. Juan Opico 	<ul style="list-style-type: none"> - MADELEGA - Municipalidad - PNC - Coonunidad - CENTA - PLAN SARAR - SEMA
Caminos	<ul style="list-style-type: none"> -Falta manteni-miento -Falta recursos económicos -Falta organiza-ción comunal 	<ul style="list-style-type: none"> - Organización para coordinar y solicitar ayuda institucional - Grupo de trabajo comunal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mano de obra comunal - Recursos económicos q 20,000 - Apoyo municipal - Herramientas 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad - Municipalidad S.Juan Opico - CIFA - Municipalidad de San Nalias
Inseguridad Social	<ul style="list-style-type: none"> -Desempleo -Aumento delin-cuencial -Drogas -Desintegración familiar -Poco personal PNC 	<ul style="list-style-type: none"> -Coordinación PNC -Organización para un buen patrullaje -Presencia de la PNC en la comu-nidad 	<ul style="list-style-type: none"> -Apoyo a PNC S.Juna Opico -Apoyo municipalidad S.Juan Opico -Organización comunal 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidad - PNC - Alcaldía
Salud	<ul style="list-style-type: none"> -No existe Unidad de Salud -Escasez y con-taminación del agua -Falta personal de apoyo -Desnutrición -Contaminación Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> -Construcción de local -Personal apoyo -Capacitación p/ prevenir y con-trolar enfermeda-des -Mejorar nutrición -Concientización -Responsabilidad familiar -Oblención de medi-cinas -Colaboradores voluntarios 	<ul style="list-style-type: none"> -Promotora de salud sin equipo de tra-bajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Salud - Sistema integral de salud - CENTA, Municipali-dad - PNC - Ministerio Educa-ción

ANEXO

Guía de preguntas a miembros de la comunidad

1- Qué cultiva en su finca?

Cómo lo hace?

-Formas de siembra (sistemas de producción)

Cuándo?

-Épocas de siembra (mayo, agosto, otros

meses)

Cuánto?

-Áreas de siembra (manzanas, tareas)

2- Siembra árboles forestales?

(De acuerdo a guía pregunta 1)

. Existen bosques naturales?

. Especies (nombres de los árboles)

3- Hace prácticas de conservación de suelos?

. Sobre las quemas de residuos de cosechas, qué piensa?

. Hace algunas obras para detener la erosión en su parcela?

4- Cuáles problemas considera de mayor importancia en los cultivos que siembra?

5- Existe alguna organización en la comunidad?

. Describir organización existente

6- Podría contarme sobre la vida silvestre?

7- Existen problemas de contaminación?

. Aguas, humo, otros

8- Cómo es la comercialización de los productos que cosechan?

9- Obtienen crédito para el trabajo agrícola?

10- Cómo está la situación de tenencia de tierra?

11- Los ingresos familiares, de dónde se obtienen?

12- De dónde obtienen los productos de consumo familiar?

- 13- Sobre la escuela, puede comentarme algo?
- 14- Cuál es la condición de salud en la comunidad?
- 15- Infraestructura: Observación directa en recorrido por la comunidad
- 16- Cómo almacena los productos que cosecha?
- 17- Tiene facilidades para obtener insumos?
- 18- Condición de la vivienda: observación directa en recorrido
- 19- Participan las mujeres en el trabajo agrícola?
- 20- Qué actividades realizan las mujeres y los niños?
- 21- Cómo se utiliza la mano de obra que existe en la comunidad?

NOTA: Se tomaron datos por observación directa, mediante el reconocimiento y visitas a la comunidad.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES:

1. Después de concluir el diagnóstico participativo en la comunidad de San Pedro Mártir, sus pobladores definieron como sus principales problemas los siguientes:

- 1.1. Falta de agua
- 1.2. Mal estado de la vía de acceso
- 1.3. Delincuencia
- 1.4. Salud
- 1.5. Educación
- 2.1. Desempleo
- 2.2. No hay energía eléctrica
- 2.3. Falta de leña
- 2.4. Deforestación
- 2.5. Desnutrición
- 3.1. Falta de lugares de recreación
- 3.2. Mala distribución de la tierra
- 3.3. Planificación familiar
- 3.4. Transporte
- 3.5. Falta de crédito.

2. Existe bastante conciencia de los miembros de la comunidad de sus problemática y de la necesidad de organizarse para buscar soluciones.

3. La comunidad cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales para ayudar a la solución de sus problemas:
(Alcaldía, PNC, CENTA y otros)

4. Para lograr sus objetivos de desarrollo, debe darse seguimiento a la planificación surgida del diagnóstico.

5. Las instituciones responsables son fundamentadas en los logros que se puedan alcanzar.

6. El diagnóstico participativo brinda una panorámica integral de los problemas de una comunidad y representa una excelente herramienta para activar a los habitantes en la solución.

DIAGNOSTICO DEL CANTON SAN PEDRO MARTIR.

Canton	Población Rural	Area	Población atendida familias	M Z															
				Area atendi.		MAIZ		FRIJOL		SORGO		CITRICOS		CAFE		CAÑA		HORTALIZAS	
				A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P
San Pedro Martir	516 product.	3,925 m ² .	420 personas.	265.5	627.0	265.5	502.0	260.0	25.0	260.0	50.0	1	18.0	1	7.0	1	1	2	1
San Pedro	703 Prod.	1050 m ²	570 personas	237.0	513.0	237.0	70.0	230.0	30.0	237.0	60.0	1	15.0	1	5.0	1	1	0.5	1

A = atendido
P = Potencial

EXTENSION DIRIGIDA A OBJETIVOS

4. INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

Hoja No. 1 de 2 de 1992 Agencia Oico Departamento La Libertad Municipio San Juan Oico Cantón Montuoso
 Zona 2 de 1992 Unidad Manzanas

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES					BOVINOS				C			
		Prop	Arren	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	ESPECIES MENORES					
1	Margarito Corbello Valencia		✓	Maíz	Frijol	Maicillo						1	2	3	4	PE
2	Cristóbal de Jesús Estamez		✓	Maíz	Frijol	maicillo										
3	Adrian Orrego Escobar															
4	Feliciano Oliver	✓		Maíz	frijol	maicillo	maicillo									
5	José Valentín Acosta	✓		maíz	frijol	maicillo										
6	Sebastián Romíez															
7	José Angel Polanco	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
8	Salvador Contreras	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
9	Leandro Urbino Valdizan	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
10	Manuel de Jesús Orellana	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
11	Leobal Ruano Girón	✓		maíz	maicillo											
12	Enrico de Varela	✓		maíz	frijol											
13	Enadís Contreras	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
14	Mario Cervantes Alca	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
15	Angel Guadalupe Contreras	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
16	Gregorio de Jesús Varela	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
17	Crisberto Orellana	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
18	Felipe Valdizan	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
19	Juan Tobias Escobar	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									
20	Ruben Antonio Gomez	✓		maíz	frijol	maicillo	maicillo									

FUNCIONARIO _____ FIRMA _____

INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

Hoja No. 2 de _____ de _____ de 1992
 Zona 2 Agencia Daico Departamento La Libertad Municipio San Juan Opico Cantón Chantúnene
 Fecha _____ de _____ de 1992 Unidad Manzanas _____

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES					BOVINOS			ESPECIES MENORES				C															
		Prop	Arrend	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	1	2	3	4																	
21	Rosa Oliver	✓		maíz	frijol																										
22	Lolita Castellon		✓	maíz	frijol																										
23	Uso Acosta		✓	maíz	frijol	maicillo																									
24	Julio Alfredo Carteras		✓	maíz	frijol	maicillo																									
25	Rigoberto Pinob		✓	maíz	frijol	maicillo																									
26	Cristóbal de J. Galbaner		✓	maíz	frijol	maicillo																									
27	Carlos Arévalo.-			maíz	frijol	Ortiz																									
28	Miguel Samuel Opola		✓	maíz	frijol	maicillo	Harshitas																								
29	Mano Servelo Alos		✓	maíz	frijol	maicillo																									
30				maíz	frijol	maicillo	Tamate																								
31	Mónica Eriderto ibreb.		✓	maíz	frijol	maicillo	Apalo																								
32	Medardo Herrera.-		✓	maíz	frijol	maicillo																									
33	Modesto Mayo.-		✓	maíz	maicillo																										
34	Agustín Acosta		✓	maíz	frijol	maicillo																									
35	Corzoro Ramirez		✓	maíz	frijol	maicillo																									
36				maíz	frijol	maicillo																									
37	Wilfredo Urbino Corbank		✓	maíz	frijol	maicillo																									
38	Julio Alvarado Quijano		✓	maíz	frijol	maicillo																									
39	Vicente Alfredo Opola		✓	maíz	frijol	maicillo																									
40	Joaquín Enríquez Guíjen		✓	maíz	maicillo																										

FUNCIÓNARIO _____ FIRMA _____

EXTENSION DIRIGIDA A OBJETIVOS

INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

Hoja No. 3 de

Zona 2 de

Agencia Opico

Departamento Libertad

Municipio San Juan Opico

Cantón Chantústene.

Fecha

de 1992

Unidad Manzanas

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES							BOVINOS			C				
		Prop	Arren	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	1	2	3		4			
41				maiz	frijol	maicillo												PE
42				maiz	frijol	maicillo												
43				maiz	frijol	maicillo												
44	Oscar Armando Gomez		✓	maiz	frijol	maicillo												✓
45	Mario Polanco			1	11	11												
46	Salvador Garcia			11	11	11												
47	Carlos Bonillas																	
48	Victor Samoso																	
49	Dionata Orellana																	
50	Roselio Rivers																	
51	Marcos Hercules																	
52	Raul Ramirez																	
53	Victor James																	
54																		
55	Alfonso Martini																	
56	Luís Gomez																	
57	José Yeldison																	
58	Roque Serrano																	
59	Gerardo Valdivia																	
60	Santos Molina																	

FIRMA

FUNCIONARIO

EXTENSION DIRIGIDA A OBJETIVOS
INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

Hoja No. _____ de _____ de _____ de _____
 Zona _____ de _____ de _____ de _____ de _____ de _____
 Agencia _____ de 1992 _____ de _____ de _____
 Fecha _____ de _____ de _____ de _____ de _____ de _____
 Municipio _____ Cantón _____

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES					BOVINOS			C				
		Prop	Arrend	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	1		2	3	4	
61	Reimundo Hercules	✓		maíz	frijol	maíz										
62	Teodoro Hercules	✓		"	"	"										
63	Narciso Enriquez	✓		"	"	"										
64	Oscar Mojica	✓		"	"	"										
65	Rogelio Rivera	✓		"	"	"										
66	David Enriquez	✓		"	"	"										
67	Ismael Coronado	✓		"	"	"										
68	Julian Melendez	✓		"	"	"										
69	Roberto Hercules	✓		"	"	"										
70	Carlos Baños	✓		"	"	"										
71	Teodoro Alberdo Castillo	✓		"	"	"										
72	Porfirio Duarte	✓		"	"	"										
73	Jose Efraim Ganos	✓		"	"	"										
74	Antonio Hercules	✓		"	"	"										
75	Adalberto Rodriguez	✓		"	"	"										
76	Roberto Coronado	✓		"	"	"										
77	ROSE SEMANO RODRIGUEZ	✓		maíz		maíz										

FUNCIONARIO _____ FIRMA _____

137 Agri. 01/19/92

EXTENSION DIRIGIDA A OBJETIVOS

INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

No. de _____ de _____ de _____
 Zona _____ de _____ de _____
 Fecha _____ de _____ de 1992
 Agencia _____ de _____ de _____
 Departamento _____ Municipio _____ Cantón _____

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES					BOVINOS		ESPECIES MENORES				C			
		Prop	Arrend	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	1	2	3	4		5		
1	Anulax Aquino Aulo		3/4	1 Tarca	1 Tarca	—	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Jesse Ontalva Gomez	2 M ²	—	1 M ²	1 M ²	2 M ²	—	2 Tarcos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	José Francisco Dominguez	1 M ²	—	—	—	2 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Francisco Dominguez	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	6 M ²	1/2 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Manuel Cubas de Castro	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	2 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	José Manuel Aguilar	2 M ²	—	1 M ²	1 M ²	6 Tarcos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Dña. Edwilda Flores	2 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	José Gabriel Carrero	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	José Miguel Vintaja	1 M ²	—	—	—	2 Tarcos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Erwin Martínez	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Carlos Guadalupe	1 M ²	—	—	—	2 Tarcos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Carlos Guadalupe Carrero	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Roberto Guadalupe	1 M ²	—	1/2 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Francisco Carrero	2 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Miguel José Guadalupe	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Silvestre Alberto Carrero	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	José Edwilda Carrero	1 M ²	—	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Guadalupe Rila Carrero	1 M ²	—	1 M ²	1 M ²	1 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Carlos Respaldo Jofre	1 M ²	—	1/2 M ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Francisco Guadalupe Carrero	1 M ²	—	1/2 M ²	1 Tarca	2 Tarca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FUNCIONARIO _____ FIRMA _____

INVENTARIO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SUS RUBROS DE PRODUCCION PRIORITARIAS

Hoja No. 1 de 1 de 1992 Agencia Agencia de 1992 Unidad Manzanas 1

Zona Agencia Departamento Agencia Municipio Agencia Cantón Agencia

Fecha 1 de 1 de 1992

O.	APELLIDOS Y NOMBRES	TENENCIA		RUBROS AGRICOLAS PRINCIPALES					BOVINOS			ESPECIES MENORES			C		
		Prop	Arrend	1	2	3	4	5	AREA	CABEZAS	APCC	2	3	4		PE	
	Pedro Antonio Nolasco		3 Tercos	3 Tercos	1 Tercos	3 Tercos											
	Edna Suarez		2 M ²	2 Tercos	2 Tercos	2 M ²								15	2		
	María Antonio Pichin		1/2 M ²	1/2 M ²	1/2 M ²	1/2 M ²								30			
	Luc Caseres		1 M ²	1 M ²	1 M ²	1 M ²											
	Carlos Chico		5 M ²	1 M ²	1 M ²	3 M ²								46			
	Alfonso Alvarado Silva		2 M ²	5 M ²	1 M ²	5 M ²								20	2		
	Carlota María Aguirre		1/2 M ²	1/2 M ²	2 Tercos	2 Tercos								12			
	Catolisa Zapata																
	Abelardo Ponce																
	Alfonso Aguirre		2 M ²	2 M ²	2 M ²	2 M ²								10			
	Alfonso Aguirre		1/2 M ²	1/2 M ²										5			
	Alfonso Aguirre		2 M ²	2 M ²	1 Tercos	3 M ²								20	1		
	Alfonso Aguirre		1/2 M ²	1/2 M ²	3 M ²	1/2 M ²								2			

FUNCIONARIO _____ FIRMA _____

**5. SECTOR No. 5
Y PRUEBA DE
RUTAS**

— I I C A —
CENTRO REFERENCIAL
BIBLIOTECA VENEZUELA

Sector No. 5
Compuesto por los Cantones :

- 1- Chantusnene
- 2- San Pedro Martir
- 3- San Pedro Oriente



- Chantusnene :
Ubicado al Nor Oeste de la Ciudad de
San Juan Opico.-

- San Pedro Martir :
Ubicado al Nor Oeste de la Ciudad de
San Juan Opico.-

- [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



CANTON
CHANTUSMENE


ANTONIO CHANTUSNEVE...

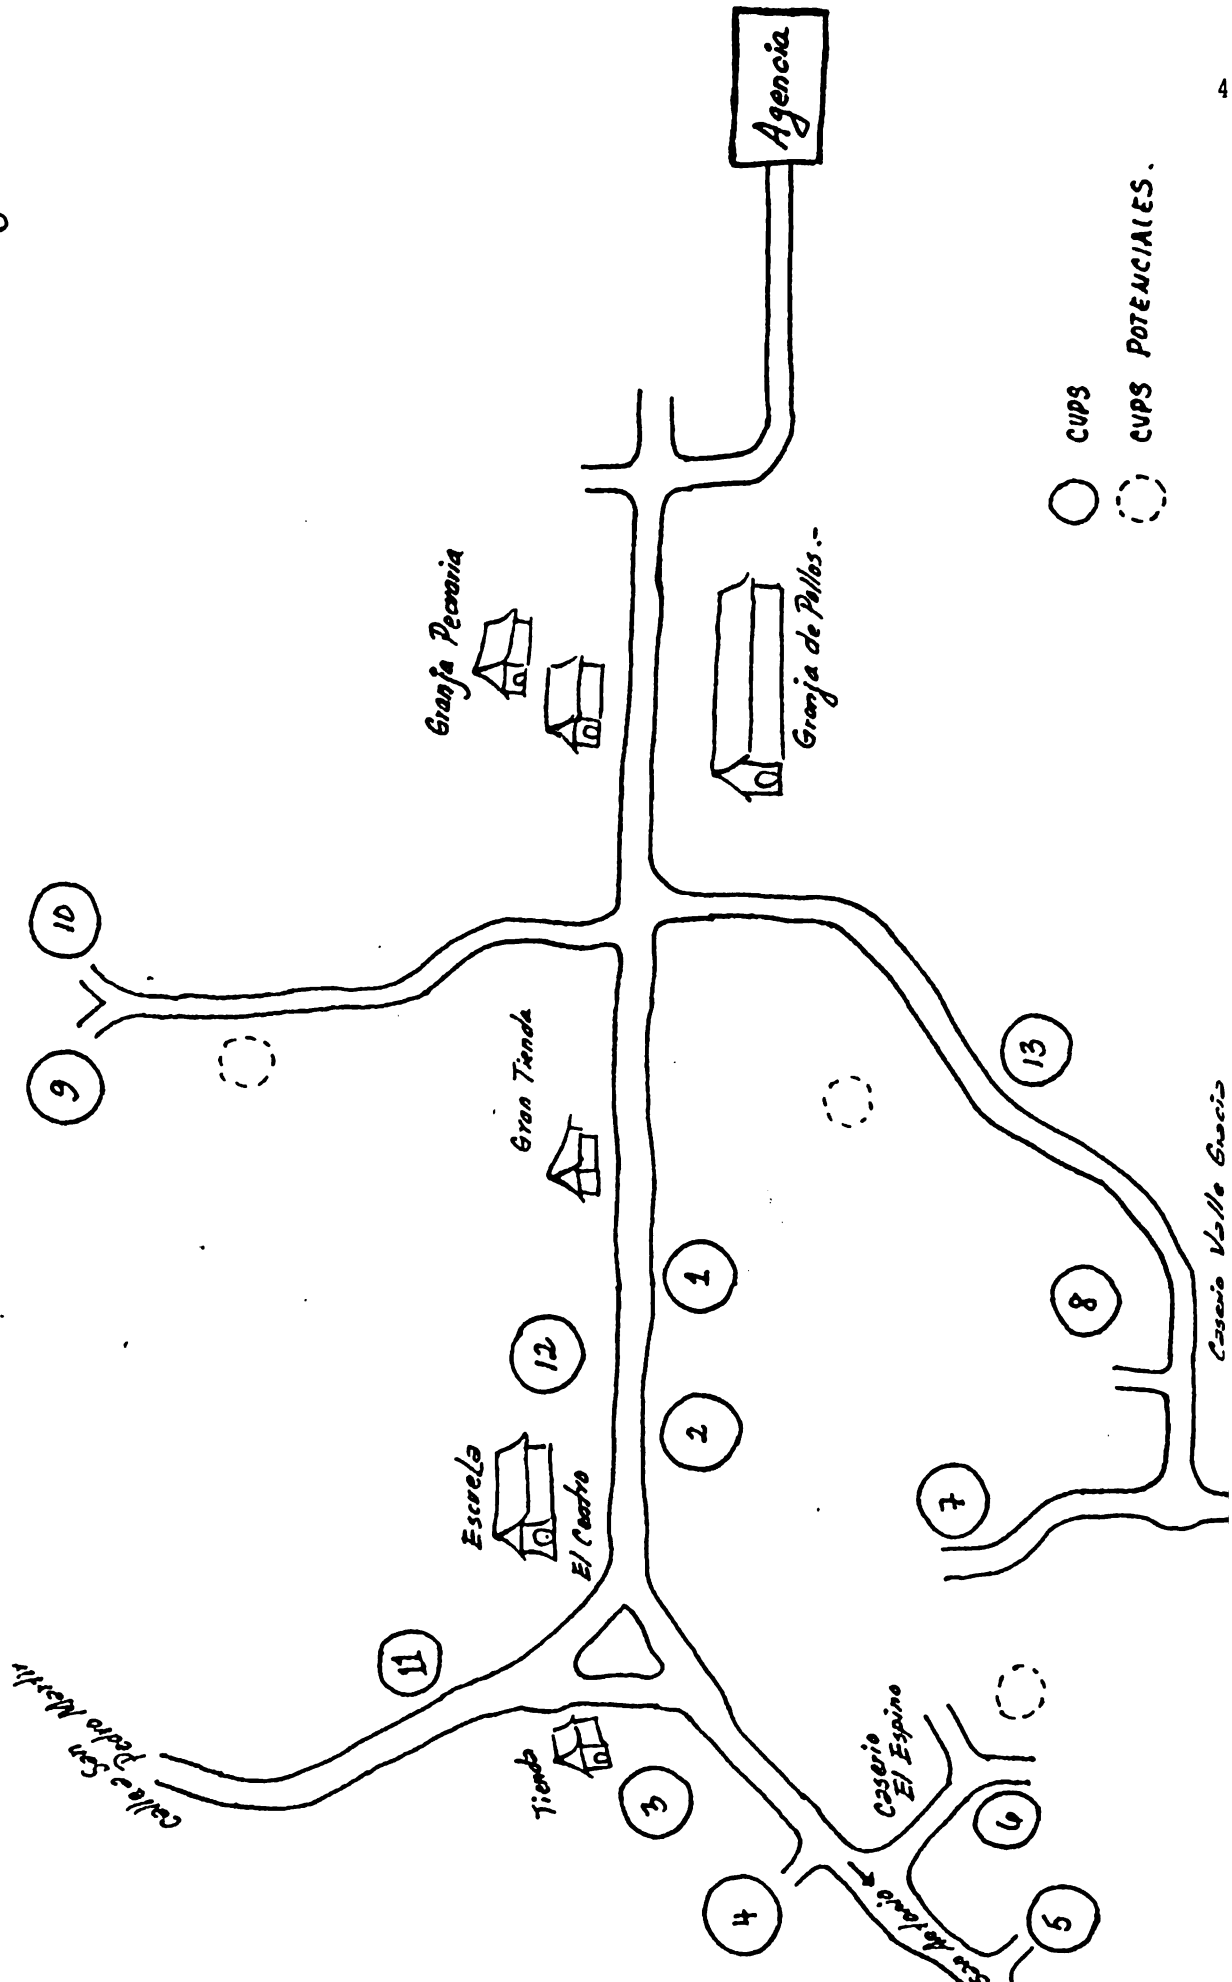

SAN PEDRO MARTIR

MAPA, CUPS POR RUTAS
CANTON SAN PEDRO MARTIR...
PRUEBA DE RUTA.

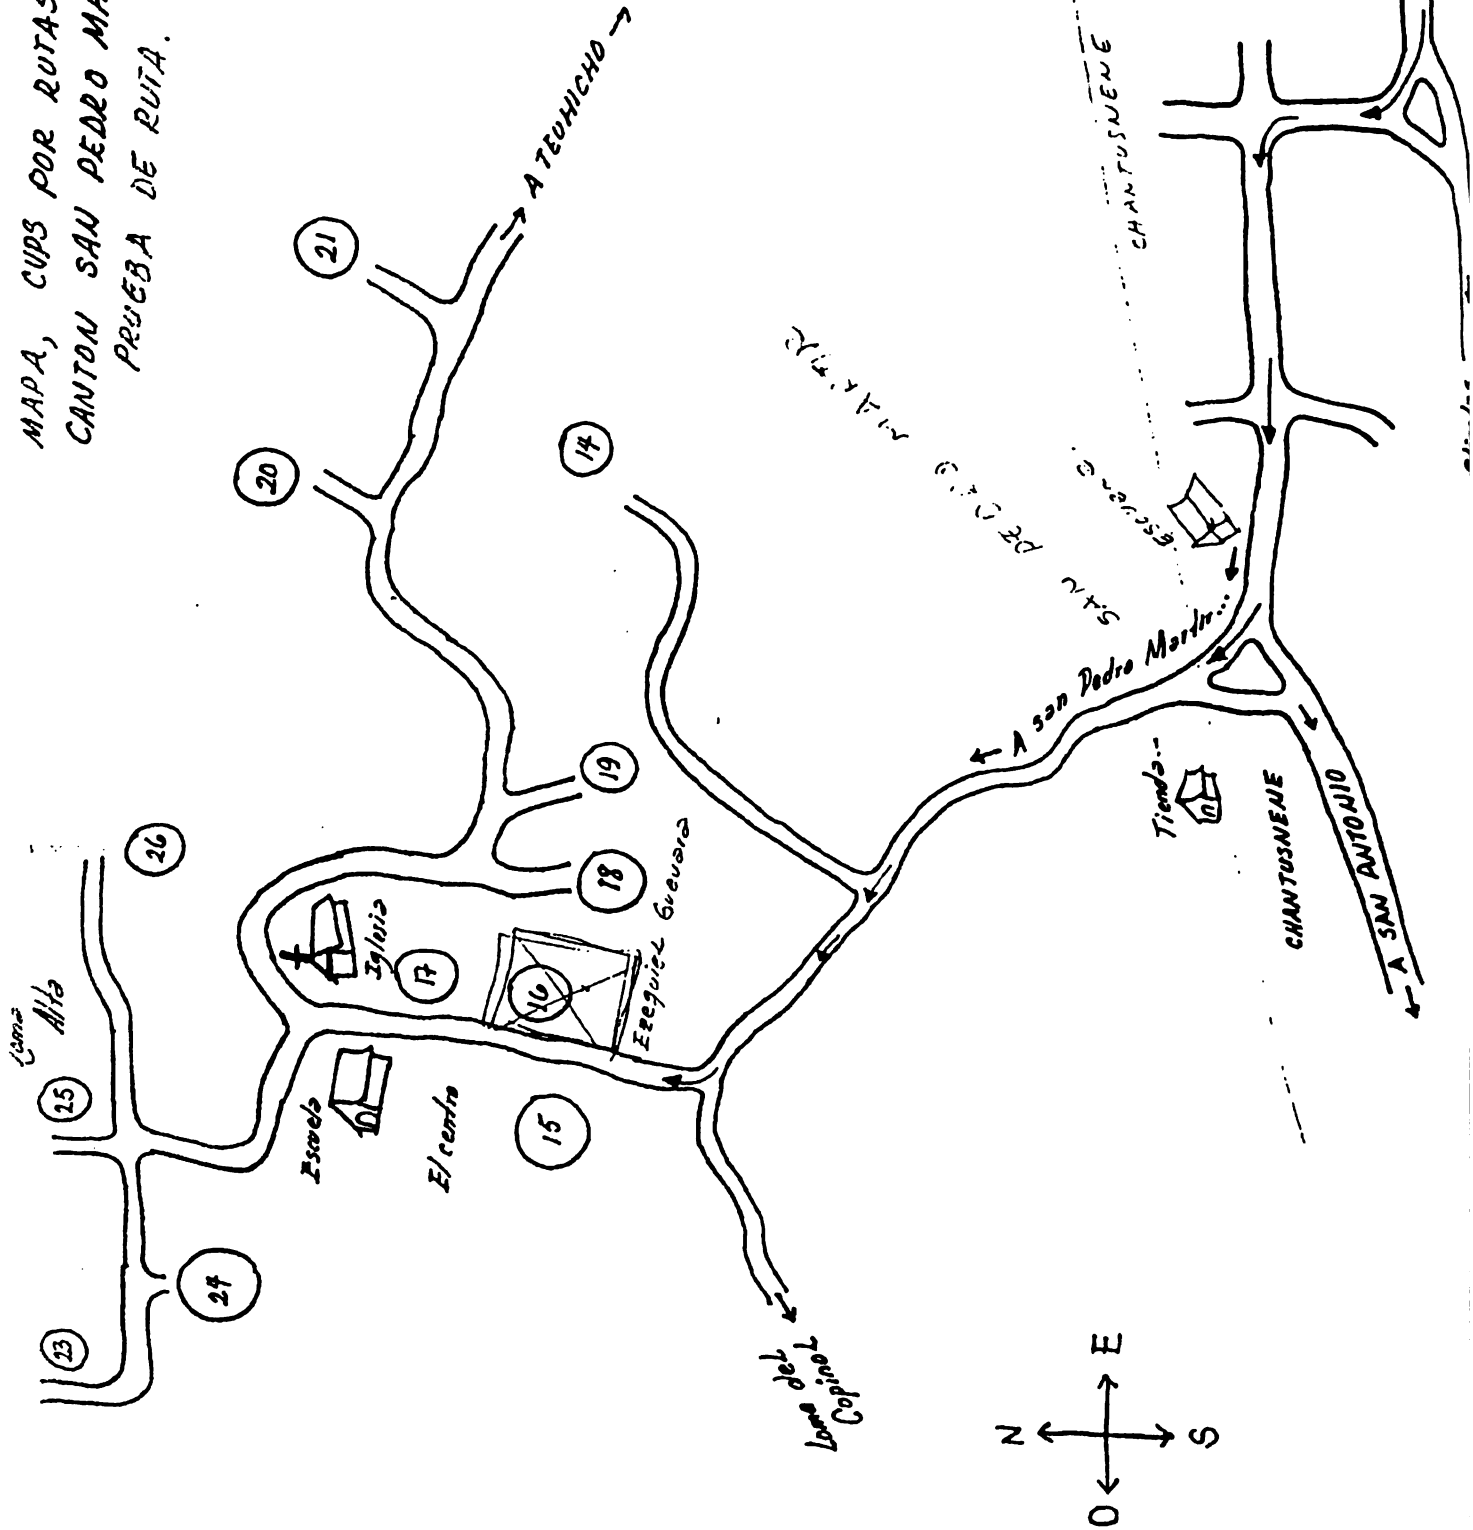

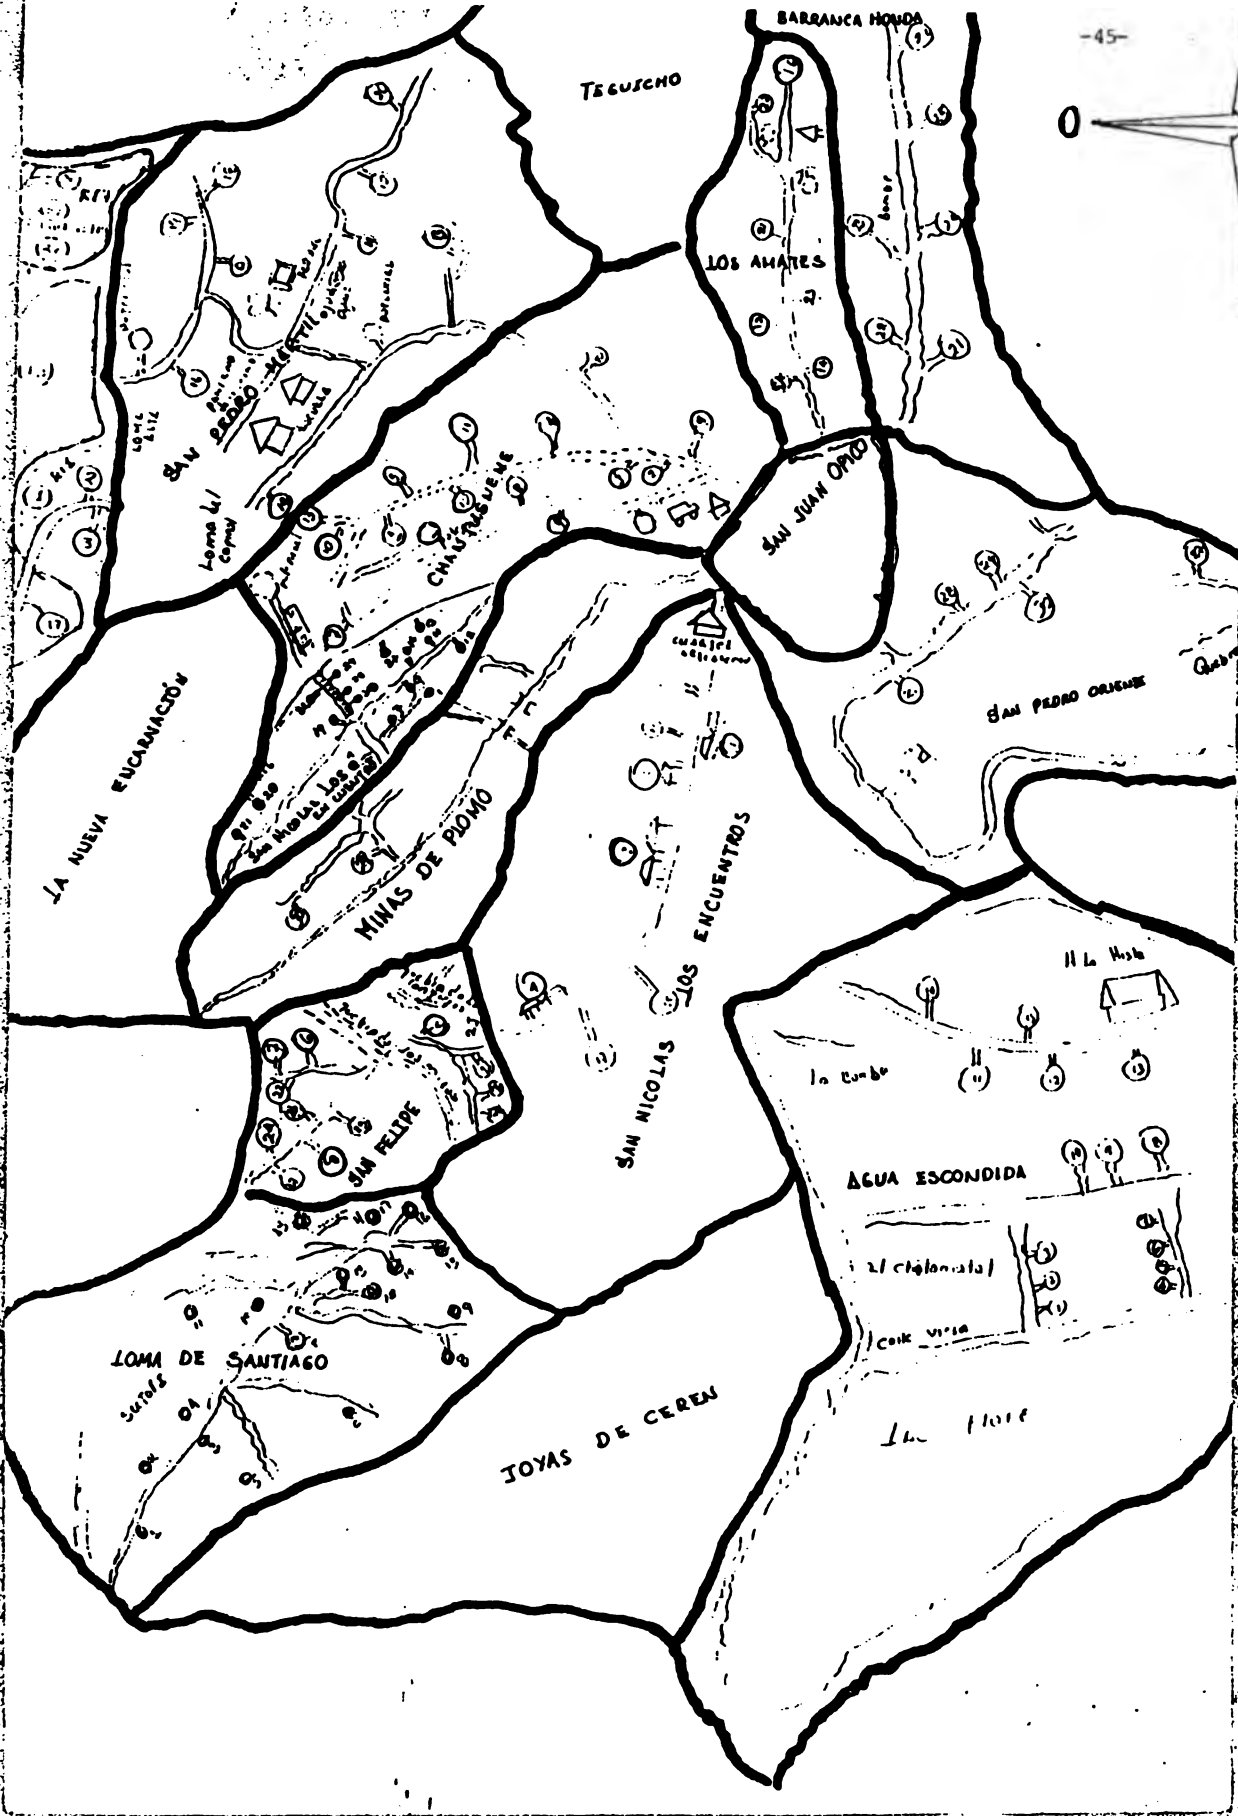

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL (CENTA)
AGENCIA DE EXTENSION AGROPECUARIA Y FORESTAL
SAN JUAN OPTICO.**

6. LISTADO DE CIRCULOS VECINALES POR SECTOR.

SECTOR	:	5
CANTONES ATENDIDOS	:	CHAVIUSENE Y SAN PEDRO MARTIR.
TECNICO	:	JOSE RONALD CROZO MONTEJO.
Nº DE CIRCULOS VECINALES	:	24
Nº DE RUIAS	:	8
Nº DE PRODUCCIONES ATENDIDAS	:	240

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO. _____

DT: San Andrés. ZONA: GYTT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 1 MUNICIPIO: San Juan Opico.

ANTON: Chantusene.

PRODUCTOR ENLACE.

Isabel Reina Girón.

LUGAR DE REUNION

Parcela del Productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- Gladis Contreras.
- Carmen Galdémez.
- Berta Varela.
- Servelia Alas.
- Hortencia.
- Antonia Vides.
- María Magdalena.
- Julia Galdémez.

PRODUCTOR ENLACE

Angel Guadalupe Contreras.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Raúl Gómez.
- 2- Concepción Valdizón.
- 3- Manuel Clavel.
- 4- Hugo de Jesús Alvarado.
- 5- Mario E. Varela.
- 6- Heriberto Orellana.
- 7- Alfredo Amaya.
- 8- Concepción Alvarado Ayala.

PRODUCTOR ENLACE

Santos Marcelo.

LUGAR DE REUNION

Parcela del Productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- Nestalf Lobos.
- Justo Lobos.
- Daniel Lobos.
- Carlos Quijada.
- Carlos Flores.
- Julio Lobos.

PRODUCTOR ENLACE

EXTENSIONISTA: JOSE RONALD CROZCO MONTEJO.-----

CDI: San Andrés. **ZONA:** GYT # 2 **AGENCIA:** San Juan Opico. **SECTOR:** 5 **RUTA:** 2 **CANTON:** Chantusene.

PRODUCTOR ENLACE

Mario Polanco.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Félix Valdizón.
- 2- José Dimas.
- 3- Anastacio Sorto.
- 4- Roque Serrano.
- 5- José Inocencio.
- 6- Juan de la Cruz Caffénguez.
- 7- José Sorto.

PRODUCTOR ENLACE

José Angel Polanco.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Joaquín Hernández.
- 2- Sebastián Ramírez.
- 3- José Valdizón Acosta.
- 4- Manuel de Jesús Orellana.
- 5- Adrián Escalante.
- 6- Julio Urbina.
- 7- Joaquín Ramírez.

PRODUCTOR ENLACE

Lito Flores.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- José I. Cricas.
- 2- Ernesto Polanco.
- 3- Julian Orellana.
- 4- Alfredo Contreras.
- 5- José L. Gómez.
- 6- José A. Ortega.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO

COT: San Andrés. ZONA: GYTT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 CANTON: Chantusnene. RUTA: 3

PRODUCTOR ENLACE

Salvador Contreras.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Florencio Hércules.
- 2- José Sefil Urbina.
- 3- Julian E. Sánchez.
- 4- Víctor Manuel Peraza.
- 5- Pedro de Jesús Sánchez.
- 6- Víctor Hércules.
- 7- Mario Urías.

PRODUCTOR ENLACE.

José Francisco Valdizón.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 2- Víctor Zomoza.
- 2- Wilfredo Caravantes.
- 3- Julio Quijano.
- 4- Carlos Polanco.
- 5- Tomás Sorto.
- 6- Julio Contreras.
- 7- Ernesto Zomoza.

PRODUCTOR ENLACE

Adrian Ortega.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Margarito Carballo.
- 2- Modesto Mejía.
- 3- Feliciano Olivar.
- 4- Agustín Acosta.
- 5- Lázaro Ramírez.
- 6- Cristóbal J. Galdémez. (Hijo)
- 7- Cristóbal J. Galdémez (Padre).

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD CROZCO MONTEJO.-----

CDU: San Andrés. ZONA: GYT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 4 CANTON: Chantuesne.

PRODUCTOR ENLACE

Marco Tulio Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Alfonso Quijano.
- 2- Alonso Franco.
- 3- Julio Cerna.
- 4- Mario Hernández.
- 5- Julián Hércules.
- 6- Jesús Galdames.
- 7- Mario Galdames.

PRODUCTOR ENLACE

Santos Hércules.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Eliseo Antonio Rodríguez.
- 2- José Guviera Ardón.
- 3- Joaquín Enrique Guillén.
- 4- Ismael Corado.
- 5- Carlos Misael Hércules.
- 6- Narciso Henriquez.
- 7-

PRODUCTOR ENLACE

Juan Flores.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Marcos Fuentes (Padre).
- 2- Juan G Francisco G.
- 3- Marcos Fuentes (hijo)
- 4- Marvin Valdizón.
- 5- Jorge Urbina.
- 6- Rigoberto Hércules.
- 7- Luis Valdizón.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

COT: San Andrés. ZONA: GYT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 5 CANTON: San Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE

Isidro Ramírez.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Joaquín Santana Grillén.
- 2- Antonio V.
- 3- Francisco Amando G.
- 4- Agustín Escalante.
- 5- Juan Urbina.
- 6- David Juárez.
- 7- Mario Juárez.

PRODUCTOR ENLACE.

Mario Urbina Oema.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Alcides Antonio Duarte.
- 2- Nicolás Guardado.
- 3- Angela Monge.
- 4- Adela de los Dolores.
- 5- Consuelo Guardado.
- 6- Renfo Guardado.
- 7- Lorena Ortega.

PRODUCTOR ENLACE.

Pablo Osto Monge.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Juana Monge.
- 2- Rigoberto Hernández.
- 3- Manuel de J. M.
- 4- José Mario C.
- 5- José Herrán E.
- 6- José Napoleón M.

PRODUCTOR ENLACE

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

CDI: San Andrés. ZONA: GYTT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUDA: 6 CANTON: Sn. Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE.

Eulalio Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Joaquín Monge.
- 2- Antonio Melara.
- 3- Juan Urrutia.
- 4- Angel Antonio Monge.
- 5- María Guardado.
- 6- Saúl de los Dolores Baires.
- 7- Juana Vicente T.

PRODUCTOR ENLACE.

Mario Urbina Cerna.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Hilario Antonio Piedad.
- 2- María Estela Quijada.
- 3- Ana Gloria N. de Quijada.
- 4- Manerto Ocas.
- 5- Francisco Valle.
- 6- Wilfredo Ocas.
- 7- Julia Lobos.

PRODUCTOR ENLACE

Miguel Angel Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Telma del Carmen Molina.
- 2- José Noguera.
- 3- Angel A. Monge.
- 4- Zulma Ramírez, de Flores.
- 5- Agustín Zometa.
- 6- Guadalupe Hércules.
- 7- Juan Antonio Martínez.

EXTENSIONISTA: JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

EDI: San Andrés. ZONA: GYTT # 2. AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 7 CANTON: S. PEDRO MARTEL.

PRODUCTOR ENLACE

Damasio Cantón

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Santos Antonia Varela P.
- 2- César E. Trigueros.
- 3- Santos Armando Trigueros.
- 4- Jorge A. Martínez.
- 5- Santos Quijada Cruz.
- 6- Eduardo Vésquez.
- 7- Osto Trigueros.

PRODUCTOR ENLACE.

Santos Varela.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Miguel Urbina.
- 2- Mario Urbina M.
- 3- Pedro de Jesús Urbina.
- 4- Antonio Urbina.

PRODUCTOR ENLACE

Juan Mardoqueo Varela.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Apolonio Ezequiel Ochoa.
- 2- Aureliano Chicas.
- 3- Tomás Guerrero H.
- 4- Mario Antonio Chicas.
- 5- Eneberio (n) Guevara
- 6- Julio Urbina Cerna.
- 7- Carlos Guevara.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

CDT: San Andrés. ZONA: GITT # 2 AGENCIA: San Juan opico. SECTOR: 5 RUTA: 8 CANTON: San Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE

Aquilino Monge.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Inocencio Orellana.
- 2- Ovidio Melara.
- 3- Víctor Manuel Peraza.
- 4- Rigoberto Melara.
- 5- José Hernán.
- 6- Fidelio Pineda.
- 7- Aquilino Varela.

PRODUCTOR ENLACE

Napoleón Quijada.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Marta Delia Quijada.
- 2- Miguel Flores.
- 3- Geovany Polanco.
- 4- Mario Melara.
- 5- Juana Monge U.
- 6- José Napoleón Monge.

PRODUCTOR ENLACE

Juan Francisco Baires.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Miguel Polanco.
- 2- Angel Hércules.
- 3- José Urbina.
- 4- Juan Valdizón.
- 5- Sebastian Polanco.
- 6- Mario Hércules.
- 7- Marcos Valdizón.

C.1. AGRICOLA RUBRO: maiz
 AREA CULTIVADA 3.1 MZ. PRODUCCION TOTAL 581.77 PERIODO DE AL DE 19 99.
 PRODUCTOR: maio palanco C.O.T.: San Andrés ZONA I AGENCIA ofico
NS-56

	DESCRIPCION	EPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
I N S U M O S	Herbicida		Guazone	Lts	5	\$ 60.00	\$ 300.00
	Semilla		NS56	Lbs	30	\$ 3.00	\$ 90.00
	Insecticida		Calidol ip	46 Lbs	1	\$ 60.00	\$ 60.00
	Insecticida		Helio para	Lbs	12	\$ 5.00	\$ 60.00
	Fertilizante	Siembra	16-20-0	33	4	\$ 166.00	\$ 664.00
	Fertilizante	despost chovido	16-20-0	33	4	\$ 166.00	\$ 664.00
P. S U E L O S	Guabito	abril	manual	diciembre	1	\$ 100.00	\$ 100.00
	Siembra	mayo	chico	diciembre	5	\$ 20.00	\$ 100.00
C U L T U R A L E S	Reposo		manual	diciembre	1	\$ 200.00	\$ 200.00
	1° fertilización		trabaja	diciembre	1	\$ 20.00	\$ 20.00
	2° fertilización		trabaja	diciembre	1	\$ 20.00	\$ 20.00
C O S E C H A	doble	Agosto	manual	diciembre	6	\$ 20.00	\$ 120.00
	Tapira	Nco.	manual	diciembre	6	\$ 20.00	\$ 120.00
	desgranado	Nco.	maquina	ff	58.77	\$ 2.50	\$ 146.93
	Transporte	Nco.	animal	Carga	27	\$ 3.00	\$ 81.00
	SUB TOTAL:						\$ 2757.00
	ADMINISTRACION 3%						\$ 82.71
	SUB TOTAL						\$ 2839.71
	IMPREVISTOS: 5%						\$ 141.99
	SUB TOTAL						\$ 2981.70
	INTERESES 16%		Y				\$ 477.07
	VALOR DE LA TIERRA						\$ 200.00
	TOTAL						\$ 3658.77

RENDIMIENTO: 58 qq/mz Precio de venta unitario \$ 25 Valor de la produccion 4,350
 Beneficio/costo costo por unidad costo por Mz. \$ 2001.41
 Beneficio/Mz. \$ 441.59 Beneficio/unidad

C.3. AGRICOLA RUBRO: Frijol

AREA CULTIVADA 1 MZ. PRODUCCION TOTAL 14.56 PERIODO DE 29 AL 30 DE 19 Nov.

PRODUCTOR: Santos Ujeira C.D.T.: San Andres ZONA I AGENCIA Cajiao

	DESCRIPCION	EPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
I N S U M O S	Herbicida	Agosto	Granmatec	Lts	4	\$ 45.00	\$ 180.00
	Fertilización	"	M. 20-0	kg	15	\$ 108.00	\$ 1620.00
	Abono foliar	"	Bayfolen	Lts	2	\$ 28.00	\$ 56.00
	Semilla	"	Frijol 400	Lbs	130	\$ 3.50	\$ 455.00
	Insecticida	"	Tamaron	Lts	1	\$ 23.00	\$ 23.00
	Insecticida	Agosto	Folida	Lts	1	\$ 58.00	\$ 58.00
							Total \$ 1093.00
P. S U E L O S	Control de malezas	Agosto	Granmatec	diaphambic	2	\$ 30.00	\$ 60.00
	Tomegas	Agosto	manual	diaphambic	4	\$ 20.00	\$ 80.00
							Total \$ 140.00
C U L T U R A L E S	Siembra	Agosto	manual	diaphambic	8	\$ 30.00	\$ 240.00
	Control de plagas	Septien.	Tamaron	diaphambic	2	\$ 30.00	\$ 60.00
	Control de malezas	Septien.	Granmatec	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
	Fertilización	Septien.	M-20-0	diaphambic	4	\$ 20.00	\$ 80.00
	Control de plagas	Octubre	Folida	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
	Foliar	Octubre	Bayfolen	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
						Total \$ 480.00	
C O S E C H A	Arriague	Nov.	manual	diaphambic	10	\$ 25.00	\$ 250.00
	Asurea	Nov.	manual	asura	120	\$ 2.00	\$ 240.00
	Carros	Nov.	manual	Saca	10	\$ 4.00	\$ 40.00
	Almacenamiento	Nov.	manual	diaphambic	2	\$ 25.00	\$ 50.00
						Total \$ 580.00	
	SUB TOTAL:						\$ 2,223.00
	ADMINISTRACION 3%		T				\$ 66.69
	SUB TOTAL						\$ 2,289.69
	IMPREVISTOS: 5%						\$ 114.48
	SUB TOTAL						\$ 2,404.17
	INTERESES 16%		Y				\$ 384.67
	VALOR DE LA TIERRA						\$ 157.00
	TOTAL						\$ 3,001.54

RENDIMIENTO: 14.56 qq/mz Precio de venta unitario 400 Valor de la produc. 7324
 Beneficio/costo 2.24 costo/por unidad 22.72 costo por Mz. 2100
 Beneficio/Mz. 5.72 Beneficio/unidad

M.A.G. FICHA DEL PRODUCTOR DE ENLACE FPE 01 E.D.O.


UBICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR. 1992 LMO () 1

C.D.1.: San Andrés ZONA: 7 AGENCIA: San Juan Opico LMO () 2
SECTOR: 1 RUTA: 1 CIRCULO VEJINAL: 6

DATOS PERSONALES DEL PRODUCTOR

PRODUCTOR: Santos Leonardo Herules
1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido

SABE LEER: SI (X) NO () 2 ESCRIBE: SI (X) NO () 2 SEXO: M (X) F () 2 EDAD: AÑOS
CROQUIS DE LA EXPLOTACIÓN VISITADA.

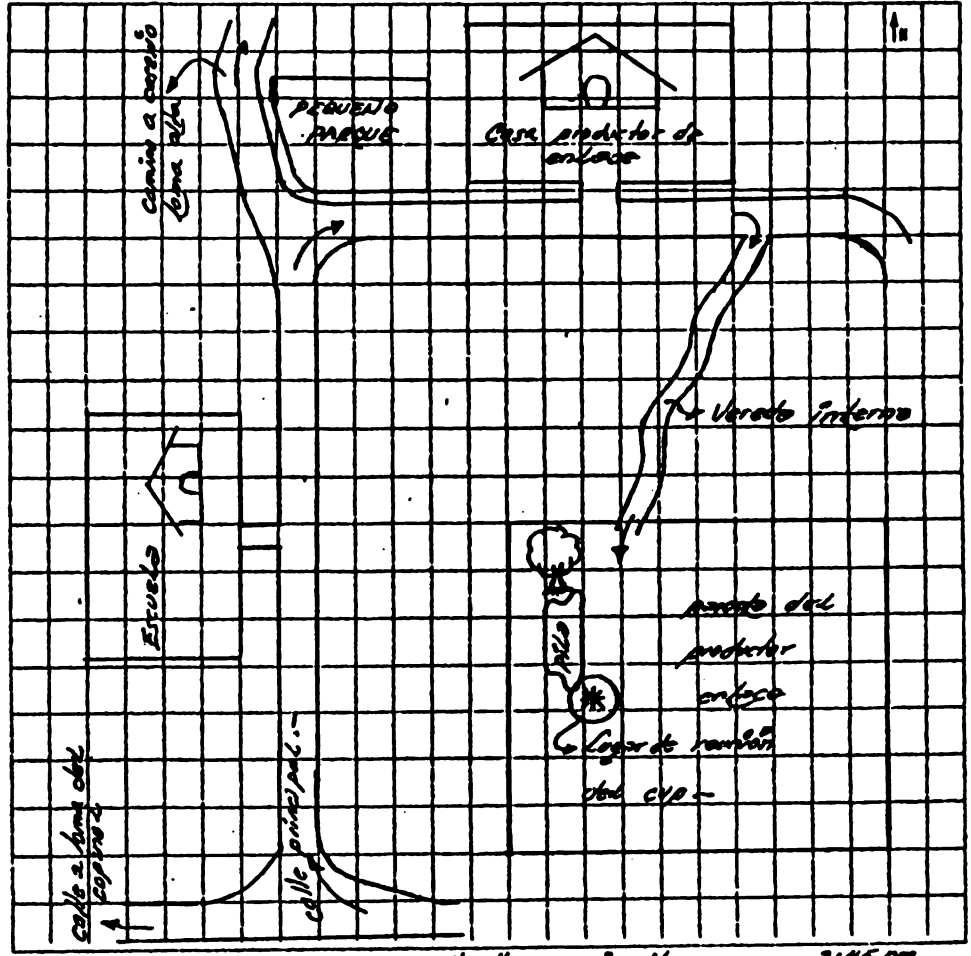

* Area de ramón con esp: 3:45 pm Lunes 2/15 días.- en Lugar llamado EL MOBA (10 ml).-

PARCELAS DEL PRODUCTOR.

Table with columns: No, AREA, URIBACIÓN (DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, CANTÓN, CASERIO), TENENCIA (PROPIA, ARREND, OTROS). Row 1: 1, 1, la libertad, Sa. J. Opico, Sn. Pedro 77, El Cocal, PROPIA checked.

EXTENSIONISTA: José Ronald Orsoro FIRMA: [Signature] FECHA: Agosto 93
JEFE DE AGENCIA: José Adalberto Santos V. Vo.Bo. [Signature] FECHA: Agosto 93

M.A.G

A. PERFIL DEL PRODUCTOR

E.D.O

A.1. mano de obra familiar

1. Productor mismo y personas que viven permanentemente con él, como dependientes.

 Ni hombres ni mujeres

- a) Distribución por edades (Personas)

MENORES 12 AÑOS		12-17 AÑOS		18-65 AÑOS		MAYORES DE 65.		TOTAL
M	F	M	F	M	F	M	F	
/	3	/	/	/	/			7

2. Aportan trabajo a la explotación familiar

b) número de personas

				8				8
				8				8

c) total meses/año (del literal b-)

3. Trabajan fuera de la explotación.

d) número de personas

								0

e) número total meses/año (del literal d)

4. Mano de obra familiar

f) Total meses/año (del literal c + e)

.3	.2	.5	.5	1.	1.	.5	.5	

g) factor de corrección (del literal f)

h) total meses/año adultos (literal gxf)

5. Mano de obra equivalente (MOE)

(total h/12 meses por año)

No de personas adultas/año

A.2. vivienda familiar

1. Tenencia de la vivienda:

propia 1 alquilada () 2 colono o guardián () 3

ocupante gratuito () 4 otro () 5 _____

2. Número de habitantes:

3. Materiales de vivienda:

a) Techos: teja 1 duralita () 2 lámina () 3

paja o palma () 4 Otro () 5 _____

b) Paredes: bahareque () 1 adobe 2 madera () 3 lámina () 4

paja o palma () 5 mixto () 6 otro () 7 _____

c) Pisos: ladrillo de barro () 1 madera () 2 tierra 3

cemento () 4 otro () 5 _____

4. Servicio de viviendas:

a) Agua: Cañería privada propia () 1 Pila pública () 2

Pozo privado () 3 Pozo público () 4 Rio () 5 Nacimiento () 6

Otro () 7 _____

b) Servicio Sanitario: Inodoro 1 Letrina () 2 Ninguno () 3

c) Combustible para cocinar: Electricidad 1 Gas propano () 2 Kerosene () 3

Lefia 4 Otro () 5 _____

d) Alumbrado: Electricidad () 1 Lámpara de gas () 2 Candil 3

Candelas 4 Otro () 5 _____

4.3. Otros servicios

1. FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

a. FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS EFECTIVOS DE PRODUCCIÓN

	SI	NO
- FONDOS PROPIOS	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
- CRÉDITO BANCARIO	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
- OTROS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

b. SI NO SOLICITÓ CRÉDITO BANCARIO INDIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL

- NO LO NECESITA	<input type="checkbox"/> 1
- DESEARÍA PERO NO CREE QUE LE OTORGUEN	<input type="checkbox"/> 2
- DESCONOCE EL TRÁMITE	<input type="checkbox"/> 3
- PIENSA QUE EL TRÁMITE ES LARGO O DIFÍCIL	<input type="checkbox"/> 4
- OTRO _____	<input type="checkbox"/> 5

c. SI SOLICITÓ CRÉDITO BANCARIO Y LE FUE DENEGADO, INDIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL.

- NO TIENE GARANTÍA BANCARIA	<input type="checkbox"/> 1
- NO PERTENECE A GRUPO SOLIDARIO	<input type="checkbox"/> 2
- MIEMBROS DE GRUPO SOLIDARIO NO CANCELARON	<input type="checkbox"/> 3
- USTED NO CANCELÓ SU OBLIGACIÓN (MOROSO)	<input type="checkbox"/> 4
- NO SABE LA RAZÓN	<input type="checkbox"/> 5
- OTRO _____	<input type="checkbox"/> 6

2. ASISTENCIA TÉCNICA

a. RECIBIÓ ASISTENCIA TÉCNICA DISTINTA AL E.D.O DURANTE EL CICLO AGRÍCOLA RECÉN PASADO.

SI 1 NO 2 PASE A B

b. QUIÉN SE LA PROPORCIONÓ (MARQUE LA PRINCIPAL)

- INSTITUCIÓN DE AYUDA COMUNITARIA	<input type="checkbox"/> 1
- EMPRESA COMERCIALIZADORA	<input type="checkbox"/> 2
- OTRA _____	<input type="checkbox"/> 3

c. CÓMO LA CONSIDERA

RUEDRO.

- BUENA	<input type="checkbox"/> 1	_____
- REGULAR	<input type="checkbox"/> 2	_____
- DEFICIENTE	<input type="checkbox"/> 3	_____

III. PLANIFICACION

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.-----

CDT: San Andrés. ZONA: GYT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 4 CANTON: Chatusnena.

PRODUCTOR ENLACE

Marco Tulio Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Alfonso Quijano.
- 2- Alonso Franco.
- 3- Julio Cerna.
- 4- Mario Hernández.
- 5- Julián Hércules.
- 6- Jesús Galdames.
- 7- Mario Galdames.

PRODUCTOR ENLACE

Santos Hércules.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Eliseo Antonio Rodríguez.
- 2- José Guevara Ardón.
- 3- Joaquín Barique Guillén.
- 4- Ismael Corado.
- 5- Carlos Miscal Hércules.
- 6- Narciso Henríquez.
- 7-

PRODUCTOR ENLACE

Juan Flores.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Marcos Fuentes (Padre).
- 2- Juan G. Francisco G.
- 3- Marcos Fuentes (hijo)
- 4- Marvin Valdizón.
- 5- Jorge Urbina.
- 6- Rigoberto Hércules.
- 7- Luis Valdizón.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

CDF: San Andrés. **ZONA:** GYIT # 2 **AGENCIA:** San Juan Opico. **SECTOR:** 5 **RUTA:** 5 **CANTON:** San Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE

Isidro Ramírez.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Joaquín Santana Guillén.
- 2- Antonio V.
- 3- Francisco Amando G.
- 4- Agustín Escalante.
- 5- Juan Urbina.
- 6- David Juárez.
- 7- Mario Juárez.

PRODUCTOR ENLACE.

Mario Urbina Cerna.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Alcides Antonio Duarte.
- 2- Nicolás Guardado.
- 3- Angela Monge.
- 4- Adela de los Dolores.
- 5- Consuelo Guardado.
- 6- Renfis Guardado.
- 7- Lorena Ortega.

PRODUCTOR ENLACE.

Pablo Castro Monge.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Juana Monge.
- 2- Rigoberto Hernández.
- 3- Manuel de J. M.
- 4- José Mario C.
- 5- José Hernán E.
- 6- José Napoleón M.

PRODUCTOR ENLACE

2:00 p.m.
18/09/95.-

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

CDT: San Andrés. ZONA: GYT # 2 AGENCIA: San Juan Opico. SECTOR: 5 RUTA: 6 CANTON: Sn. Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE.

Eulalio Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Joaquín Monge.
- 2- Antonio Malara.
- 3- Juan Urrutia.
- 4- Angel Antonio Monge.
- 5- María Guardado.
- 6- Saúl de los Dolores Baires.
- 7- Juana Vicente T.

PRODUCTOR ENLACE.

Mario Urbina Cerma.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Hilario Antonio Fleitez.
- 2- María Estela Quijada.
- 3- Ana Gloria N. de Quijada.
- 4- Memerto Chicas.
- 5- Francisco Valle.
- 6- Wilfredo Chicas.
- 7- Julia Lobos.

PRODUCTOR ENLACE

Miguel Angel Urbina.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Telma del Carmen Molina.
- 2- José Noguera.
- 3- Angel A. Monge.
- 4- Zulma Ramírez, de Flores.
- 5- Agustín Zoneta.
- 6- Guadalupe Hércules.
- 7- Juan Antonio Martínez.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD OROZCO MONTEJO.

EDI: San Andrés. **ZONA:** GYT # 2. **AGENCIA:** San Juan Opico. **SECTOR:** 5 **RUTA:** 7 **CANTON:** S. PEDRO MARTELL.

PRODUCTOR ENLACE

Demasio Cantón

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Santos Antonia Varela P.
- 2- César E. Trigueros.
- 3- Santos Armando Trigueros.
- 4- Jorge A. Martínez.
- 5- Santos Quijada Cruz.
- 6- Eduardo Vásquez.
- 7- Oasto Trigueros.

PRODUCTOR ENLACE.

Santos Varela.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Miguel Urbina.
- 2- Mario Urbina M.
- 3- Pedro de Jesús Urbina.
- 4- Antonio Urbina.

PRODUCTOR ENLACE

Juan Mardoqueo Varela.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Apolonio Ezequiel Ochoa.
- 2- Aureliano Chicas.
- 3- Tomás Guerrero H.
- 4- Mario Antonio Chicas.
- 5- Eneferio (n) Guevara
- 6- Julio Urbina Cerna.
- 7- Carlos Guevara.

EXTENSIONISTA : JOSE RONALD CROZCO MONTEJO.

COT: San Andrés. ZONA: GITT # 2 AGENCIA: San Juan opico. SECTOR: 5 RUTA: 8 CANTON: San Pedro Mártir.

PRODUCTOR ENLACE

Aquilino Monge.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Inocencio Orellana.
- 2- Ovidio Malara.
- 3- Víctor Manuel Peraza.
- 4- Rigoberto Malara.
- 5- José Hernán.
- 6- Fidelio Pineda.
- 7- Aquilino Varela.

PRODUCTOR ENLACE

Napoléon Quijada.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS

- 1- Marta Delia Quijada.
- 2- Miguel Flores.
- 3- Geovany Polanco.
- 4- Mario Malara.
- 5- Juana Monge U.
- 6- José Napoleón Monge.

PRODUCTOR ENLACE

Juan Francisco Baires.

LUGAR DE REUNION

Parcela del productor enlace.

PRODUCTORES VECINOS.

- 1- Miguel Polanco.
- 2- Angel Hércules.
- 3- José Urbina.
- 4- Juan Valdizón.
- 5- Sebastian Polanco.
- 6- Mario Hércules.
- 7- Marcos Valdizón.

C.1. AGRICOLA RUBRO: maiz
 AREA CULTIVADA 3.1 MZ. PRODUCCION TOTAL 58.99 PERIODO DE AL DE 19 99.
 PRODUCTOR: mauro palanco C.D.T.: San Andrés ZONA I AGENCIA ofico
NS-56

	DESCRIPCION	EPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
I N S U M O S	Herbicida		man mano	lts	5	\$ 60.00	\$ 300.00
	Semilla		NS56	Lbs	30	\$ 3.00	\$ 90.00
	Insecticida		Chloro lig Ho	lts	1	\$ 60.00	\$ 60.00
	Insecticida		Metolix para	Lbs	12	\$ 5.00	\$ 60.00
	Fertilizante	Sinchar	16-20-0	kg	4	\$ 160.00	\$ 640.00
	Fertilizante	disponi el mundo	16-20-0	kg	4	\$ 160.00	\$ 640.00
P. S U E L O S	Guatleco	abril	manuel	diplomado	1	\$ 100.00	\$ 100.00
	Siembr	mayo	chico	diplomado	5	\$ 20.00	\$ 100.00
C U L T U R A L E S	Reposo		manuel	diplomado	1	\$ 200.00	\$ 200.00
	1° fertilización		instituto	diplomado	1	\$ 20.00	\$ 20.00
	2° fertilización		fertilizant	diplomado	1	\$ 20.00	\$ 20.00
C O S E C H A	doble	Agosto	manuel	diplomado	6	\$ 20.00	\$ 120.00
	Tapira	Nov.	manuel	diplomado	6	\$ 20.00	\$ 120.00
	desgranado	Nov.	maquina	kg	58.99	\$ 2.50	\$ 147.48
	Transporte	Nov.	animal	Carro	27	\$ 3.00	\$ 81.00
	SUB TOTAL:						\$ 2757.00
	ADMINISTRACION 3%						\$ 82.71
	SUB TOTAL						\$ 2839.71
	IMPREVISTOS: 5%						\$ 141.99
	SUB TOTAL						\$ 2981.70
	INTERESES 16%						\$ 477.07
	VALOR DE LA TIERRA						\$ 2000.00
	TOTAL						\$ 3658.77

RENDIMIENTO: 58 qq/mz Precio de venta unitario \$ 25 Valor de la produccion 4,350
 Beneficio/costo costo por unidad costo por Mz. \$ 2981.77
 Beneficio/Mz. \$ 141.99 Beneficio/unidad

C.V. AGRICOLA RUBRO: Frijol

AREA CULTIVADA 1 MZ. PRODUCCION TOTAL 14.56 PERIODO DE 29 AL 30 DE 19 Nov.

PRODUCTOR: Santos Lopez C.O.T.: Sr. Ortiz ZONA I AGENCIA Opico

	DESCRIPCION	EPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
I N S U M O S	Herbicida	Agosto	Quemante	Lts	4	\$ 45.00	\$ 180.00
	Fertilización	"	16-20-0	kg	15	\$ 108.00	\$ 1620.00
	Abono foliar	"	Borax	Lts	3	\$ 20.00	\$ 60.00
	Semilla	"	Frijol	Lbs	130	\$ 3.50	\$ 455.00
	Insecticida	"	Tomaron	Lts	1	\$ 23.00	\$ 23.00
	Insecticida	Agosto	Foliar	Lts	1	\$ 55.00	\$ 55.00
						Total	\$ 1093.00
P. S U E L O S L.	Control de Malezas	Agosto	Manual	diaphambic	2	\$ 50.00	\$ 100.00
	Tamegué	Agosto	Manual	diaphambic	4	\$ 20.00	\$ 80.00
							Total
C U L T U R A L E S	Siembras	Agosto	Manual	diaphambic	8	\$ 30.00	\$ 240.00
	Control de Algas	Septiembre	Tomaron	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
	Control de malezas	Septiembre	Quemante	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
	Fertilización	Septiembre	16-20-0	diaphambic	4	\$ 20.00	\$ 80.00
	Control de Algas	Octubre	Solida	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
	Foliar	Octubre	Borax	diaphambic	2	\$ 20.00	\$ 40.00
						Total	\$ 480.00
C O S E C H A	Arriero	Nov.	Manual	diaphambic	10	\$ 25.00	\$ 250.00
	Arriero	Nov.	Manual	Arriero	120	\$ 2.00	\$ 240.00
	Arriero	Nov.	Manual	Saco	10	\$ 4.00	\$ 40.00
	Arriero	Nov.	Manual	diaphambic	2	\$ 25.00	\$ 50.00
						Total	\$ 580.00
	SUB TOTAL:						\$ 2,223.00
	ADMINISTRACION 3%						\$ 66.69
	SUB TOTAL						\$ 2,341.19
	IMPREVISTOS: 5%						\$ 117.05
	SUB TOTAL						\$ 2,458.24
	INTERESES 16%						\$ 393.31
	VALOR DE LA TIERRA						\$ 157.00
	TOTAL						\$ 3,001.55

RENDIMIENTO: 14.56 qq/mz Precio de venta unitario 400 Valor de la produc. 7 824
 Beneficio/costo 2.2 costo por unidad 27.72 costo por Mz. 2100
 Beneficio/Mz. 5.72 Beneficio/unidad

M.A.G. FICHA DEL PRODUCTOR DE ENLACE FPE 01 E.D.O.

UBICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR. 1992 LBO () 1


C.D.Z.: San Andrés ZONA: 1 AGENCIA: San Juan Opico LBO () 2

SECTOR: 1 RUTA: 1 CIRCULO VECINAL: 0

DATOS PERSONALES DEL PRODUCTOR

PRODUCTOR: Santos Reinardo Marulas
 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. apellido 2do. apellido

SABE LEER: SI (✓) 1 NO () 2 ESCRIBE: SI (✓) 1 NO () 2 SEXO: M (✓) 1 F () 2 EDAD _____ AÑOS
 CROQUIS DE LA EXPLOTACIÓN VISITADA.

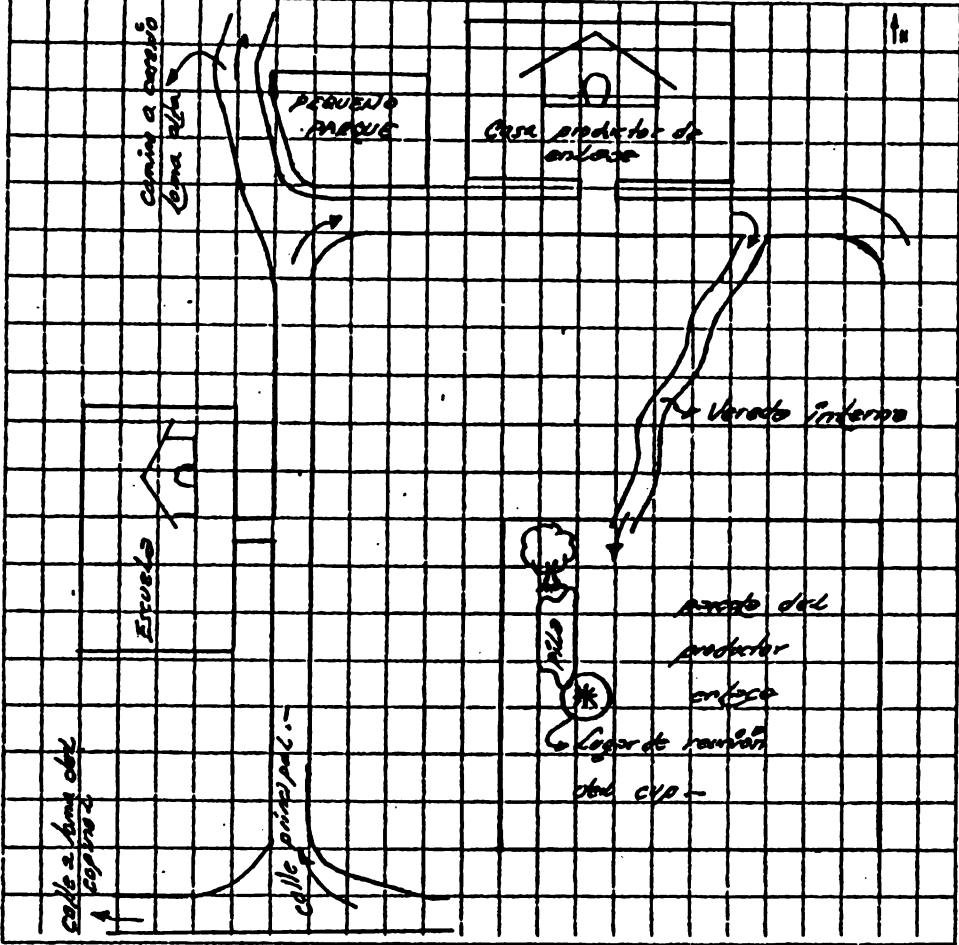

* Area de terreno con cop: 3:45 por
 lencas c/15 días.-
 en Lugar llamado
 EL MORA (6 pta).-

PARCELAS DEL PRODUCTOR.

No	AREA M2.	UBICACION				TENENCIA.		
		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTÓN	CASERIO	PROPIA	ARREND	OTROS
1	2	La Libertad	San J. Opico	San Pedro M.	EL Centro	✓		
2								
3								
4								

EXTENSIONISTA: José Arnold Orero FIRMA: [Signature] FECHA: Aguila 93
 JEFE DE AGENCIA: José Adalberto Santos V. Vo.Bo. FECHA: Aguila 93

M.A.G | A. PERFIL DEL PRODUCTOR | E.D.O

A.1. mano de obra familiar

1. Productor mismo y personas que viven permanentemente con él, como dependientes.

Hombres F mujeres

MENORES 12 AÑOS		12-17 AÑOS		18-65 AÑOS		MAYORES DE 65.		TOTAL
M	F	M	F	M	F	M	F	
1	3	1	1	1				7

a) Distribución por edades (Personas)

2. Aportan trabajo a la explotación familiar

b) número de personas

c) total meses/año (del literal-b)

				8				8
				8				8

3. Trabajan fuera de la explotación.

d) número de personas

e) número total meses/año (del literal d)

								0

4. Mano de obra familiar

f) Total meses/año (del literal c + e)

g) factor de corrección (del literal f)

h) total meses/año adultos (literal gxf)

.3	.3	.5	.5	1.	1.	.5	.5	

5. Mano de obra equivalente (MOE)

(total ÷ 12 meses por año)

No de personas adultas/año

A.2. vivienda familiar

1. Tenencia de la vivienda:

propia 1 alquilada () 2 colono o guardián () 3

ocupante gratuito () 4 otro () 5 _____

2. Número de habitantes:

3. Materiales de vivienda:

a) Techos: teja (1) duralita () 2) lámina () 3)

yaja o palma () 4) Otro () 5 _____

b) Paredes: bahareque () 1) adobe (2) madera () 3) lámina () 4)

yaja o palma () 5) mixto () 6) otro () 7 _____

c) Pisos: ladrillo de barro () 1) madera () 2) tierra (3)

cemento () 4) otro () 5 _____

4. Servicio de vivienda:

a) Agua: Cañería privada propia () 1) Pila pública () 2)

Pozo privado () 3) Pozo público () 4) Rio () 5) Nacimiento () 6)

Otro () 7 _____

b) Servicio Sanitario: Inodoro (1) Letrina () 2) Ninguno () 3)

c) Combustible para cocinar: Electricidad (1) Gas propano () 2) Kerosene () 3)

Lefa (4) Otro () 5 _____

d) Alumbrado: Electricidad () 1) Lámpara de gas () 2) Candil (3)

Candelas (4) Otro () 5 _____

2.3. Otros servicios

1. FINANCIAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

a. FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS EFECTIVOS DE PRODUCCIÓN

	SI	NO
- FONDOS PROPIOS	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
- CRÉDITO BANCARIO	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
- OTROS _____	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

b. SI NO SOLICITÓ CRÉDITO BANCARIO INDIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL

- NO LO NECESITA	<input type="checkbox"/> 1
- DESEARÍA PERO NO CREE QUE LE OTORGUEN	<input type="checkbox"/> 2
- DESCONOCE EL TRÁMITE	<input type="checkbox"/> 3
- PIENSA QUE EL TRÁMITE ES LARGO O DIFÍCIL	<input type="checkbox"/> 4
- OTRO _____	<input type="checkbox"/> 5

c. SI SOLICITÓ CRÉDITO BANCARIO Y LE FUE DENEGADO, INDIQUE LA RAZÓN PRINCIPAL.

- NO TIENE GARANTÍA BANCARIA	<input type="checkbox"/> 1
- NO PERTENECE A GRUPO SOLIDARIO	<input type="checkbox"/> 2
- MIEMBROS DE GRUPO SOLIDARIO NO CANCELARON	<input type="checkbox"/> 3
- USTED NO CANCELÓ SU OBLIGACIÓN (MOROSO)	<input type="checkbox"/> 4
- NO SABE LA RAZÓN	<input type="checkbox"/> 5
- OTRO _____	<input type="checkbox"/> 6

2. ASISTENCIA TÉCNICA

a. RECIBIÓ ASISTENCIA TÉCNICA DISTINTA AL E.D.O DURANTE EL CICLO AGRÍCOLA RECÉN PASADO.

SI 1 NO 2 PASE A B

b. QUIÉN SE LA PROPORCIONÓ (MARQUE LA PRINCIPAL)

- INSTITUCIÓN DE AYUDA COMUNITARIA	<input type="checkbox"/> 1
- EMPRESA COMERCIALIZADORA	<input type="checkbox"/> 2
- OTRO _____	<input type="checkbox"/> 3

c. CÓMO LA CONSIDERA

RUBRO.

- BUENA	<input type="checkbox"/> 1	_____
- REGULAR	<input type="checkbox"/> 2	_____
- DEFICIENTE	<input type="checkbox"/> 3	_____

III. PLANIFICACION

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the company's revenue streams. This includes sales from various product lines and services. The data shows a steady increase in revenue over the past year, which is attributed to strategic marketing efforts and improved operational efficiency.

The third section focuses on the company's financial health and liquidity. It highlights the strong cash flow and the ability to meet all financial obligations. The author notes that the company's debt-to-equity ratio remains low, indicating a solid financial foundation.

Finally, the document concludes with a summary of the overall performance and a look ahead at future goals. The author expresses confidence in the company's ability to continue its growth trajectory and achieve its long-term objectives.

C.I. AGRICOLA RUBRO: MOLZ

Santos Varela.

AREA CULTIVADA 1 HZ. PRODUCCION TOTAL 10 QQ. PERIODO DE Maya AL DIC DE 199 3

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO
	DE MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
Fertilizante formula	Quintal	4	\$ 85	\$ 340
Servicio 115	Libras	130	\$ 3.5	\$ 455
Acidificada 200000	Libras	5	\$ 47	\$ 235
Tratador de semillas	Libras	1	\$ 160	\$ 160
Insecticida	Libras	1	\$ 80	\$ 80
Fertilizantes Soliolo	Quintal	6	\$ 42	\$ 252
Insecticida Granulado (Caldin)	Libras	15	\$ 2	\$ 30
ENERGIA				
Gasoleno (limpia)	D/H	1	\$ 25	\$ 100
Control de maleza	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Fertilizacion	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Control plagas	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Control de maleza	D/H	2	\$ 25	\$ 50
LABORES				
Trazado	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Control de plagas	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Servicio	D/H	6	\$ 25	\$ 150
DEPRECIACION				
Maquina	D/H	8	\$ 25	\$ 200
Maquina	D/H	8	\$ 25	\$ 200
Maquina	D/H	2	\$ 25	\$ 50
Maquina	D/H	35	\$ 7	\$ 245
SUB TOTAL				2577.70
ADMINISTRACION 3%				77.33
SUB TOTAL				2655.03
IMPREVISTOS 5%				132.75
SUB TOTAL				2787.78
TASA INTERESES 15%				418.17
VALOR DE LA TIERRA			\$ 250	250.00
TOTAL				3455.95

AREA (HZ) : 1 REVD. (QQ/HZ) : 10 INGRESO (C/HZ) : 1300 COSTO (C/HZ) : 3455.95
 BENEFICIO (C/HZ) : 1225.6 BENEF. COSTO : 35.5 CTS/REV. (C/HZ) : 52.79

C.1. AGRICOLA NOMBRE: FRIJOL

Santos Ureola

ÁREA CULTIVADA 1 HZ. PRODUCCIÓN TOTAL 32 qq. PERIODO DE DAOS AL DIC. DE 1993

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
SEMILLA DE CANTA LUCATECO	LIBRAS	86	\$ 7	\$ 560
FERTILIZANTE FORMULA	QUINTAL	4	\$ 100	\$ 400
" " SULTATO	QUINTAL	4	\$ 45	\$ 180
ABONO FOLIAR (BAYFOLBY)	LITRO	2	\$ 40	\$ 80
INSECTICIDA HERBOL	LITRO	1	\$ 350	\$ 350
TRATADOR DE SEMILLA	LIBRA	1	\$ 165	\$ 165
HERBICIDA QUEMANTE	LITRO	5	\$ 45	\$ 225
LIMPIA (HELMIKONE)	D/4	2	\$ 25	\$ 50
BIOMBRA	D/4	8	\$ 25	\$ 200
CONTROL PLAGA	D/4	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACIÓN	D/4	4	\$ 25	\$ 100
CONTROL MALECA	D/4	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGA	D/4	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACIÓN FOLIAR	D/4	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGAS	D/4	2	\$ 25	\$ 50
ARRASQUE	D/4	8	\$ 30	\$ 240
ADOPRESO	SACO	16	\$ 25	\$ 400
SUB TOTAL				3200
ADMINISTRACION 3%				96
SUB TOTAL				3296
IMPREVISTOS 5%				164.8
SUB TOTAL		1		3460.8
TASA INTERESES 10%		126		657.55
VALOR DE LA TIERRA		2		
TOTAL				4118.35

ÁREA (HZ) : 1 REND. (QQ/HZ) : 32 INGRESO (C/HZ) : 12300 COSTO. (C/HZ) : 4118.35
 BENEFICIO (C/HZ) 8681.6 BENEF. COSTO : 2.10 CTS/REH. (C/HZ) : 128.69

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO SAN ANDRES
EXTENSION DIRIGIDA A OBJETIVOS

11. C. DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA RECOMENDABLE DEL PRODUCTOR

C.I. AGRICOLA RUBRO: MAIZ-
AREA CUITIVADA 1 MZ. PRODUCCION TOTAL 70 QQ PERIODO DE MANUAL DIC 1992
PRODUCTOR: Santos Hernandez ZONA: _____ AGENCIA: SAN JUAN OPICO-

DESCRIPCION	EPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1. FERTILIZACION	ABRIL	FOSFORO	QUILAL	4	\$ 82	\$ 328
"	"	SULFATO	QUILAL	2	\$ 42	\$ 84.0
HERBICIDA	"	GLIFOSATO	LITROS	1	\$ 45	\$ 45.0
INSECTICIDA	"	YALATHION	LITROS	10	\$ 3.0	\$ 30.0
SEMILLA	"	CERTIFICADA	LIBROS	30	\$ 3.82	\$ 114.6
INSECTICIDA	"	ORTAVALO	LITROS	5	\$ 5	\$ 25.0
PURIFICACION	MAYO	MANUAL	D/H	4	\$ 25	\$ 100
SIEMBRA	MAYO	MANUAL	D/H	4	\$ 25	\$ 100
CONTROL MALZAS	MAYO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGAS	MAYO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACION	JULIO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL MALZAS	JULIO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGAS	JULIO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACION	JULIO	QUIMICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
DOBLA	AGOSTO	MANUAL	D/H	5	\$ 25	\$ 125
TAPISCA	NOVIEMBRE	MANUAL	D/H	6	\$ 25	\$ 150
DESPLAZA	DIC.	MANUAL	CAJAS	25	\$ 7	\$ 175
SUB TOTAL						\$ 1681.
ADMINISTRACION 3%						\$ 48.948
SUB TOTAL						\$ 1680.51
IMPREVISTOS 5%						\$ 84.0274
SUB TOTAL						\$ 1764.53
TASA INTERES 19%					2007.8	\$ 335.26
VALOR DE LA TIERRA						\$ 300
TOTAL						\$ 2399.8

REGISTRO DE OBJETIVOS

RENDIMIENTO DE: 70 a 70 QQ/MZ. COSTO/UNIDAD DE 70 (\$) COSTO/MZ DE 70
BENEFICIO/COSTO DE 70 a 70 BENEFICIO/UNIDAD DE 70 (\$) BENEFICIO/MZ DE 70

BENEFICIO BRUTO 4900 - COSTOS

4900 - 2399.8 = 2.500.20

B/C = 1.091

CTS/70 = 34.28


C.I. AGRÍCOLA RUBRO: FRÍJOL

ÁREA CULTIVADA HZ. PRODUCCIÓN TOTAL 32 qq. PERÍODO DE DE 199
 PRODUCTOR C.D.T. ZONA AGENCIA

DESCRIPCIÓN	ÉPOCA	CLASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
SEMILLA	XXXXXX	CASCATECO	LIBRAS	80	\$ 7	\$ 560
FERTILIZANTE	XXXXXX	FORMULA CASERO	QUINTAL	2.5	\$ 100	\$ 250
ABONO FOLIAK	XXXXXX	CASERO	GALONES	54	—	\$ 18
HERBICIDA	XXXXXX	QUIMIQUÉ	LITROS	1	\$ 45	\$ 45
INSECCION	XXXXXX	BOTANICO	LITROS	12	\$ 2	\$ 24
" " "	XXXXXX	TAMARU	LITROS	1	\$ 73	\$ 73
" " "	XXXXXX					
" " "	XXXXXX					
LIMPIA	AGOSTO	SEM. MANI	D/H	2	\$ 26	\$ 50
SIEMBRAS	AGOSTO	MANUAL	D/H	8	\$ 25	\$ 200
CONTROL PLAGAS	AGOSTO	BOTANICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACION	SEPT.	QUIMICA	D/H	4	\$ 25	\$ 100
CONTROL MALDAS	SEPT.	SEMI-BOTA	D/H	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGAS	SEPT.	BOTANICO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
FERTILIZACION FOLIAK	SEPT.	CASERO	D/H	2	\$ 25	\$ 50
CONTROL PLAGAS	OCT	TAMARU	D/H	2	\$ 25	\$ 50
APROQUE	NOV.	MANUAL	D/H	8	\$ 30	\$ 240
APROQUE	NOV.	MANUAL	CBCO	16	\$ 25	\$ 400
SUB TOTAL						2207
ADMINISTRACIÓN 3%						66.81
SUB TOTAL						2273.21
IMPRESISTOS 5%						113.66
SUB TOTAL						2386.87
TASA INTERESES 12%						153.00
VALOR DE LA TIERRA						
TOTAL						2840.37

OBJETIVO:

ÁREA (HZ): 1 RED. (QQ/HZ): 32 INGRESO (C/HZ): 12800 COSTO (C/HZ): 2840.37
 BENEFICIO (C/HZ): 9959.6 BENEF. COSTO: 3.50 CTS/RED. (C. HZ): 88.76



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

CENTA

E.D.O.

BOJA 1

12. REGISTRO DE OBJETIVOS


199

San José Oeste

RUBRO
Maís

Zona

Nombre	SITUACION ACTUAL 1997										OBJETIVOS PARA 1997										RESULTADOS PARA 1997									
	Año (M.E.)	Rend. (t/ha)	Prendo (ha)	Ingreso (M\$)	Costo (CCT) (M\$)	Rend. (t/ha)	BN / CST	CTRD (ha)	Año (M.E.)	Rend. (t/ha)	Prendo (ha)	Ingreso (M\$)	Costo (CCT) (M\$)	Rend. (t/ha)	BN / CST	CTRD (ha)	Año (M.E.)	Rend. (t/ha)	Prendo (ha)	Ingreso (M\$)	Costo (CCT) (M\$)	Rend. (t/ha)	BN / CST	CTRD (ha)						
1. San José Oeste	90	62.8	90	5652	2800	3.462	1.56	35.43	65	90	6450	2800	3.462	1.78	36.38	65	90	6450	2800	3.462	1.78	36.38	65	90	6450					
2. San José Oeste	90	60.8	90	5492	2800	3.492	1.18	41.12	65	90	6450	2800	3.492	1.54	36.38	65	90	6450	2800	3.492	1.54	36.38	65	90	6450					
3. San José Oeste	90	60.5	90	5450	2800	3.550	1.16	41.43	65	90	6450	2800	3.550	1.04	36.76	65	90	6450	2800	3.550	1.04	36.76	65	90	6450					
4. San José Oeste	90	62	90	5570	2800	3.370	1.53	35.78	64	90	6200	2800	3.400	1.74	34.81	64	90	6200	2800	3.400	1.74	34.81	64	90	6200					
5. San José Oeste	90	68	90	6120	2800	4.120	1.98	30.19	68	90	6120	2800	4.120	2.06	29.91	68	90	6120	2800	4.120	2.06	29.91	68	90	6120					
6. San José Oeste	90	61	90	5770	2800	3.970	1.61	34.92	68	90	6120	2800	3.970	1.93	31.72	68	90	6120	2800	3.970	1.93	31.72	68	90	6120					
7. San José Oeste	90	57	90	5130	2800	3.010	1.50	35.96	63	90	5670	2800	3.620	1.76	32.53	63	90	5670	2800	3.620	1.76	32.53	63	90	5670					
8. San José Oeste	90	59	90	5310	2800	3.410	0.13	39.0	63	90	5670	2800	3.620	1.26	34.61	63	90	5670	2800	3.620	1.26	34.61	63	90	5670					
9. San José Oeste	90	57.8	90	5242	2800	3.442	0.95	45.98	62	90	5270	2800	3.470	1.32	38.20	62	90	5270	2800	3.470	1.32	38.20	62	90	5270					
10. San José Oeste	90	62	90	6380	2800	3.580	1.26	43.54	65	90	6380	2800	3.580	1.54	38.46	65	90	6380	2800	3.580	1.54	38.46	65	90	6380					
11. San José Oeste	90	60	90	5990	2800	3.190	1.05	36.66	67	90	5920	2800	3.120	1.17	31.25	67	90	5920	2800	3.120	1.17	31.25	67	90	5920					
12. San José Oeste	90	56.5	90	5005	2800	3.125	1.62	33.62	63	90	5120	2800	3.320	1.98	30.15	63	90	5120	2800	3.320	1.98	30.15	63	90	5120					
13. San José Oeste	90	55	90	4950	2800	2.150	1.02	44.54	60	90	5050	2800	2.250	1.00	33.50	60	90	5050	2800	2.250	1.00	33.50	60	90	5050					
14. San José Oeste	90	58	90	5000	2800	1.800	0.52	57.14	60	90	5090	2800	2.290	1.04	33.33	60	90	5090	2800	2.290	1.04	33.33	60	90	5090					
15. San José Oeste	90	66	90	5940	2800	3.140	1.32	37.17	61.5	90	6165	2800	3.365	1.68	33.57	61.5	90	6165	2800	3.365	1.68	33.57	61.5	90	6165					
16. San José Oeste	90	62	90	6020	2800	3.220	1.15	41.79	67	90	6030	2800	3.230	1.36	32.25	67	90	6030	2800	3.230	1.36	32.25	67	90	6030					
17. San José Oeste	90	61	90	5990	2800	3.190	1.74	34.85	63	90	6030	2800	3.230	1.53	31.74	63	90	6030	2800	3.230	1.53	31.74	63	90	6030					
18. San José Oeste	90	60	90	5900	2800	3.100	0.86	37.33	61.5	90	6030	2800	3.230	1.15	41.16	61.5	90	6030	2800	3.230	1.15	41.16	61.5	90	6030					
19. San José Oeste	90	63.8	90	5722	2800	2.922	1.12	35.31	65.5	90	5895	2800	3.095	1.35	32.16	65.5	90	5895	2800	3.095	1.35	32.16	65.5	90	5895					
20. San José Oeste	90	61.5	90	5535	2800	2.735	1.21	40.65	64.5	90	5805	2800	3.005	1.52	35.65	64.5	90	5805	2800	3.005	1.52	35.65	64.5	90	5805					
TOT. LES PROBLEMO																														



CENTA

E.D.O.

PÁGINA 1

RUBRO

REGISTRO DE OBJETIVOS

199


Zona

Aguada

Año (Ab.)	SITUACION ACTUAL 199						OBJETIVOS PARA 199 J						RESULTADOS PARA 199 J					
	Rank (RD) objto	Precto objto	Ingreso objto	Costo (CST) objto	Benef. (BN) objto	BN / CST	Rank (RD) objto	Precto objto	Ingreso objto	Costo (CST) objto	Benef. (BN) objto	BN / CST	Rank (RD) objto	Precto objto	Ingreso objto	Costo (CST) objto	Benef. (BN) objto	BN / CST
1. <i>Angel P. Durbanes</i>	60-5	90	5,775	1,900	5,075	1.86	31-90											
2. <i>Zorbal P. Boin</i>	58	90	6,220	2,750	5,970	2.15	41-91											
3. <i>Lito Flores</i>	60	90	5,100	2,100	3,930	1.87	35-80											
4. <i>Bertha marcos</i>	61	90	6,120	2,550	3,820	1.72	33-82											
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
TOTALES PROMEDIO																		

CENTA

E.D.O.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
AGROPASTORAL Y FORESTAL

HOJA 1

RUBRO

REGISTRO DE OBJETIVOS 199

Zona

Agrode

Año (Mds.)	SITUACION ACTUAL 199										RESULTADOS PARA 199													
	Reas. (RDs) 00000	Precio 0000	Ingreso 0000	Costo (CST) 0000	Benef. (BN) 0000	BN / CST	CTRAD 000	Año (Mds.)	Reas. (RDs) 00000	Precio 0000	Ingreso 0000	Costo (CST) 0000	Benef. (BN) 0000	BN / CST	CTRAD 000	Año (Mds.)	Reas. (RDs) 00000	Precio 0000	Ingreso 0000	Costo (CST) 0000	Benef. (BN) 0000	BN / CST	CTRAD 000	
1. Inicial 6. Octubre	19	175	3.325	1.950	1.375	0.9	92.10		2.0	175	3.500	1.950	1.750	1.0	12.5									
2. Final 1. Enero	16.5	175	2.872.5	1.900	972.5	0.51	145.15		19	175	3.325	1.900	1.405	0.75	100.50									
3. Difer. Flores	18	175	3.150	2.110	1.040	0.49	112.23		20.5	175	3.572.5	2.000	1.572.5	0.79	172.52									
4. Difer. maracala	17	175	2.925	1.600	1.325	0.85	94.11		19.5	175	3.422.5	1.600	1.822.5	1.13	122.05									
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
TOTAL PROMEDIO																								

Productor: Santos Varela

Maiz	Frijol	Sorgo
<p>Los objetivos planteados van relacionados con el aumento en la producción en medio de un invierno no muy bueno, para lograr este objetivo se planteo la perspectiva de conseguir una variedad o híbrido resistente a la Seguia, por lo cual el productor obtuvo el híbrido B-833.</p> <p>Que es resistente a següia y de muy buen rendimiento.</p> <p>Además se ha sembrado H8-7 que es de muy buen rendimiento y resistente al acame.-</p>	<p>- Se espera sembrar Centa-Cuzca-tleco para lograr una buena producción, dándole un buen manejo con el MIP.</p> <p>- Además se usarán diversos productos botánicos como Neem, Semibotánico (herbicida), Chile picante + Ajos y Juanilama con todo esto se espera reducir al máximo todos los costos de producción</p> <p>- También se usará abonos orgánicos los cuales serán donados por FUSAI.-</p>	<p>Se han planteado objetivos considerando que se podrá lograr una buena producción usando una buena variedad (Centa Taxistepeque) el cual será muy bien fertilizado con fórmula Triple 15 mas Grea Tal como lo recomendamos el resultado del análisis de Suelo.-</p>
<p>También se espera reducir algunos costos usando productos botánicos y Semi botánicos, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Neem- herbicida Semi-botánico- y uso de gallinaza como abono orgánico.-		

Productor: Mario Polanco

maíz	frijol	Sorgo
<p>El objetivo planteado es:</p> <p>a- Mantener la producción y disminuir los costos y esto esperamos lograrlo usando algunos productos botánicos, como insecticidas botánicos (neem), herbicida Semi botánico, Gallinaza como abono orgánico y otros productos de origen natural.-</p>	<p><u>Objetivo:</u></p> <p>mantener los rendimientos, reduciendo los costos de producción pues el productor ya hace uso de Centa-Cuzcotleco.-</p>	<p>Se obtuvo Centa teistopoc- que en el Centa. y se espera con esta variedad y con un buen manejo el incrementar la producción.</p>



13. CERCUBERENA DE AYLLICUBAS Y RENJALAS POR BISEMANA
 AGENCIA: San Juan Oro. ZONA: 5 COT: San Andrés PERIODO: 1955

	19-19	20-19	31-16	27-01	23-16	17-00	21-15	14-01	28-11	22-05	26-01	9-27	27-06	7-20	21-05	04-11	18-30	24-12	13-18	28-01	10-23	24-07	02-10	10-23	24-07	
Objetivo 13, Recultivos 1																										
Actividad 2.13.1.1																										
Ejercer labores de plantación en el caso de tener a nivel de obra																										
03 (Estados)																										
Actividad 2.13.1.2																										
Preparar el sitio de actividades y suministrar materiales nuevos a las actividades																										
Organizar el trabajo de los obreros en la granja de endemoniación																										
01 (moneda)																										
02 (Papel moneda)																										
02 (Parcelas fijadas)																										
02 (Parcelas fijas)																										
04 (Cinco en moneda)																										
04 (Cinco Agrícola)																										
04 (Cinco fijas)																										
Actividad 2.13.1.3																										
Preparar la edificación de facilidades, obras púnicas y expensas																										
01 (moneda en moneda)																										
02 (Análisis de Suelo)																										
01 (moneda en fijas)																										
02 (Parcelas moneda)																										



PROGRAMA DE ACTIVIDADES SUBSERVALES

AGENCIA: _____ ZONA: _____ COT: _____ PERIODO: _____

Actividad	19-02	20-02	3-16	17-02	23-16	27-30	31-15	14-27	28-11	15-25	26-8	9-27	27-06	1-20	21-03	21-03	18-30	31-14	18-23	21-12	10-25	21-09	10-30	24-09	
02 (Puntas triple)																									
Actividad 2.13.1.5																									
Implementación de parcelas de manejo indígena en plátanos y mango.																									
manejo -																									
01 (manejo en maíz)																									
01 (manejo en frijol)																									
02 (manejo en maíz)																									
02 (manejo en frijol)																									
03 (manejo en maíz)																									
03 (manejo en frijol)																									
02 (Agri. implement. técnicas agrícolas)																									
02 (Agri. implement. técnicas agrícolas)																									
Actividad 2.13.1.5																									
Capacitación de productores en el uso de técnicas agrícolas en las parcelas de manejo indígena y parcelas de L. Agrícola.																									
01 (manejo)																									
06 (Curso)																									
Actividad 2.13.1.6																									
Ornato de actividades para la atención de cultivos especiales																									



PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES

AGENCIA: _____ ZONA: _____ CDT: _____ PERIODO: _____

FECHA	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	
en las siguientes rubros experimentales y locales.																			
1. (manejo)																			
Actividad 2.13.1.1.3																			
Proceso de control de la erosión avanzada en las labores y obras de conservación de suelos.																			
01 (Alta de mangos)																			
01 (Utriles)																			
02 (Arado m.a.)																			
02 (Puede (no arado))																			
02 (Zanbo a mano con otros arados)																			
Actividad 2.13.1.4																			
Establecimiento de viveros para mejorar los sistemas agropecuarios.																			
01 (manejo)																			
02 (Vivero)																			
02 (Proveedores en vivero)																			
Actividad 2.13.1.5																			
Transporte de plantas en cultivos tipo riego, en su fase de...																			



GRUPO DE AYUDILIADOS WU MEMBRAS

AGENCIA: _____ ZONA: _____ CDT: _____ PERIODO: _____

FECHA	19-02	20-02	3-16	17-02	23-16	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG. AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
05 (Día de Campo en campo)																
06 (Día de Campo en campo)																
07 (Día de Campo en campo)																
Actividad 2.13.3.3																
Primer trabajo de Sideros de																
Proyecto Agrocivico de L.																
01 (campo)																
02 (campo Agrocivico de L.)																
Actividad 2.13.3.4																
Trabajo realizado en terreno a nivel																
de practicas.																
06 (Trabajo en terreno)																
Resultados																
Finca de Opicell, trabajos en sistema																
de Opicell, trabajos en sistema																
Finca para obras relacionadas de																
las obras de Opicell y de Opicell																
02 (Finca Opicell)																
Actividad 2.13.3.1																
Trabajo de Opicell, trabajos en sistema																
03 (Trabajo realizado en terreno)																



C A D U S T R I A D E A G R I C U L T U R A Y P E S C A D E R I A

AGENCIA: _____ ZONA: X CDT: _____ PERIODO: _____

FECHA	19-18	20-01	3-16	17-02	23-16	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DICIEMBRE
Actividad 2.13.3.2															
Prácticas del problema															
(5/100 en actividades anteriores)															
Actividad 2.13.3.3															
Determinación de Sistemas Orgánicos															
resúmenes o extractos para solución															
prácticas complementarias															
(5/100)															
Actividad 2.13.3.4															
Prácticas de conservación y															
nutrición en suelos, utilización															
de nutrientes vegetales y animales															
(5/100)															
(2 (Práct. de labor))															
Actividad 2.13.3.5															
Estudios de Reproducción animal															
en animales de la granja de															
A. D. D.															
(2 (Práct. de labor))															
(2 (Práct. de labor))															
Grupos															
Actividad 2.13.3.6															
Prácticas de conservación animal															



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS

AGENCIA: _____ ZONA: XT CDT: _____ PERIODO: _____

FECHA	19-02	20-02	3-16	17-01	03-16	17-00	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
00 (Luzerna)																	
Reunión #																	
Actividad 2.1.3.1.1																	
Investigación preliminar de suelo																	
Ensayo de siembra																	
03 (Luzerna)																	
Actividad 2.1.3.2																	
Organizar los productores en sus																	
grupos																	
00 (Comunicación a cargo)																	
Actividad 2.1.3.3																	
Subir a la AE (Hombres y																	
mujeres)																	
03 (Promoción de Tecnología)																	
Actividad 2.1.3.4																	
Reconstrucción y distribución de áreas																	
de irrigación de la zona de cultivo																	
03 (Socorro/Revisión)																	
Reunión #																	
Actividad 2.1.3.5.1																	
Trabajo de campo en nivel de finca																	



AGENCIA: SECRETARÍA DE ESTADO ZONA: 1 PERIODO: 1954

FECHA	DESCRIPCIÓN	SECTOR	VALOR	UNIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SECTOR	VALOR	UNIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	SECTOR	VALOR	UNIDAD
19-02	de P.A. (Ficha 1000)		3-16	17-01	03-10	17-00	21-15	14-03	28-11	12-25	2-0-3	9-27	27-06	7-30
05	(Ficha 1000 por materia)													
09	(Ficha 1000 por materia)													
	Actividad 2.13.5.3													
	Revisión del expediente de la													
	Finanzas actual oil producer)													
	06 (Taller/Estadística) 72													1/6
	Actividad 2.13.5.3													
	Trabajo de E. Estadística y													
	de (Taller/Estadística) 72													1/6
	Actividad 2.13.5.4													
	Cheque sobre la oficina de la													
	Finanzas remunerada -													
	06 (Taller/Estadística) 72													1/6
	Actividad 2.13.5.5													
	Transparencia de la Finanza													
	Remunerada.													
	01 (Producción)												1100	7200
	Actividad 2.13.5.6													
	Impresión de Boletines -													
	05 (Impresión)													



AGENCIA: DE AGRICULTORES Y GANADEROS

9

Fecha	Hora	Actividad	PERIODO:						Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
24850 Pecuaria									
Actividad 1									
Actividad 1									
Actividad 2									
Actividad 3									
Actividad 4									
Actividad 5									
Actividad 6									
Actividad 7									
Actividad 8									
Actividad 9									
Actividad 10									

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y/O SEASAJES



AGENCIA: _____ ZONA: _____ COT: _____ PERIODO: _____

FECHA	F. DES	FEBRU	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
20-02	3-16	17-02	17-02	21-03	26-11	26-11	27-06	9-20	21-03	04-19	10-30	01-14
20-02	3-16	17-02	17-02	21-03	26-11	26-11	27-06	9-20	21-03	04-19	10-30	01-14
Actividad 6.												
Revisar conjunto de diagramas, fotos de árboles y dibujos. -												
as (separado/paquetes/separados)												
Actividad 7.												
Revisar conjunto de diagramas, fotos en dibujo. -												
as (separado/paquetes/separados)												
Revisar 3.												
Actividad 1.-												
Preparar la muestra de paja roja, negra, verde y amarilla, en pedruzcos de 60 gramos y de la gymnia. -												
as (separado/paquetes)												
as (separado/paquetes)												
Actividad 8												
Preparar la preparación de paja, fríos y resecados de resecado. -												
as (libros)												
as (revisión de libros de texto)												
as (revisión de libros de texto)												



CATEGORIA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS

AGENCIA: _____ ZONA: _____ CDT: _____ PERIODO: _____

	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
anexo de parciales.-	6-18	20-02	3-16	17-01	03-16	17-30	31-15	14-27	26-11	12-25	26-7	18-30	31-14	16-23	30-12	03-16	18-01	10-23	24-07	
Actividad 1																				
Atención de Casos Patológicos según demanda.-																				
ANEXOS MANEJO																				
Resolución 2																				
Actividad 1																				
Proyecto de Sembrado de A. B. 27 en sistemas Agropecuarios.-																				
04 (CASA Agropecuaria)																				
04 (CASA Agropecuaria)																				
Actividad 2																				
Establecimiento de Parcelas Agropecuarias en A. B. 27 en Sistemas																				
02 (Establecimiento Parcelas)-																				
45 (CASA B. 27)																				
PROYECTO 072																				
Resolución 1																				
Actividad 1																				
Elaboración de Plan de Ejecución																				
03 (Plan de ejecuciones)																				



PERIODO:

ZONA: X CDT:

AGENCIA:

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Actividad 3.	6-19 20-02 3-16 17-02 23-16 27-03 31-15 14-07 28-11 31-25 18-30 21-03 28-25 24-22 10-28 27-01 20-28 24-07										
Técnicos (apoyados)											
00 (Curso/Técnicos) -		1/6									
Resultados 4.											
Actividad 3.											
Proveedores Capacitados -											
06 (Toda/Proveedores)											
Resultados 3											
Actividad 1.											
Promover la utilización de las											
prácticas de manejo integradas -											
(parcelas) - demostrativas.											
03 (Parcela mp - maid)				5/5							
02 (Parcela mp - fijas)											
04 (Parcela de campo - mp)										5/5	
PROYECTO FOMENTO -											
Actividad 3											
Actividad 1.											
Promover la utilización de técnicas											
de trazado nacional en áreas de											
uso familiar:											
02 (Parcela fomento)										3/2	
09 (transferencia de parcelas) ANAN			2/100							2/100	

SECRETARIA DE ACQUISICIONES Y SERVICIOS

17



PERIODO:

CDT:

ZONA: *y*

AGENCIA:

Fecha	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-31	
09 (Inventarios de inventario - Simulador)																			
09 (Inventarios de inventario - Simulador)																			
07 (GIRA)																			
07 (GIRA) con 40. Operadores																			

ORGANIZACIONES CON LAS CUALES SE COORDINA:

- 1) FUSAI
- 2) CATIE
- 3) PLAN INTERNACIONAL
- 4) SANIDAD VEGETAL.
- 5) GIZ.
- 6) FOMENTA.
- 7) INVESTIGACION CENIA.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

CENTA

Programa Nacional de Extensión

14. PLAN ANUAL DE MENSAJES PRIORITARIOS

Agencia
San Juan Opico

Zona

CDT
San Andres

Jefe de Agencia

Mes Periodo	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
	1, 2	3, 4	5, 6	7, 8	9, 10	11, 12	13, 14	15, 16	17, 18	19, 20	21, 22	23, 24	25, 26
Semana	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Bisemana	-	1era.	2da.	3era.	4ta.	5ta.	6ta.	7ta.	8a.	9a.	10a.	11a.	12a.
Visita													
Mensajes Técnicos y Actividades Relevantes	Preparación de vivero forestal	Resctracción CVP y corrección de TAP	Promoción de sistemas agroforestales.	Establecimiento de vivero forestal	Importancia de los silos de producción	Actividad relevante (vacunación)	Importancia de los abonos orgánicos	Manejo seguro de plaguicidas	Manejo integrado de malezas	Establecimiento de parcelas agroforestales	Manejo integrado de plagas de maíz	Importancia de barreras vivas	Integración de componente hortícola

Ministerio de Agricultura y Ganadería

CENTA

Programa Nacional de Extensión

PLAN ANUAL DE MENSAJES PRIORITARIOS

Agencia
San Juan Opico

Zona

CDI
San Andres

Jefe de Agencia

Mes Periodo	Julio		Agosio		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
	27, 28	29, 30	31, 32	33, 34	35, 36	37, 38	39, 40	41, 42	43, 44	45, 46	47, 48	49, 50	51, 52
Semana	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	
Bisemana	13a.	14a.	15a.	16a.	17a.	18a.	19a.	20a.	21a.	22a.	23a.	24a.	
Visita													
Mensajes Técnicos y Actividades Relevantes Prioritarios de la Bisemana	Manejo y mto. de parcelas agrif.	Actividad relevante	Promoción de semillas mejoradas	Manejo integrado de la plaga del foliaje	Gira Agroforestal	Actividad relevante	Manejo post cosecha	2da. fase de vacunación	Comercializa- ción de granos	Prácticas y obras de conservación de suelos	Determina- ción de rendimiento	Día de logros	

15 PLANIFICACION DE ENSAYOS Y PARCELAS

UBICACION

1	2	3	4	5	6
No. PARCELAS	RUBRO	AREA	No. BENEFICIARIOS	CANTON	QUE SE MADECRISTA
25	Maíz	3.57 m ² . 1000 m ² /parcela	25	- Agua curandito - San Felipe - San Antonio - San Pedro martín - Tehuicho - Chantlucene - Los Angeles - Barranca Honda - Sr. Nicolás los Errección - Comas de Santiago	- Bandejas de las variedades mejoradas seleccionadas. - Fertilizaciones escalonadas (Químico, orgánico) - Manejo Integrado de Plagas: (Plaguitidos).-
25	Sisal	3.57 m ² . 1000 m ² /parcela	25	- San Felipe - San Antonio - San Pedro martín - Tehuicho - Chantlucene - Los Angeles - Barranca Honda - Sr. Nicolás los Errección - Comas de Santiago - Agua curandito	- Bandejas de las variedades mejoradas seleccionadas. - Fertilizaciones Escalonadas (Químico, orgánico). - M.J.P. (plaguitidos)
20	Sorgo	2.15 m ² . 1000 m ² /parcela	20	- San Antonio - San Pedro martín - Tehuicho - Los Angeles - Barranca Honda - Chantlucene - San Felipe - Agua Curandito.	- Fertilizaciones escalonadas. (Químico). - Bandejas de las variedades mejoradas.
38	Agrarostales	10.85 m ² 2,000 m ² /parcela	38	- San Antonio - San Pedro martín - Tehuicho - Los Angeles - Barranca Honda - Chantlucene - Comas de Santiago - San Felipe. - Agua Curandito	- diferentes especies de A.M.A. con sus respectivos sistemas manejados sus bandejas.
5	Conservación de Suelos.	5 m ² .	5	- San Antonio - San Pedro martín - Tehuicho - Comas de Santiago - San Felipe.	- Bandejas y adios de conservación de Suelos.
5	Agrasilvopastoral	2.5 m ² 1/2 m ² /parcela	5	- San Pedro martín - Barranca Honda - Tehuicho - San Felipe - San Antonio.	- Componente pasto más cultivos, más árboles de uso múltiple.
5	Pastos	1.92 m ² 2000 m ² /parcela	5	- San Felipe - Chantlucene - Comas de Santiago - Los Angeles - San Nicolás los Errección	- Bandejas de las Pareas de Corte.

Materiales y productos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Detalle	materia C. Salicilado	unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Aporte de CENTA.-	Aporte de la Comunidad de Obr-	Variación, Especie.-
Maíz	Semilla	Lbs.	35	\$ 3.10	\$108.50	\$108.50	4285	CUM-Paraguana H-53 H-56 H-57
	Semilla	Lbs.	30	\$ 3.10	\$ 93.00	\$ 93.00		
	Semilla	Lbs.	35	\$ 3.10	\$ 108.50	\$ 108.50		
	Semilla	Lbs.	35	\$ 3.10	\$ 108.50	\$ 108.50		
Frijol	Semilla	Lbs.	132	\$ 4.00	\$ 528.00	\$ 528.00	21 1/2 m	Hoja de seda Cuscolecó
	Semilla	Lbs.	168	\$ 4.00	\$ 672.00	\$ 672.00		
Bajo	Semilla	Lbs.	40	\$ 2.53	\$ 101.20	\$ 101.20	62 1/2 m	CENTA-Terrestre CUM-ORIENTAL
	Semilla	Lbs.	225	\$ 2.53	\$ 569.25	\$ 569.25		
							1571.42	
Carra	Semilla	Cepas	100	\$ 5.00	\$ 500.00	\$ 500.00	2 d/h. \$ 50	16/100 -
Porto	Materia vegetalivo	Toneladas	4	\$ 200.00	\$ 800.00	\$ 800.00	4 d/h. \$ 130	Asistido
Quinto L	Plántula	Cajas Semi lleras.-	7	\$ 30.00	\$ 210.00	\$ 210.00	1 1/2 m	E. Coronado
			2	\$ 30.00	\$ 60.00	\$ 60.00	-	E. C. Triadora
			2	\$ 30.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 2850	A. mangium.
					Total	375-62		

Registros:

Se llevará un control contabilizando todas las actividades o trabajos de registros: costos de producción, productores que lleven las parcelas, productores que visitan las parcelas, y registros de resultados esperados. -

Cronograma de Actividades.-

1 No	2 ACTIVIDAD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Semilla de maiz.												
2	Cajas semillera.												
3	Pasto (Zorote Auxiliar).-												
4	Véliver												
5	Semilla de maiz												
6	Soras												
7	Selección de productores innovadores.												
diseño y siembra: maiz Véliver Pasto Agropantales Sijol Sargo													
Registro de costos de producción													
Registro de Actividades agronómicas de cada parcela.													

CRUCE
MAIZ
MAIZ
19000
3000

Resultados Esperados.

~~Al finalizar el ciclo agrícola los híbridos demostrados~~

a) - Demostrar que las características Agronómicas de los híbridos validados por el Centro Superarán a las Semillas usadas por los productores tradicionalmente, especialmente sobre su rendimiento. -

b) -

b) - Que todos los productores organizados en CUP, conozcan las bondades del híbrido que se mostró en dicho Sector. -

c) - Se espera demostrar las ventajas siguientes:

- calidad de granos
- aumento de Rendimientos
- mejoramiento del medio ambiente.
- conservación de suelos.

d) - Esperamos medir la adopción mediante ~~los~~ Registros de Actividades y Costos por parcelas. - 1995, 1996 -

e) - Esperamos que el material demorinado se encuentre disponible en Centa y otras instituciones comerciales para abastecer demanda generada en la zona. -

IV. SEGUIMIENTO



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA Y FORESTAL



16. PLAN BISEMANAL DE ACTIVIDADES DE EL EXTENSIONISTA.

CANTON		MUNICIPIO		CANTON		MUNICIPIO		CANTON		MUNICIPIO		CANTON		MUNICIPIO	
RUTA 1		RUTA 2		RUTA 3		RUTA 4		RUTA 5		RUTA 6		RUTA 7		RUTA 8	
ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN	ACT/ MEN
8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 10:00	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.
1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.
8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	8:00 a 12:30	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.
1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.	1:30 en adelante	Exposic. de Objetos de cultura en el Salomón Hebbel.

PRIMA Y SELLO
Val. del Jefe de Agroneo

Extensivista



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA Y FORESTAL



INFORME BISEMAL DE ACTIVIDADES DE EL EXTENSIONISTA

C.D.: San Andrés. **HORA GTR # 2** **AGENCIA San Juan Ostico.** **SECTOR 5**
 SEMANA 15 al 28 de Septiembre de 1995. **EXTENSIONISTA José Román Orozco.** **LB-01**

RUTA	RUTAS		VISITAS A CIRCULOS		ASISTENCIA DE PRODUCTORES			ACTIVIDADES Y/O MENSAJES	ACEPTACION DEL MENSAJE	
	P	R	P	R	P	R	ALTO		MEDIO	BAJO
1	1	1	3	3	30	48	Tambien se inscribieron 12 agricultores para asistral fincamiento impartido por FUBEM.	X		
2	1	1	3	3	30	23	se visito una parcela agroforestal y se estableció una parcela de PASOLAC.- en S.A.P. Martin.-	X		
3							de Televisión que se realizará en el cantón de PISA, componente extensión			
4							programa de capacitación a los agricultores en la Ogrmín de extensión de PASOLAC.- en S.A.P. Martin.-			
5	1	1	3	3	30	21	80 agricultores y personalidades especiales.-	X		
6	1	1	3	3	30	25	Aquí se estableció una parcela de PASOLAC.-	X		
7							Se mueve la capacitación de NIP para la proxima semana.-			
8							Se realizó una gira a 50 agricultores de Chalatenango y 15 de S.A. Pedro Martin sobre agricultura Sostenible. y se planificó una gira el jueves 28 de Sept. 95.			
TOTAL	4	4	12	12	120	97				
% CUMP										
OBSERVACIONES										

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE T R I M E S T R E					ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO	REALIZADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	5to. Trimestre		
2.12.1.5 Capacitar a los productores en la aplicación de tecnología apropiada en las áreas de cosecha y postcosecha de la producción. (Mtl.: C-34 h/a).	Finasjes C.U.P PRODUCTORES VISITAS DIESTROS							
2.12.1.6 Orientar a los agricultores para la obtención de créditos oportunos en las diferentes rubros agropecuarios y forestales.	Finasjes C.U.P Productores Visitas Cuñas radiales Jes							
2.12.1.7 Promover el control de la erosión a través de prácticas y obras de conservación de suelos.	Finasjes C.U.P Productores Visitas Áreas (ac.) Siras Agricultores							
2.12.1.8 Establecimiento de viveros para introducir sistemas agroforestales.	Finasjes C.U.P Productores Visitas Viveros Productores Ac. de plantas							
2.12.1.9 Transferir tecnología en cultivos donde sea factible	Finasjes C.U.P Productores Visitas Parcelas demostr. Siras Productores							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE T R I M E S T R E REALIZADO												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO	
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S			
2.13.1.10 Orientar a los productores (as) en la comercialización de los productos agropecuarios.	Reuniones C.U.P. Productores Visitas															
2.13.1.11 Elaborar un estudio sobre el perfil socio-productivo de pequeños y medianos productores (as) lo cual ayudará a respaldar el cumplimiento o no del 70% de agricultores (as) aplicando prácticas con perspectivas de agricultura sostenible.	Estudio															
2.13.2 RESULTADO 2 tecnologías de sistemas de producción en fincas transferidas.																
ACTIVIDADES. 2.13.2.1 Preparar el plan de mensajes técnicos.	Plan de mensaje															
2.13.2.2. Transferir las nuevas tecnologías por medio de métodos de Extensión (visitas, charlas, demostraciones, etc.)	Días de campo Productores Días de juegos Productores Días de demostr. Productores Exposiciones Productores Ferias Productores Demostrac. de métodos Productores Mensajes C.U.P. Productores Visitas Parcelas Giras Agricultores															
2.13.2.3 Promover tecnologías de sistemas de producción agroindustrial.																

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRIASA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO	
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S			
2.12.2.1 Evaluar resultados obtenidos a nivel de productores(as)	Taller Extensionistas	2	1	2	2	2	2	2								
2.12.3 RESULTADO 3	Q líneas/tec.)															
líneas de agricultores introduciendo sistemas de agricultura sostenible, diversificadas y con áreas restauradas de los recursos naturales y del ambiente.																
ACTIVIDADES																
2.12.3.1 Revisión de diagnósticos del área.	Diagnóstico línea															
2.12.3.2 Priorización del problema.	Taller No.Extensionista															
2.12.3.3 Determinación de sistemas agroforestales a establecer para solucionar problemas identificados.	Taller No.Extensionista															
2.12.3.3 Promover obras de conservación y restauración de suelos, utilizando material vegetativos aprovechables.	Parcelas Productores															
2.12.3.4 Establecer la reforestación en áreas críticas a través de la siembra de especies locales de uso múltiple.	Parcelas Productores No. de plantas Siembras Productores.	10	2	10	10	10	10	10								
	Unidades															

Seguimiento fincas ya establecido

PARO: AC

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

COT SAN ANDRES

227 227
227 227
227 227
227 227
227 227

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	NO. DE T R I M E S T R E						ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO		REALIZADO					
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total			
2.12.4 RESULTADO 4 24480 productores organizados en 2448 circuitos de los vecinales de productores para la recepción de la tecnología Agropecuaria y Forestal.	CUP	24	24	24	24	24	24	24	
	Nuevos Prod	21	0	20	11	7	0		
	Total prod.	240	240	260	233	240	240		
ACTIVIDADES									
2.12.4.1 Inventario productores (as) de cada zona de trabajo.	Inventario de productores.								
2.12.4.2 Organizar 24480 productores en 2448 circuitos vecinales de productores.	E.U.P	24	24	24	24	24	24	24	
	Productores /circuitos	24	24	24	24	24	24	24	
2.12.4.3 Seleccionar los productores de enlace (hombre y mujeres)	Hombres enlace Mujeres enlace	23 1	23 1	23 1	23 1	23 1	23 1	23 1	
2.12.4.4 reconocimiento y selección de áreas de influencia de las agencias de Extensión	Secciones Zonas	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	
2.12.5 RESULTADO 5 24480 pequeños y medianos productores capacitados en tecnología Agropecuaria y Forestal de los cuales al menos 1255 serán mujeres productoras a través de mensajes transmitidos por los Extensionistas.	Productores Productoras	215 18	222 18	282 21	215 18	222 18	222 18	222 18	
2.12.5.1 Toma de datos a nivel de fincas de enlace (ficha técnica)	Socio Ficha Muest								Ha se cuenta con: - 24 Semetos FPE-01 - Objetivos más Meiz. FPE-01 - 10 TAP para 1995 M.A.R. La ficha técnica de Conciderar una/encore. Para análisis generales se envían a través de mensajes transmitidos por los Extensionistas.
2.12.5.2 revisión del diagnóstico de la tecnología actual de productor (G.A.P)	Taller Extensionista	24	24	24	24	24	24	24	
2.12.5.3 Inventario de la tecnología disponible.	Taller Extens./Inv.(G.A.P)								
2.12.5.4 Estudio sobre la oferta de tecnología reconstruible.	Taller Extensionista.								

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA

AÑO 1955

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO	
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S			
2.14.1.5 Elaboración de plan de trabajo de los equipos GTT.	Plan															
2.14.2 RESULTADO 2																
Diagnóstico de las áreas donde actúan los equipos GTT y el as cuales se desarrollarán sistemas de producción en línea con enfoque de agricultura sostenible.																
ACTIVIDADES:																
2.14.2.1 Identificación de las áreas a investigar.	Propuesta															
2.14.2.2 Entrenamiento de los técnicos que participarán en el levantamiento de la información de campo GTT.	Taller Técnico															
2.14.2.3 Realización de la investigación de campo.	Documento															
2.14.2.4 Revisión y evaluación de la información generada por los proyectos experimentales, nacionales y otros.	Taller Técnico															
2.14.2.5 Sistematización de la información recibida.	Documento															
2.14.2.6 elaboración del documento final del diagnóstico.	Documento															
2.14.3 RESULTADO 3:																
Diagnóstico de la tecnología actual utilizada por el mediano y pequeño agricultor para la producción de granos básicos. Infructos, fertilizantes, productos agroindustriales pecuarios y recursos naturales.																

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA

AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO		
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S				
ACTIVIDADES																	
2.14.2.1 Revisar y analizar fichas de la tecnología actual de productores (TAP) a nivel de agencia para revisar las áreas donde se realizará la investigación.	Taller																
2.14.2.2 Realizar sondeos para verificar la información.	Documento																
2.14.2.3 Sistematizar la información recopilada (en el campo y bibliografía)	Documento																
2.14.2.4 Análisis de toma de decisiones con junta, Investigación y Extensión sobre la tecnología recomendada.	Taller Técnico																
2.14.2.5 Elaboración del documento final de diagnóstico.	Documento																
2.14.4 RESULTADO 4																	
Identificación y caracterización de los sistemas de producción en tres zonas de producción Pecuaria.	Propuesta																
2.14.4.2 Revisar y evaluar las experiencias sistematizadas de algunos proyectos en esta área (IPON - CNE - DGSUA)	Taller Técnico																
2.14.4.3 Sistematizar la información recopilada en el campo y en bibliografía.	Documento																
2.14.4.4. Elaborar informe final de diagnóstico.	Documento																

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRIORA
 AÑO 1995
 CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	NO. DE T R I M E S T R E												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENT
		PROGRAMADO			REALIZADO										
		J	A	S	1o. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	1o. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
2.14.5 RESULTADO 5 30600 productores; adiestrados en la aplicación de tecnologías Agropecuarias y Forestal, para producir en el desarrollo de una Agricultura Sostenible en Finca.															
ACTIVIDADES															
2.14.5.1 elaboración de planes de mentores para el adiestramiento de los productores	Plan														
2.14.5.2 Ejecución de adiestramiento mediante módulos de Extensión que se fundamente en los conocimientos prácticos de las tecnologías y transferirse.	Visitas sistematizadas.														
2.14.5.3 Evaluar el grado de asociación de la tecnología transferida.	Documento														
2.14.6 RESULTADO 6 Proponer la suscripción de convenios CDFA/ONG'S para mejorar la cobertura en la transferencia de la tecnología Agropecuaria y Forestal para pequeños y medianos productores															
ACTIVIDADES															
2.14.6.1 Identificar las ONG'S que trabajan en el sector agropecuario con recursos y sistemas productivos.	Informe														
2.14.7 RESULTADO 7 50 Extensionistas de las ONG'S capacitados en el sistema SVT de CDTA.	No corresponde al CDT.														

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

COT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	NO. DE TRIMESTRE		ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO	REALIZADO		
		J A S	J A S		
2.15 OBJETIVO INTERMEDIARIO 15 Fortalecer la interacción entre los productores que conforman los CUP'S.					
2.15.1 RESULTADO 1					
2-48 CUP'S interaccionando los procesos de comercialización.					
ACTIVIDADES					
2.15.1.1 Revisión de estudios de comercialización de productos agropecuarios.	Taller Técnicos.				
2.15.1.2 Selección alternativas de comercialización para agricultores organizados en CUP'S.					
2.15.1.3 Implementar alternativas de comercialización seleccionadas entre los productores.					
2.15 OBJETIVO INTERMEDIARIO 16 Orientar a los productores enlazar sobre los procesos de planificación productiva en las fincas.					
2.16.1 RESULTADO 1 9500 productores enlazar, trabajando bajo sistemas de planificación en fincas.					
ACTIVIDADES					
2.16.1.1 Elaborar plan de capacitación.	Plan				
2.16.1.2 Realizar eventos de capacitación.	Eventos Productivos				

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRIA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO			REALIZADO										
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S		
2.17 OBJETIVO INMEDIATO 17															
Lograr que los productores se conviertan en pequeños empresarios rurales.															
2.17.1 RESULTADO 1															
Al menos el 15% de los productores practica de la gestión empresarial.															
ACTIVIDADES															
2.17.1.1 Elaborar plan de capacitación en gestión empresarial y manejo de empresas rurales.	Plan														
2.17.1.2 Ejecución de plan de capacitación	Jornadas Productores														
2.17.1.3 Elaboración de informe de capacitación.	Informe														

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA

AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO			
		J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S					
<p>OBJETIVO : Incrementar la productividad de pecuarias y medianas productoras mejorando la producción animal, mediante la transferencia tecnológica.</p> <p>RESULTADO I Productoras (as): aplicando medidas preventivas para reducir la incidencia de enfermedades en las diferentes especies mayores y menores.</p> <p>ACTIVIDAD I Promover los distintos planes preventivos de las especies mayores y menores.</p>	MEZAS																	
1. Realizar campañas de vacunación en ganado bovino.	Campañas Animales Productoras (as)																	
2. Realizar campañas de vacunación en porcinos.	Campañas Animales Productoras																	
4. Realizar campañas de vacunación en aves.	Campañas Animales Productoras																	
5. Realizar campañas de vacunación en equinos.	Campañas Animales Productoras																	
6. Realizar campañas de desparasitación en bovinos.	Campañas Animales Productoras																	
7. Realizar campañas de desparasitación en porcinos.	Campañas Animales Productoras																	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRIA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

RUBRO PECUARIO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO					ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	5to. Trimestre		
RESULTADO 2		J	A	S	J	A	S	
1. Promover la siembra de pastos mejorados acorde a las condiciones agroecológicas de las áreas de influencia de las agencias. 2. Promover la preservación de pastos, forrajes y rastros de cosecha. 3. Promover la elaboración de alimentos suplementarios. 4. Orientar a los productores(as) en la obtención de materia prima para la elaboración de concentrados.	Reuniones							1 reunión: Promoc. de pastos de pastos y forrajes. Pedir 5 algar con 5 kg. (3 m ² /sin) 5 Algar con 5 kg. (1 m ² /sin). 13-20 octubre.
	C.V.P							
	Productores							
	Visitas							
	Parcelas							
	Reuniones							
	C.V.P							
	Productores							
	Visitas							
	Parcelas							
RESULTADO 3 1. Realizar prácticas adecuadas de manejo en las explotaciones bovinas. ACTIVIDAD 1 Promover el uso de registros zootécnicos y económicos en las explotaciones bovinas.	Reuniones							1 reunión: orientar en la obtención de materia prima para la elaboración de concentrados.
	C.V.P							
	Productores							
	Visitas							
	Parcelas							
	Reuniones							
	C.V.P							
	Productores							
	Visitas							
	Parcelas							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

COT SAN ANDRES

RUBIO PEQUENO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE T R I M E S T R E												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO	
		PROGRAMADO			REALIZADO											
		1er. Tr. Mes	2do. Tr. Mes	3er. Tr. Mes	J	A	S	J	A	S	J	A	S			
2. Orientar a los productores(as) en los diferentes métodos de mejoramiento bovino	Mensajes C.v.p Productores Visitas															
3. Orientar a los productores(as) en el manejo de pastizales.	Mensajes C.v.p Productores Visitas															
1. Atención de casos patológicos prioritarios según demanda.	Casos Productores(as) Anuales															

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

CDT SAN ANDRES

POMENTA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE T R I M E S T R E		ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO	REALIZADO		
		JUN 95	JUN 95		
OBJETIVO : Contribuir a la producción agrícola sostenible promoviendo la utilización de tecnología agrícola de aborres de labranza de ro animal.	hectáreas	30	30		
RESULTADO 1 : 30 extensionistas capacitados en la utilización apropiada de aborres de la branca de tiro animal.					
ACTIVIDADES:					
1.1. Elaborar plan de capacitación.	Plan				
1.2. Técnicos capacitados	Curso Técnicos				
RESULTADO 2 : 140 agricultores capacitados en la utilización apropiada de aborres de labranza de tiro animal.					
ACTIVIDADES:					
2.1. Elaborar plan de capacitación	Plan				
2.2. Capacitación de agricultores.	Seminario valle Producciones				
RESULTADO 3 : Productores con conocimiento en técnicas de tracción animal.					
ACTIVIDADES:					
3.1. Promover la utilización de técnicas de tracción animal; en áreas donde sea factible	Parcelas Pruebas Productores Exposiciones Día de Demos. Productores Grupos Productores			1	de Maná con Asociación Animal C
	Productores			1	San Juan y San Pedro de
	Día de Campo			1	San Juan y San Pedro de
	Productores				
	Exposiciones				
	Día de Demos.				
	Productores				
	Grupos				
	Productores				

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995
COT SAN ANDRES**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE T R I M E S T R E					ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADO	REALIZADO					
		J	A	S	J	A	S	
RESULTADO 4: Parcelas de validación establecidas. ACTIVIDADES: 4.1. Seleccionar productores cooperadores. 4.2 Validar arado combinado sus sembradoras 4.3 Validar cultivadora. 4.4. Validar arado combinado (sopele nuevo)	Parcelas Productores Parcelas Parcelas Parcelas Pruebas							

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRISA
AÑO 1995

COT SAN ANDRES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE												ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO	
		PROGRAMADO			REALIZADO											
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	J	A	S	J	A	S	J	A	S			
OBJETIVO: Fomentar el cultivo de AÑU entre los pequeños y medianos productores incorporando a los sistemas de producción el conocimiento adquirido en años que les permita satisfacer la demanda de productos forestales, orientándose hacia una agricultura sostenible y que contribuya a mejorar el medio ambiente. RESULTADO 1: Productores (as) vecinales participando en la implementación de viveros comunales y familiares que les permita incorporar en sus sistemas de producción. ACTIVIDADES 1. Inculcación de sembreros	Mensajes CUP Productores Visitantes Sembreros Productores Mensajes CUP Productores Visitantes Viveros familiar No de plantas Vivero comunal No de plantas Productores (as)															
		1/20														
RESULTADO 2: Productores (as) promovidos en la siembra de AÑU en sus sistemas de producción agroforestales. ACTIVIDADES 1. Promoción de AÑU en sistemas agroforestales.	Mensajes C y D Productores Visitantes Sembreros Productores															
		1/20														

Se realizaron 50 visitas a los productores en el mes de Septiembre.

- José Cordero
- José Pineda
- José Pineda
- Julio Chirina
- Luis Sierra

En el Campo Organizativo con 20 Prod. en

No se cumplieron todas las Rutas por incumplido.

NOV 1930

CDT SAN ANDRES

MOJELON

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	No. DE TRIMESTRE REALIZADO						ACUMULADO	CAUSAS DE NO CUMPLIMIENT
		J	A	S	J	A	S		
2. Establecimiento de parcelas agroforestales con AUN, con diferentes sistemas.	parcelas productores								
3. Siembra de AUN en áreas escroregadas.	hazanas de olivos productores								

3:15 p.m.

18. SITUACION ACTUAL COMPONENTE EXTENSION

COT San Andrés

INFORME DE ENERO AL MAYZO año 1995
 (Primer trimestre)

ZONA GTT # 2.
 AGENCIA SAN JUAN CPD.

EXTENSIONISTA / AGENCIA	VIENEN	SECTORES No	RUTAS No		GVM No		GVM No. PROD.	CVM No		CVP MIXTOS No	Prod. H.	Prod. M.	TOTAL DE CVP	P. E No		M. E No		TOTAL DE PROD. H M		
			1	2	1	2		1	2					1	2	1	2			
José Ronald Orozco, M.	VIENEN																			
José Ronald Orozco M.	ENERO 1er MES	1	8	12	96	1	8	11	81	7	23	1	17	15						
	Febrero. 2do MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marzo. 3er MES	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	
	ACUMULADO TRIMESTRAL	1	8	12	103	1	8	11	83	7	23	1	185	15						

DMA.

ALCANCE DE META FISICA

CDT SAN ANDRES

INFORME DE _____ AL _____ AÑO _____

ZONA _____

AGENCIA _____

AREA ATENDIDA POR RUBROS

RECURSOS NATURALES		PECUARIOS					OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	
CONS. DE SUELOS	VIVEROS	FORESTACION	BOVINOS	PORCINOS	AVES	APICOLA		
AGR	IMZ	AGR.	No. Plant. Prod.	No. plant. Prod.	Cabezas Prod.	Animales Prod.	Animales Prod.	Colmena

SITUACION ACTUAL COMPONENTE EXTENSION

ZONA GTT # 2.
 AGENCIA SAN JUAN OPTID.

INFORME DE JULIO AL SEPTIEMBRE AÑO 1995

EXTENSIONISTA / AGENCIA	VIENEN	SECTORES No	RUTAS No	CVH		CVM		C.V.P MIXTOS		TOTAL DE C.V.P	P. E No	M. E No	TOTAL DE PROD	
				No	No PROD.	No	No PROD.	No	Prod. H.				Prod. M.	H
	VIENEN	1	8	12	111	1	10	11	94	8	23	1	205	18
Jose Ronald Crozo M.	Julio 1er MES	-	-	-	10	-	-	-	-	0	-	-	10	-
	Agosto 2do MES	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-
	Septiembre 3er MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO TRIMESTRAL	1	8	12	121	1	10	11	101	8	23	1	222	18

ALCANCE DE META FISICA

CDT SAN ANDRES

INFORME DE JULIO AL SEPTIEMBRE AÑO 1995.

ZONA GTT # 2

AGENCIA SAN JUAN OPTICO.

AREA ATENDIDA POR RUBROS

MAZ	GRANOS BASICOS			HORTALIZAS			FRUTALES			AGROINDUSTRIALES			
	PRO	IMZ	SOBRO	PRO	IMZ	PRO	IMZ	PRO	IMZ	PRO	IMZ	PRO	IMZ
2	265.5	-	-	2	1	1	1/2	-	-	-	-	-	-
1	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.5	-	51	48	70	101	-	-	-	-	-	-	-

ALCANCE DE META FISICA

CDT SAN ANDRES

INFORME DE JULIO AL SEPTIEMBRE 1995.

ZONA CDT # 2.

AGENCIA SAN JUAN OPTICO.

AREA ATENDIDA POR RUBROS

CONS. DE SUELOS	RECURSOS NATURALES			PECUARIOS			AVES			APICOLA		OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
	AGR	AGR.	AGR.	BOVINOS	PORCINOS	OVINOS	ANIMALES	ANIMALES	ANIMALES	ANIMALES	ANIMALES	
INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ	INMZ
187	8	1,350	8	1,350	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19. ALCANCE DE META FISICA

CDT SAN ANDRES

INFORME DE Abril AL Junio AÑO 1956

ZONA GTT # 2

AGENCIA SAN JUAN OPTICO.

AREA ATENDIDA POR RUBROS

MAZ	GRANOS BASICOS						HORTALIZAS						FRUTALES						AGROINDUSTRIALES						
	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	PRO	MZ.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	200,5	-	-	3	2	-	-	2	1	1	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	265,5	-	-	3	2	-	-	2	1	1	1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SITUACION ACTUAL COMPONENTE EXTENSION

ZONA GTTI # 2.
 AGENCIA San Juan Opico.

AL Junio año 1995

COT San Andres
 Segundo trimestre.
 INFORME DE Abril

EXTENSIONISTA / AGENCIA	VIENEN	SECTORES No	RUTAS No	CVH		No PRCD.	CVM		No PRCD.	CVP MIXTOS		Prod. M.	TOTAL DE PROD.		
				No	No		No	No		Prod. H.	No		Prod. M.	H	M
	VIENEN	1	8	12	103	1	8	11	83	7	24	23	1	186	15
José Ronald Orozco H.	Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1er MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mayo	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	10	-
	2do MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Junio	-	-	-	5	-	2	-	4	-	-	-	-	9	2
	3er MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO TRIMESTRAL	1	8	12	111	1	10	11	94	7	24	23	1	205	17

ALCANCE DE META FISICA

CDT SAN ANDRES

INFORME DE ABRIL AL JUNIO AÑO 1995

ZONA CDT SAN ANDRES GDTI # 2.

AGENCIA SAN JUAN OPTID.

AREA ATENDIDA POR RUBROS

ZONA DE SUJECION UAGR	M2	RECURSOS NATURALES		PECUARIOS				AGENCIA	
		VIVEROS	FORESTACION	BOVINOS		AVES			
				No. plant.	Prod.	Cabezas	Prod.		Animales
ABRIL									
MAYO									
JUNIO	192	8	1350	8	1350	-	-	-	
			Un vivero						

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

En estos 3 meses no se ha atendido:

- bovinos.
- porcinos.
- aves.
- Apícola.

- Solo se ha promovido la importancia, de los abonos orgánicos, la promoción de híbridos, la implementación de tracción animal, MP del suelo, Manejo seguro de pesticidas e importancia del Veciver como barrera viva.

- En conservación de suelos se tienen: No gyesa, barreras vivas y muertas, acolchados de leñeras, terrazas iniciales, reforestación con AM, y otros.

distra.

20, INFORME DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

C.D.T.: SAN ANDRES.

GYTT: # 2

AGENCIA: SAN JUAN OPTICO.

RUBRO: MAIZ-FRLXL.

AÑO: 1995.

TECNICO	TIPO DE PARCELA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	UBICACION	AREA M2	FECHA DE SIEMBRA	INSUMOS PROPORCIONADO POR CENTA	OBSERVACIONES
José Ronald Orozco Montezjo.	Demostrativa.	Isidro Ramírez.	San Pedro Mártir.	1000 M ²	06-06-95	5 lbs Maíz B-833	Parcela de FOMENTA.
"	"	Miguel A. Urbina.	"	1000 M ²	01/06/95	5 lbs maíz H-53.	
"	"	Ezequiel Quevara.	"	1000 M ²	02/06/95	5 lbs maíz H-53.	
"	"	Juan Monterola.	"	1000 M ²	09/06/95	5 lbs maíz H-56.	
"	"	Juan Monterola.	"	1000 M ²	09/06/95	3.5 lbs Maíz H-57.	
"	"	Juan Monterola.	"	3500 M ²	08/06/95	15 lbs maíz H-53.	
"	"	Miguel A. Urbina.	"	1000 M ²	01/06/95	5 lbs maíz H-56.	
"	"	Miguel A. Urbina	"	1000 M ²	01/06/95	5 lbs maíz H-57.	
"	"	Santos Varela.	"	1000 M ²	02/06/95	5 lbs maíz HS-7. (GIZ).	
José Ronald Orozco Montezjo.	"	Juan Monterola.	"	1000 M ²	05/06/95	10 lbs Frijol ICR-565.	
"	"	Juan Monterola.	"	1000 M ²	05/06/95	10 lbs frijol CENSA-CIZ-CATECO.	
"	"	Juan Monterola.	"	1000 M ²	08/06/95	Todos los insumos y mano de obra.	Parcela coordinada con Depto de Investigación CENSA.

dmss.

11:00 a.m.

INFORME DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

C.D.T.: SAN ANDRÉS.

GYTT: # 2.

AGENCIA: SAN JUAN OPTID.

RUBRO: AGROFORESTAL.

AÑO: 1995.

TECNICO	TIPO DE PARCELA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	UBICACION	AREA M2	FECHA DE SIEMBRA	INSUMOS PROPORCIONADOS POR CENTA	OBSERVACIONES
Josef Ronald Orozco Montezajo.	Agroforestal.	Isidro Ramirez.	San Pedro Martir.	2000 M ²	27/05/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Santos Varela.	"	2000 M ²	01/06/95	75 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Mario Urbina.	"	2000 M.L.	27/05/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Aquilino Morge.	"	2000 M ²	28/05/95	75 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Eulalio Urbina.	"	2000 M ²	05/06/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Juan F. Badres.	"	2000 M ²	10/06/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Juan F. Badres.	"	2000 M ²	11/06/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	
"	"	Juan F. Badres.	"	2000 M ²	12/06/95	100 pl. Pino caribes.	
"	"	Leonardo A. Trigueros.	"	2000 M ²	13/09/95	50 pl. E. camaldulensis. 50 pl. E. citriodora. 50 pl. Mangium.	

dures

INFORME DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

C.D.T.: SAN ANDRES.

GYT: # 2.

AGENCIA: SAN JUAN OPTICO.

RUBRO: VEJIVER.

AÑO: 1995.

TECNICO	TIPO DE PARCELA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	UBICACION	AREA M2	FECHA DE SIEMBRA	INSUMOS PROPORCIONADO POR CENTA	OBSERVACIONES
José Rernald Orozco Montañez.	Demostrativas.	Leonardo A. Trigueros.	San Pedro Martín.	200 m.1	21/06/95		
"	"	Juan F. Baibes.	"	150 m.1	09/05/95		
"	"	Aquilino Mirga.	"	150 m.1	12/05/95		
"	"	Eulalio Urbina.	"	200 m.1	08/05/95		
"	"	Esquivel Cuavara.	"	50 m.1	08/05/95		
"	"	Isidro Ramírez.	"	100 m.1	18/05/95		
"	"	Santos Varela.	"	300 m.1	20/05/95		
"	"	Miguel A. Urbina.	"	8 m.1	18/07/95		
"	"	Pablo Urbina.	"	110 m.1	12/07/95		
"	"	Juan F. Baibes.	"	600 m.1	05/09/95		
"	"	Juan Flores.	"	100 m.1	18/09/95		

DMA.

11:00 a.m.

INFORME DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

C.D.T.: SAN ANDRÉS.

GYT: # 2.

AGENCIA: SAN JUAN OPTICO.

RUBRO: SORCO-FRIJOL, - SOYA.

AÑO: 1995.

TECNICO	TIPO DE PARCELA	NOMBRE DEL PRODUCTOR	UBICACION	AREA M ²	FECHA DE SIEMBRA	INSUMOS PROPORCIONADO POR CENTA	OBSERVACIONES
José Ronald Orozco Mantelajo,	Demostrativa.	Ezequiel Guevara.	San Pedro Mártir.	1000 M ²	10/09/95	sorco.	
"	"	Eulalio Urbina.	"	1000 M ²	11/09/95	2.5 lbs SOBERANO.	
"	"	Santos Varela.	"	2000 M ²	13/09/95	2.5 lbs 90503.	
"	"	Miguel A. Urbina.	"	1000 M ²	13/09/95	4 lbs C. ORIENTAL.	
"	"	Leonardo A. Trigueros.	"	2000 M ²	18/09/95	2.5 lbs 790.	
"	"	Laureano Aguilón.	San Pedro Oriente.	2000 M ²	10/09/95	4 lbs C. TEGUSTEPRIE.	
"	FOMENTA.	Juan Manzerola.	San Pedro Mártir.			4 lbs C. TEGUSTEPRIE.	* Coordinando con Técnico Mario César Ventura.
José Ronald Orozco Mantelajo,	Demostrativa.	Santos Varela.	San Pedro Mártir.	1000 M ²	20/05/95	Frijol	Reportamos insuños entre pedos l sacco libra y l sacco de fórmula 16-20-0.
"	"	Santos Varela.	"	1000 M ²	21/05/95	ICR-595, 15 lbs.	
José Ronald Orozco Mantelajo,	"	Eulalio Urbina.	San Pedro Mártir.	1000 M ²	17/09/95	CENTA-QUIZQUELO 10 lbs.	
"	"	Isidro Ramírez.	"	500 M ²	18/09/95	Soya.	
"	"	Santos Varela.	"	500 M ²	17/09/95	10 lbs. CRISTALINA.	
						8 lbs. CRISTALINA.	
						7 lbs. CRISTALINA.	

DWA.

21. PARCELAS MAIÊ DEMOSTRATIVAS

PARGELA No. 1
H-57
ADRIAN ORTEGA

1994

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y COSTO POR PARCELA

SISTEMA DE CULTIVO: Monocultivo CODIGO: 000460 OI
 NOMBRE DEL AGRICULTOR: Adrián Ortega DEPARTAMENTO: La Libertad
 REGION: I CANTON: Chontabuzne
 MUNICIPIO: San Juan Opro TECNICO RESPONSABLE: Ronald Orozco

AREA DE LA PARCELA (H): 1,000 m²
 AREA TOTAL DE LA FINCA (H): 4 m²

FECHA	ACTIVIDAD	INSUMOS Y MATERIALES		SERVICIOS			MANO DE OBRA			Costo Total por H.	Observaciones			
		TIPO	Cantidad Por H.	Costo/Unidad	Costo/Unidad	Lugar de Compra	(Maq. - Equip. - Insumos, Otros)	Cont. H	Cont. H			Cont. H	Costo por H.	
17-05-94	Control Malezas	Gramoxone	5 Lt.	450	4250	Los Tacos	-	-	2	430	2	60	310	Mausd B. Bolhico.
17-05-94	Siembra	Semilla H-57	30 Lbs	3.00	90	CENTA	-	-	2	430	2	60	150	Con Chuazo.
17-05-94	Traslado de semillas	Baucho	136 gr.	177	177	Los Tacos	-	-	-	-	-	-	177	Factica MIP.
25-05-94	1 ^a fertilizacion	16-20-0	4 kg	85	340	Los Tacos	-	-	4	430	4	120	460	Previo Anál. Suelo.
1-06-94	Control Cogollo	Salida Lig. 1 ^a fase	1 Lt.	60	60	Los Tacos	-	-	2	25	2	50	110	Tactica MIP.
22-06-94	2 ^a fertilizacion	Sulfato A.	1 kg	3750	230	Los Tacos	-	-	4	430	4	120	350	Previo Anál. Suelo
24-06-94	Control Cogollo	Volatin gr. 2 ^a fase	10 Lbs	4.20	42	Los Tacos	-	-	2	430	2	60	102	Tactica MIP.
25-06-94	Abolito	manuál	-	-	-	-	-	-	3	430	3	90	90	
TOTALES									14	160	17	560	1,779/m ²	

Incluir el costo de transporte, por ejemplo, del fertilizante hasta la parcela

6 ml
 Rendimiento → 65 gr
 Rend. 63 gr

H-57 AGRICULTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL (CENTA)

22. GIRA DE CAMPO AGROFORESTAL

DIA : JUEVES 17 DE FEBRERO DE 1994.

LUGAR : CANTONES: BARRANCA HONDA

LAS DELICIAS

AGRICULTOR : CARMEN CHACON

CIGARRERIA MORAZAN (JARDIN FORESTAL)

HORA : 8:00 a.m. en adelante.

AGENCIA DE EXTENSION AGRICOLA "SAN JUAN OPICO"

I N T R O D U C C I O N

El Salvador, se considera como uno de los países más deforestados, por tal razón, es necesario concientizar a la población para proteger y restaurar los recursos naturales renovables; también es necesario orientar a los agricultores, para que incorporen sembrando árboles de uso múltiples a los sistemas de producción de sus fincas, con el objeto de lograr elevar el nivel de vida de sus familias y poder contrarrestar el deterioro del medio ambiente.

Por lo antes mencionado, la Agencia de Extensión de San Juan Opico, considera necesario realizar una GIRA AGROFORESTAL, para que los agricultores observen los diferentes sistemas y que ellos consideren el conveniente a establecer.

O B J E T I V O S

- 1.- Incentivar a los agricultores para que protejan y restauren el medio ambiente.
- 2.- Orientar al agricultor para establecer parcelas agroforestales apropiadas a sus necesidades.
- 3.- Mostrar a los agricultores que se puede reforestar, sin sacrificar áreas agrícolas.

PARTICIPANTES

- 20 agricultores enlace y 8 Técnicos.

INSTITUCION RESPONSABLE

- Agencia de Extensión Agrícola y Forestal de San Juan Opico (CENTA).

DESARROLLO Y ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD**INSCRIPCION DE PARTICIPANTES:**

- Roxana Dina Sandoval Girón.
- Morena Guadalupe Lara.

Bienvenidos y objetivos de la actividad Ingeniero José Adalberto Santos Velásquez.

PARCELA N° 1. (Recorrido e parcela Jardín Botánico).

- HUGO MATA.

PARCELA N° 2. (Recorrido parcela Agroforestal).

- AGRONOMO : JUAN RAMON.

- AGRICULTOR : CARMEN CHACON.

R E F R I G E R I O

- Roxana Dina Sandoval Girón.

- Guadalupe Lara.

NECESIDADES

- 10	pliegos de cartulina de diferentes colores.	£ 20.00
- 6	plumones bicelados (azul, rojo y negro)	£ 60.00
- 1	royo de tirro.	£ 5.00
-	Diesel.	£ 50.00
- 1	rotafolio grande.	
- 1	pick-up.	
-	Refrigerio (alimento para 28 personas).	
- 3	docenas de delipops.....	£ 30.00
-28	sandwich.....	£ 140.00

T O T A L £ 305.00

NOTA : Otra alternativa es que nos asig: £ 250.00 para preparar almuerzos.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
(CENTA)**

AGENCIA DE EXTENSION AGRICOLA SAN JUAN OPICO.


**23. DIA DE CAMPO SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.)**

DIA : JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 1994.-

**LUGAR : PARCELA DEL AGRICULTOR JUAN OSEGUEDA
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN
JUAN OPICO, DEPTO. LA LIBERTAD.**

HORA : 8:30 A.M. EN ADELANTE.

SAN JUAN OPICO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994.-



I N T R O D U C C I O N .

El Manejo Integrado en nuestro país está ofreciendo buenos resultados, en lo que se refiere a prevención y control de las principales plagas que afectan a nuestros cultivos especialmente granos básicos. Es por esta razón que la Agencia de Extensión Agrícola de San Juan Opico, prepara "Un Día de Campo", con el cual pretende dar a conocer las diferentes tácticas MIP como son: Muestras y utilización de trampas para el control de *Vaginulus plebellus* (Ligosa)

- Muestreo de mosca blanca y picudo.

- Las diferentes tácticas de prevención y control para producir semilla artesanal; las cuales se están realizando en todas las parcelas establecidas en los distintos cantones de nuestra zona de influencia.



J U S T I F I C A C I O N .

El cultivo de frijol es uno de los granos alimenticios de primera necesidad en la familia Salvadoreña y es por eso que nuestro productor ha tenido que recurrir al uso excesivo de productos químicos, dando como resultados intoxicaciones, resistencia de las plagas y la contaminación del medio ambiente. Por esta razón La Agencia de Extensión de San Juan Opico en coordinación con el Convenio Salvadoreño Alemán MAG-GTZ, ha considerado la utilización de las diferentes tácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) con el objetivo de disminuir en gran medida la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de productos químicos. Razón por la cual se realizará un Día de Campo sobre MIP en el cultivo de frijol para irradiar esta tecnología a los agricultores del área de influencia de San Juan Opico.




O B J E T I V O S .

- Conocer las diferentes experiencias de los agricultores en la adopción y - aplicación de las distintas tácticas MIP.

- Dar a conocer los beneficios económicos y ecológicos al aplicar las dife- rentes tácticas de MIP.

- Lograr un efecto multiplicador mediante parcelas ya establecidas.



NECESIDADES.


- 1- Solicitar el servicio de filmación y video al CENTA.
 - 2- Solicitar al Depto de Comunicaciones del CENTA, elaborar 10 invitaciones.
 - 3- Solicitar 3 pickups (QDT San Andrés) para el traslado de los agricultores
 - 4- Solicitar la elaboración de 400 hojas divulgativas.
- Mr Almuerzo.



P R E S U P U E S T O .

1 Rollo de película de 35 mm de 36 exposiciones.....	€	56.85
40 Pliegos de cartulina blanca (para elaboración de señalización, viñetas, tickets, ayudas visuales).....		64.00
15 Pliegos de papel bond blanco.....		15.00
6 Plumones biselados (Negro, rojo, azul) c/u €9.30.....		55.80
4 cajas de tempera c/caja \$15.00..1.....		60.00
6 Pinceles c/u \$5.50.....		33.00
Alimentación para 80 personas c/u \$13.75.....		\$1,100.00
8 Docenas de refrescos Delipop c/doc. €12.00.....		96.00
		<hr/>
T O T A L.....		\$1,480.65

1031.25



PROGRAMA.

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

Inscripción:

- Danné Magali A. de Argueta.
- Roxana Dina Sandoval Girón.

- Recorrido por estaciones técnicas (cada estación tendrá una duración de 15 minutos).

a) MIP de la Ligosa.

Agricultor: Benjamín Alemán.

b) MIP Mosca blanca

Agricultor: Eulalio Urbina.

c) MIP Picudo.

Agricultor: Santos Anaya.




d) Producción artesanal de semilla de frijol.

Agricultor: Juan Osegueda.



- 1- Inscripción
- 2- 1ª mensajía
- 3- 2ª mensajía
- 4- 3ª mensajía
- 5- 4ª mensajía

Cantón : San Antonio.
 Distrito Representado: Alto Yaguajay
 Municipio : San Juan Ojito.
 014 - 05 - campo.-

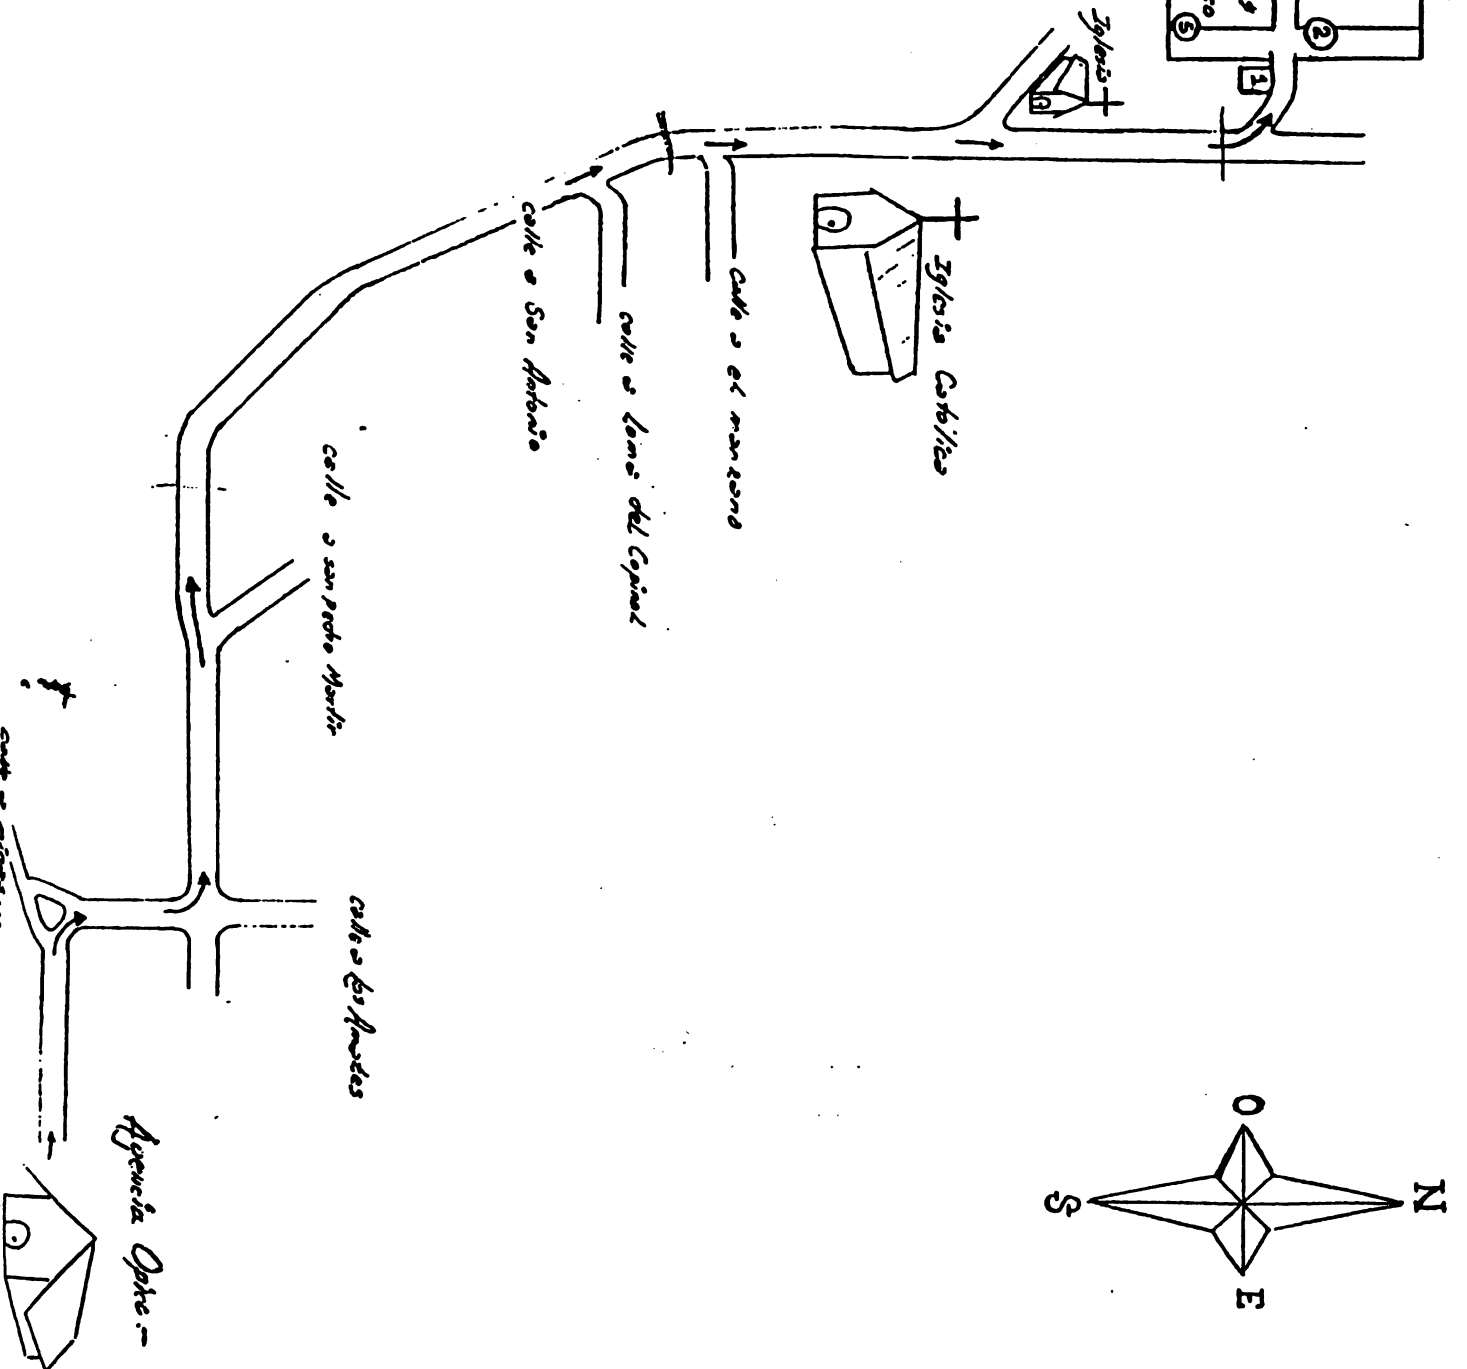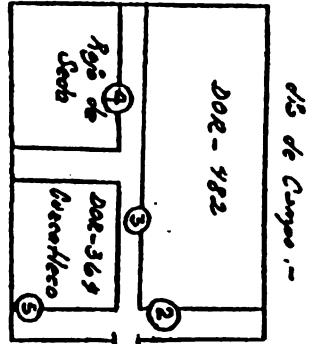

24. CONCURSO DE FRIJOL
MANEJO AGRONOMICO

1. UBICACION

AÑO 1993

NOMBR DEL AGRICULTOR: Santos Ureola
AGENCIA DE EXTENSION: San Juan opico
CANTON : Sn. P. martir CASERIO : _____
EXTENSIONISTA : Ronald Ojeda
ALTURA : 550 M.S.N.M. TEXTURA SUELO : Franc

SISTEMA UTILIZADO: SOLO () ASOCIO () REVELO (X)

MANEJA LANBRANZA MINIMA SI () NO (X)

ESPECIFIQUE : _____

PREPARACION DE SUELO : FRIJOL AGOSTO SI () NO (X)

TRACTOR () MANUAL : ()

BUEYES () HERBICIDAS ()

OTROS (X) MANUAL + HERBICIDAS ()

NO REALIZO () ESPECIFIQUE : chuzo

COSTO POR PARCELA \$ 50.00

2. TRATAMIENTO DE SEMILLA SI (X) NO ()

PRODUCTO : marshall

DOSIS : 1 lb/mz

COSTOS POR PARCELA \$ 195.00

3. SIEMBRA

VARIEDAD UTILIZADA : Rejo de Seta

CANTIDAD DE SEMILLA (LBS): 85 lbs/mz.

FECHA DE SIEMBRA : 16 Agosto 93
 AREA SEMBRADA (MZ) : 1 m².
 COSTO POR PARCELA ₡ : ₡ 450.00

4. FERTILIZACION SI (X) NO ()

FORMULA : 16-20-0
 CANTIDAD (QQ) : 7 qq / m²
 EPOCA : 10 dias despues Siembra
 SULFATO DE AMONIO : —
 CANTIDAD : —
 EPOCA : —
 COSTO POR PARCELA ₡ : ₡ 400.00

4a. FERTILIZACION FOLIAR

PRODUCTO : —
 CANTIDAD : —
 EPOCA : —
 COSTO POR PARCELA : —

4b. PLAGA PRINCIPAL

mosca blanca

5. APLICACION DE INSECTICIDA AL SUELO : SI () NO (X)

PRODUCTO : —
 DOSIS : —
 EPOCA : —
 COSTO POR PARCELA : —

6. CONTROL DE MALEZA

MANUAL : SI () NO (X)
 NUMERO DE LIMPIAS : —

EPOCA : _____

COSTO POR PARCELA ₡ : _____

HERBICIDA : SI (X) NO ()

PRODUCTOS : Semi-botánica

DOSIS : 5 lts/m²

EPOCA : Pre Siembra

COSTO POR PARCELA : ₡ 95.00

7. CONTROL DE PLAGAS SI (X) NO ()

PRIMERA APLICACION:

PRODUCTO	DOSIS	EPOCA	PLAGA QUE CONTROLA
Tomaron	1lt/m ²	10 dias despues siembra	mosca blanca, tortugilla

COSTO POR PARCELA ₡ ₡ 115.00

7a. SEGUNDA APLICACION:

PRODUCTO	DOSIS	EPOCA	PLAGA QUE CONTROLA
Caracollis	10 lb/m ²	15 dias despues emergida	Babosa

COSTO POR PARCELA ₡ 150.00

7b. TERCERA APLICACION

PRODUCTO	DOSIS	EPOCA	PLAGA QUE CONTROLA
Folidol 4-48	1/2 lt/me	10 días antes de la siembra	Picudo

COSTO POR PARCELA ₡ 90.00

8. CONTROL DE ENFERMEDADES : No

PRIMERA APLICACION :

PRODUCTO	DOSIS	EPOCA	ENFERMEDAD QUE CONTROLA

COSTO POR PARCELA ₡ —

8a. SEGUNDA APLICACION :

PRODUCTO	DOSIS	EPOCA	ENFERMEDAD QUE CONTROLA

COSTO POR PARCELA ₡ —

CENTRO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
 DIVISION DE EXTENSION AGROPECUARIA Y FORESTAL

C.D.T. : San Andrés
 AGENCIA: Opico
 NOMBRE DEL EXTENSIONISTA : Reneal Cruzco
 NOMBRE DEL AGRICULTOR : Jantos Varela
 CANTON : Sn. P. marfil
 CASERIO : -
 RENDIMIENTO : 19.56 QQ/MZ.

FORMA DE OBTENCION DE RENDIMIENTO	
AREA UTIL :	20 M2
PESO CAMPO :	KG.
PESO CAMPO :	LBS. 7.8, 4.1, 3.5, 4.0
HUMEDAD DE CAMPO :	16 %
CALCULO :	$\frac{PC \times 7.000}{AU} \times \frac{100 - HC}{86} \times 90 \div 100$
	RENDIMIENTO: <u>19.56</u> QQ/MZ.
FORMULA DEL CALCULO	FORMULA DEL CALCULO CON FACTOR

1)- KG.

$$\frac{PC \times 10.000}{AU} \times \frac{100 - HC}{86} = \text{KG/HA}$$

3)-

$$\frac{10.000}{AU \times 86} = \text{KG} \quad PC \times \text{FACTOR} \times 100 - HC = \text{KG/}$$

2)- LBS.

$$\frac{PC \times 7.000}{AU} \times \frac{100 - HC}{86} = \text{LBS/MZ}$$

4)-

$$\frac{7.000}{AU \times 86} = \text{LBS} \quad PC \times \text{FACTOR} \times 100 - HC =$$

R/ LBS/MZ.

$$\text{KG/HA.} \times 1.54 = \text{LBS/MZ} + 100 = \text{QQ/MZ}$$

$$+ 2.000 = \text{T3/ MZ.}$$

HUMEDAD DESEADA .14%

V. RESULTADOS

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The text suggests that a systematic approach to record-keeping is essential for identifying trends and making informed decisions.

In the second section, the author addresses the challenges of budgeting and financial planning. It is noted that many businesses struggle to stay within their budgets due to unforeseen expenses or changes in market conditions. The document provides several strategies to mitigate these risks, such as creating a contingency fund and regularly reviewing the budget to adjust for any deviations.

The third part of the document focuses on the role of technology in modern accounting. It highlights how software solutions can streamline the accounting process, reduce errors, and provide real-time insights into the company's financial health. The author recommends investing in reliable accounting software and ensuring that the staff is properly trained to use these tools effectively.

Finally, the document concludes with a discussion on the importance of transparency and communication in financial management. It stresses that clear communication with stakeholders, including investors and employees, is crucial for building trust and ensuring the long-term success of the business. The author encourages businesses to be open about their financial performance and to provide regular reports to their stakeholders.

CENTA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EDO

25. CUADRO COMPARATIVO DE SITUACION ACTUAL, OBJETIVOS Y RESULTADOS

RUBRO: FRIJOL

CDT: SAN ANDRES

ZONA: SAN JUAN OPICO

AGENCIA: SAN JUAN OPICO

EXTENSIONISTA: JOSE ROLANDO OROZCO

PRODUCTORES DE ZONA	SITUACION 1982						OBJETIVOS 1983						RESULTADOS 1983					
	AREA (Ha.)	RFVTO. 400	PERFCHO 400	INTERRIO 434	CDTNO 434	RFVFF CDTNO 400	AREA (Ha.)	RFVTO. 400	PERFCHO 400	INTERRIO 434	CDTNO 434	RFVFF CDTNO 400	AREA (Ha.)	RFVTO. 400	PERFCHO 400	INTERRIO 434	CDTNO 434	RFVFF CDTNO 400
1 JOSE VICENTE	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
2 JUAN F. ARENA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
3 JUAN A. PELAYO	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
4 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
5 JOSE EDUARDO	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
6 DANIEL ORON	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
7 JUAN F. MORALES	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
8 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
9 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
10 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
11 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
12 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
13 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
14 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
15 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
16 JUAN M. VALEDA	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0	1,0	20,0	18,0	3,0	1,0	15,0	1,0	15,0	18,0	2,0	1,0	15,0
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		

— IICA —
CENTRO REFERENCIAL
BIBLIOTECA VENEZUELA

FECHA DE DEVOLUCION

